








# PLAN MENSUAL NOVIEMBRE 2026

# HMC Michilla

SUPERINTENDENCIA DE PLANIFICACION

HMC Michilla

NOVIEMBRE 2026

Adjunto se encuentra Plan Mensual de Noviembre de 2026 y las bases de construcción para soportar el plan de cobre fino a producir en el mes.

| Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|
| Ricardo Vergara | Superintendente Planta | |
| Carlos Ruiz | Superintendente Mantención Planta | |
| Victorino Moyano | Superintendente de Geología | |
| José Miguel Aldana | Superintendente de Metalurgia | |
| Albino Vargas | Superintendente Geomecánica | |
| Leopoldo Bustos | Superintendente Mina | |
| Marco Cornejo | Subgerente Mina | |
| Patricio Bracamonte | Superintendente de Planificación Mina | |
| Manuel Rivera | Subgerente de Planificación & Desarrollo | |

| Recepcionado | Cargo | Firma |
|---|---|---|
| Juan Henríquez | Gerente de Operaciones | |

# Índice


1. Objetivos
2. Consideraciones
3. Fase 15 B
    a. Términos de Referencia
    b. Plan de disponibilidad de equipos
    c. Requerimientos de flota
    d. Plan Minero
    e. Secuencia Plan Minero
4. Condell
    a. Términos de Referencia
    b. Plan Minero
5. Ripios
    a. Términos de Referencia
    b. Requerimientos de equipos mina
    c. Secuencia Plan Minero
6. Sorting
    a. Plan
    b. Secuencia
7. Plan de Alimentación
    a. Plan de recepción chancado
    b. Plan de alimentación Planta
8. Plan de Producción

**1.Objetivos**

- Operar con seguridad y productividad.
- Cumplir con la meta de mineral alimentado al Chancado del Fcst.
- Cumplir con movimientos mina de cuerdo a Fcst.
- Cumplir con alimentación de mineral a tolva Sorting.

**2. Antecedentes y Consideraciones**

- Se considera topografía actualizada al 26 de octubre para ambas minas y se proyecta topografía para partir con la secuencia del plan.
- Modelo de Bloques entregados el 19 de octubre.
    - Fase 15 B
    - Condell
- Plan de disponibilidad mina y chancado, entregado por las áreas operativas.
- Estrategia de leyes de corte:
    - Fase 15 B:
        - Mineral (Cut >= 0,24%)
        - Marginal (0,20% <= %Cut < 0,24)
        - Lastre (Cut < 0,20%)
    - Condell
        - Mineral (Cut >= 0,25%)
        - Marginal (0,20% <= %Cut < 0,25)
        - Lastre (Cut < 0,20%)

### 2.1 Resumen Plan Mensual

Para el mes se tiene el siguiente movimiento mina:

| Mina Fase 15 B - Mov Total | | | Pmes | Forecast | Dif Pmes-Fcst | Plan Trimestral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase 15 B | Mineral | Ton | 212,392 | 231,909 | -19,517 | 218,986 |
| | | %Cut | 0.55 | 0.49 | 0.06 | 0.55 |
| | Marginal | Ton | 41,805 | 40,572 | 1,233 | 44,885 |
| | | %Cut | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| | Lastre | Ton | 866,064 | 1,031,020 | -164,956 | 903,892 |
| | Total | Ton | 1,120,261 | 1,303,501 | -183,240 | 1,167,763 |

El plan mensual muestra una mayor cantidad de ley respecto al forecast, debido a que estamos recuperando los minerales no extraídos generado por los eventos de chancador propio y baja disponibilidad de equipos de transporte.

| Mina Condell | | | Pmes | Forecast | Dif Pmes-Fcst | Plan Trimestral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condell | Mineral | Ton | 72,455 | 121,476 | -49,021 | 99,804 |
| | | %Cut | 0.53 | 0.51 | 0.02 | 0.57 |
| | Marginal | Ton | 19,660 | 24,791 | -5,131 | 20,094 |
| | | %Cut | 0.22 | 0.23 | -0.01 | 0.23 |
| | Lastre | Ton | 1,091,391 | 1,069,269 | 22,122 | 1,174,155 |
| | Total | Ton | 1,183,506 | 1,215,536 | -32,030 | 1,294,053 |

El plan mensual de Condell presenta un retraso principalmente en la F03, donde la falta de equipos por baja disponibilidad de la flota impacta directamente en el movimiento total.

| Chancado | | | Pmes | Forecast | Dif Pmes-Fcst | Plan Trimestral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L Propia | Ton H | 274,846 | 244,268 | 30,578 | 273298 |
| | L Compra | Ton H | 104,451 | 128,278 | -23,827 | 106667 |
| | Total | Ton | 379,297 | 372,546 | 6,751 | 379,965 |

Para el caso de la planta de chancado se programa 379 [kton] húmedas, mejorando el Forecast. Se considera una mantención mayor del Chancado compra de 3 días.

| Sorting | | | Pmes | Forecast | Dif Pmes-Fcst | Plan Trimestral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Alimentación tolva | Ton | 119,885 | 147,000 | -27,115 | 86642 |
| | FNS | Ton | 55,147 | 69,090 | -13,943 | 40722 |
| | Grueso | Ton | 2,398 | 4,410 | -2,012 | 2599 |
| | Producto | Ton | 18,165 | 23,520 | -5,355 | 12628 |
| | Rechazo | Ton | 44,175 | 49,980 | -5,805 | 30693 |
| | FNS a LIX | Ton | 0 | 41,454 | -41454 | |

Por estrategia, Sorting solo opera durante el turno A

| Cu Fino | | | Pmes | Forecast | Dif Pmes-Fcst | Plan Trimestral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cu Fino | Ton | **1,470** | 1,437 | 33 | 1513 |

Para el caso de la producción de cobre fino, estamos sobre el forecast, principalmente por la recuperación de minerales de mejor ley que tenemos en atraso de meses anteriores.

## 3.- Plan Minero Fase 15 B

### 3.a. Términos de Referencia

Los términos de referencia del Plan Minero son los entregables de las distintas áreas con las que se construye el Plan y que para el caso del Plan Mensual de Noviembre 2026 son:

- Modelo de bloques actualizado entregado por geología, Modelo Trimestral nov-dic-ene 2026.
- Plan de Disponibilidad de Equipos Mina Noviembre 2026.

### 3.b. Plan de Disponibilidad de Equipos

Entre las mantenciones de Noviembre se destacan las siguientes:

**Cargadores Frontales**

L06: Reparación de diferencial del eje trasero.

| Plan | 1-Nov | 2-Nov | 3-Nov | 4-Nov | 5-Nov | 6-Nov | 7-Nov | 8-Nov | 9-Nov | 10-Nov | 11-Nov | 12-Nov | 13-Nov | 14-Nov | 15-Nov | 16-Nov | 17-Nov | 18-Nov | 19-Nov | 20-Nov | 21-Nov | 22-Nov | 23-Nov | 24-Nov | 25-Nov | 26-Nov | 27-Nov | 28-Nov | 29-Nov | 30-Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L03 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.82 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.44 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.82 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| L04 | 0.90 | 0.90 | 0.82 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.82 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.82 |
| L05 | 0.92 | 0.46 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 0.79 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.25 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 0.79 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.46 | 0.92 |
| L06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.79 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.46 | 0.00 | 0.92 | 0.92 |
| Total | 0.68 | 0.57 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.45 | 0.57 | 0.45 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.74 | 0.91 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.68 | 0.91 | 0.68 | 0.79 | 0.68 | 0.80 | 0.89 |

**CAEX 775 y 777**

T12: Cambio de mando final trasero derecho
T17: Desde el 09 hasta fin de mes, reparación en taller externo por cambio de componentes mayores.

| | 1-Nov | 2-Nov | 3-Nov | 4-Nov | 5-Nov | 6-Nov | 7-Nov | 8-Nov | 9-Nov | 10-Nov | 11-Nov | 12-Nov | 13-Nov | 14-Nov | 15-Nov | 16-Nov | 17-Nov | 18-Nov | 19-Nov | 20-Nov | 21-Nov | 22-Nov | 23-Nov | 24-Nov | 25-Nov | 26-Nov | 27-Nov | 28-Nov | 29-Nov | 30-Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat 775 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| T-11 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.84 | 0.93 | 0.93 | 0.75 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.46 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.84 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
| T-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.74 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.45 |
| T-13 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.45 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.74 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| T-15 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.25 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.45 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 |
| T-16 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.45 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.74 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 |
| T-17 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T-18 | 0.90 | 0.90 | 0.74 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.45 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 |
| T-19 | 0.90 | 0.45 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.25 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 |
| T-20 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.45 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 |
| T-21 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.25 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.45 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| T-23 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.45 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.25 | 0.90 |
| T-24 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.45 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.25 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
| Total | 0.83 | 0.79 | 0.81 | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.75 | 0.83 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 0.81 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.74 | 0.82 | 0.68 | 0.76 | 0.83 | 0.65 | 0.83 | 0.77 | 0.79 |

| | 1-Nov | 2-Nov | 3-Nov | 4-Nov | 5-Nov | 6-Nov | 7-Nov | 8-Nov | 9-Nov | 10-Nov | 11-Nov | 12-Nov | 13-Nov | 14-Nov | 15-Nov | 16-Nov | 17-Nov | 18-Nov | 19-Nov | 20-Nov | 21-Nov | 22-Nov | 23-Nov | 24-Nov | 25-Nov | 26-Nov | 27-Nov | 28-Nov | 29-Nov | 30-Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat 777 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| T-83 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.25 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.45 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.90 |
| T-86 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.45 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.25 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.45 |
| Total | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.58 | 0.90 | 0.90 | 0.68 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.68 | 0.58 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.68 |

**PERFORADORAS**

D05: Deslizamiento pasador de BOOM

| | 1-Nov | 2-Nov | 3-Nov | 4-Nov | 5-Nov | 6-Nov | 7-Nov | 8-Nov | 9-Nov | 10-Nov | 11-Nov | 12-Nov | 13-Nov | 14-Nov | 15-Nov | 16-Nov | 17-Nov | 18-Nov | 19-Nov | 20-Nov | 21-Nov | 22-Nov | 23-Nov | 24-Nov | 25-Nov | 26-Nov | 27-Nov | 28-Nov | 29-Nov | 30-Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perforadoras | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D02 | 0.91 | 0.78 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.78 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.70 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.78 | 0.91 | 0.91 | 0.45 | 0.91 | 0.91 |
| D05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D06 | 0.91 | 0.91 | 0.78 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.70 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.78 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.45 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| D07 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.45 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.78 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.70 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Total | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.57 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.45 | 0.63 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.57 | 0.57 | 0.68 | 0.68 |

## 3.c Calculo de Requerimiento de Equipos

El calculo de equipo respecto a rendimiento y cantidad de flota, será de la siguiente forma:

## Cargadores frontales

| | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **L03** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DF** | 90% | 90% | 90% | 82% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 44% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| **UTBD** | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| **REND** | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| **TONS** | 9,551 | 9,551 | 9,551 | 8,669 | 9,551 | 9,551 | 9,551 | 9,551 | 9,551 | 9,529 | 4,698 | 9,551 | 9,551 | 9,551 | 9,551 |
| **L04** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DF** | 90% | 90% | 82% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| **UTBD** | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| **REND** | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| **TONS** | 9,606 | 9,606 | 8,719 | 9,606 | 9,606 | 9,606 | 9,606 | 9,606 | 9,606 | 9,606 | 9,606 | 9,584 | 9,606 | 9,606 | 9,606 |
| **L05** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DF** | 92% | 46% | 92% | 92% | 92% | 92% | 88% | 92% | 79% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| **UTBD** | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| **REND** | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| **TONS** | 17,632 | 8,816 | 17,632 | 17,632 | 17,632 | 17,632 | 16,831 | 17,632 | 15,228 | 17,632 | 17,632 | 17,632 | 17,632 | 17,632 | 17,632 |
| **L06** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DF** | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| **UTBD** | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| **REND** | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 |
| **TONS** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| **L03** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DF** | 82% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| **UTBD** | 0% | 0% | 0% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 0% | 0% | 40% | 85% | 40% | 0% |
| **REND** | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| **TONS** | 0 | 0 | 0 | 7,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,551 | 0 | 0 | 4,495 | 9,551 | 4,495 | 0 |
| **L04** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DF** | 90% | 90% | 82% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 82% |
| **UTBD** | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| **REND** | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| **TONS** | 9,606 | 9,606 | 8,719 | 9,606 | 9,606 | 9,606 | 9,606 | 9,606 | 0 | 9,606 | 9,606 | 9,606 | 9,606 | 9,606 | 8,719 |
| **L05** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DF** | 92% | 92% | 92% | 25% | 92% | 83% | 92% | 79% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 46% | 92% |
| **UTBD** | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| **REND** | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| **TONS** | 17,632 | 17,632 | 17,632 | 4,809 | 17,632 | 16,029 | 17,632 | 15,228 | 17,632 | 17,632 | 17,632 | 17,632 | 17,632 | 8,816 | 17,632 |
| **L06** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DF** | 92% | 83% | 92% | 92% | 92% | 79% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 46% | 0% | 92% | 92% |
| **UTBD** | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| **REND** | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 |
| **TONS** | 15,522 | 14,110 | 15,522 | 15,522 | 15,522 | 13,405 | 15,522 | 15,522 | 15,522 | 15,522 | 15,522 | 7,761 | 0 | 15,592 | 15,592 |

HMC

25 ktpa | Max Recursos | Sorting | DIA

# CAEX 775 y 777

| | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **CAT 775** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAEX flota** | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **CAEX operativos** | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 9.0 | 10.0 | 9.9 | 9.3 | 9.4 | 8.8 | 9.8 |
| **DF** | 83% | 79% | 81% | 77% | 82% | 86% | 84% | 86% | 75% | 83% | 82% | 78% | 78% | 73% | 81% |
| **UTBD** | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% |
| **REND** | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| **TONS** | 42,122 | 40,336 | 41,256 | 39,380 | 41,751 | 43,768 | 42,919 | 43,715 | 38,354 | 42,246 | 41,822 | 39,575 | 39,946 | 37,364 | 41,415 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAT 777** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAEX flota** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **CAEX operativos** | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| **DF** | 90% | 90% | 90% | 58% | 90% | 90% | 68% | 93% | 90% | 90% | 86% | 86% | 90% | 90% | 91% |
| **UTBD** | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| **REND** | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| **TONS** | 10,741 | 10,691 | 10,691 | 6,831 | 10,691 | 10,691 | 8,019 | 11,038 | 10,691 | 10,691 | 10,246 | 10,246 | 10,691 | 10,691 | 10,865 |

| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| **CAT 775** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAEX flota** | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **CAEX operativos** | 9.3 | 9.9 | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 8.9 | 9.9 | 8.1 | 9.1 | 9.9 | 7.9 | 10.0 | 9.3 | 9.5 | 9.5 |
| **DF** | 78% | 82% | 82% | 78% | 81% | 83% | 74% | 82% | 68% | 76% | 83% | 65% | 83% | 77% | 79% | 79% |
| **UTBD** | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% |
| **REND** | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| **TONS** | 39,557 | 41,892 | 41,539 | 39,964 | 41,220 | 42,122 | 37,717 | 41,822 | 34,568 | 38,761 | 42,176 | 33,330 | 42,264 | 39,416 | 40,265 | 40,419 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAT 777** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAEX flota** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **CAEX operativos** | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.7 |
| **DF** | 91% | 90% | 68% | 58% | 90% | 90% | 86% | 91% | 91% | 90% | 90% | 86% | 86% | 90% | 68% | 85% |
| **UTBD** | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| **REND** | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| **TONS** | 10,865 | 10,691 | 8,019 | 6,831 | 10,691 | 10,691 | 10,246 | 10,865 | 10,865 | 10,691 | 10,691 | 10,246 | 10,246 | 10,691 | 8,019 | 10,129 |

**Perforación**: Se necesita perforar 20.354 metros durante el mes, y tenemos una capacidad de 21.967 metros.

| | 1-Nov | 2-Nov | 3-Nov | 4-Nov | 5-Nov | 6-Nov | 7-Nov | 8-Nov | 9-Nov | 10-Nov | 11-Nov | 12-Nov | 13-Nov | 14-Nov | 15-Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **D02** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DF** | 91% | 78% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 78% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| **USO** | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| **REND** | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **METROS** | 262 | 226 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 226 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| **D06** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DF** | 91% | 91% | 78% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 0% | 70% | 91% | 91% |
| **USO** | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| **REND** | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **METROS** | 262 | 262 | 226 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 0 | 202 | 262 | 262 |
| **D07** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DF** | 91% | 91% | 91% | 91% | 45% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 78% | 91% |
| **USO** | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| **REND** | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **METROS** | 262 | 262 | 262 | 262 | 130 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 226 | 262 |

| | 16-Nov | 17-Nov | 18-Nov | 19-Nov | 20-Nov | 21-Nov | 22-Nov | 23-Nov | 24-Nov | 25-Nov | 26-Nov | 27-Nov | 28-Nov | 29-Nov | 30-Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
| | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| **D02** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DF** | 0% | 70% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 78% | 91% | 91% | 45% | 91% | 91% |
| **USO** | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| **REND** | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **METROS** | 0 | 202 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 226 | 262 | 262 | 130 | 262 | 262 |
| **D06** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DF** | 91% | 91% | 91% | 78% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 45% | 91% | 91% | 91% |
| **USO** | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| **REND** | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **METROS** | 262 | 262 | 262 | 226 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 130 | 262 | 262 | 262 |
| **D07** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DF** | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 0% | 70% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| **USO** | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| **REND** | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **METROS** | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 0 | 202 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |

### 3.d Plan Minero Propio

El Plan de Fase 15 B estima extraer 212 [kton] de mineral de una ley de @0,55 CuT, con un movimiento total de 1.120 [kton]. (El plan corta de lunes a Domingo para efectos de cuadrarse con el plan semanal)


| Noviembre | Marginal 1 (0.20 a 0.24) | | | Baja Ley 1 (0.24 a 0.29) | | | Baja Ley 2 (0.29 a 0.7) | | | Alta Ley (>0.7) | | | Mineral Alimentable | | | Lastre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ton | %Cut | %Cus | Ton | %Cut | %Cus | Ton | %Cut | %Cus | Ton | %Cut | %Cus | Ton | %Cut | %Cus | Ton | Ton |
| SEM1 | 1,086 | 0.22 | 0.16 | 1,051 | 0.27 | 0.20 | 3,042 | 0.44 | 0.36 | 2,002 | 1.12 | 1.01 | 6,095 | 0.63 | 0.55 | 30,930 | 38,111 |
| SEM2 | 9,419 | 0.22 | 0.18 | 13,625 | 0.26 | 0.21 | 16,237 | 0.36 | 0.29 | 3,706 | 1.14 | 1.03 | 33,568 | 0.40 | 0.34 | 199,119 | 242,107 |
| SEM3 | 7,088 | 0.22 | 0.16 | 9,555 | 0.27 | 0.21 | 25,990 | 0.44 | 0.36 | 4,804 | 1.36 | 1.13 | 40,349 | 0.51 | 0.41 | 192,233 | 239,670 |
| SEM4 | 9,966 | 0.22 | 0.19 | 9,525 | 0.26 | 0.22 | 40,931 | 0.48 | 0.41 | 24,229 | 1.05 | 0.90 | 74,684 | 0.64 | 0.54 | 197,193 | 281,843 |
| SEM5 | 14,246 | 0.22 | 0.17 | 12,083 | 0.26 | 0.21 | 35,502 | 0.42 | 0.34 | 10,111 | 1.21 | 0.99 | 57,696 | 0.53 | 0.42 | 246,588 | 318,530 |
| **TOTAL** | **41,805** | **0.22** | **0.17** | **45,839** | **0.26** | **0.21** | **121,701** | **0.44** | **0.36** | **44,852** | **1.13** | **0.96** | **212,392** | **0.55** | **0.45** | **866,064** | **1,120,261** |

### 1.e Secuencia Plan Minero Propio


**Leyenda:**




**Semana 1**

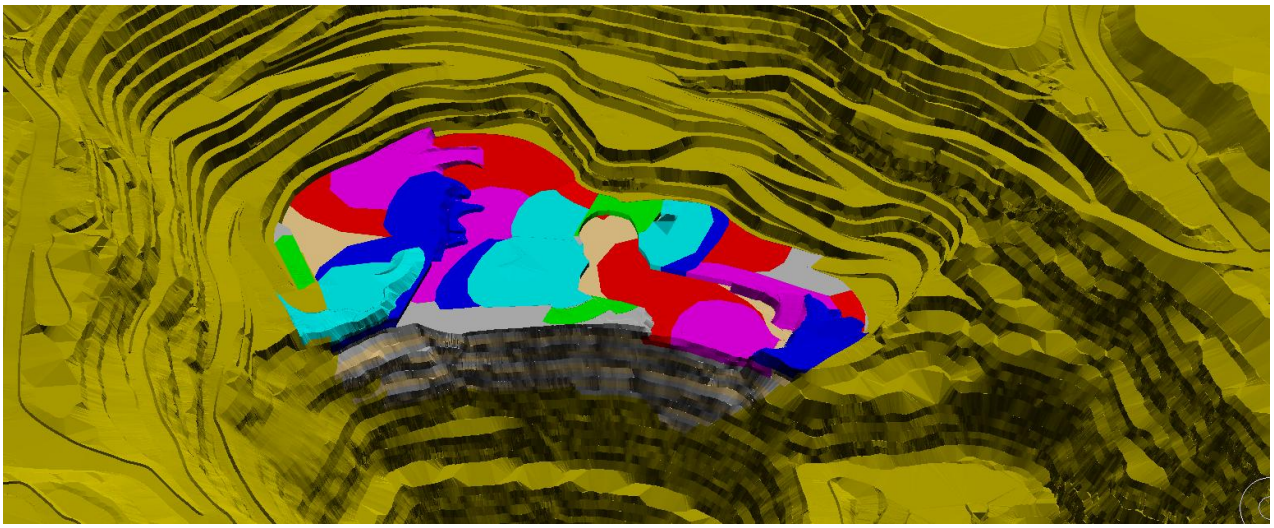

**Semana 2**

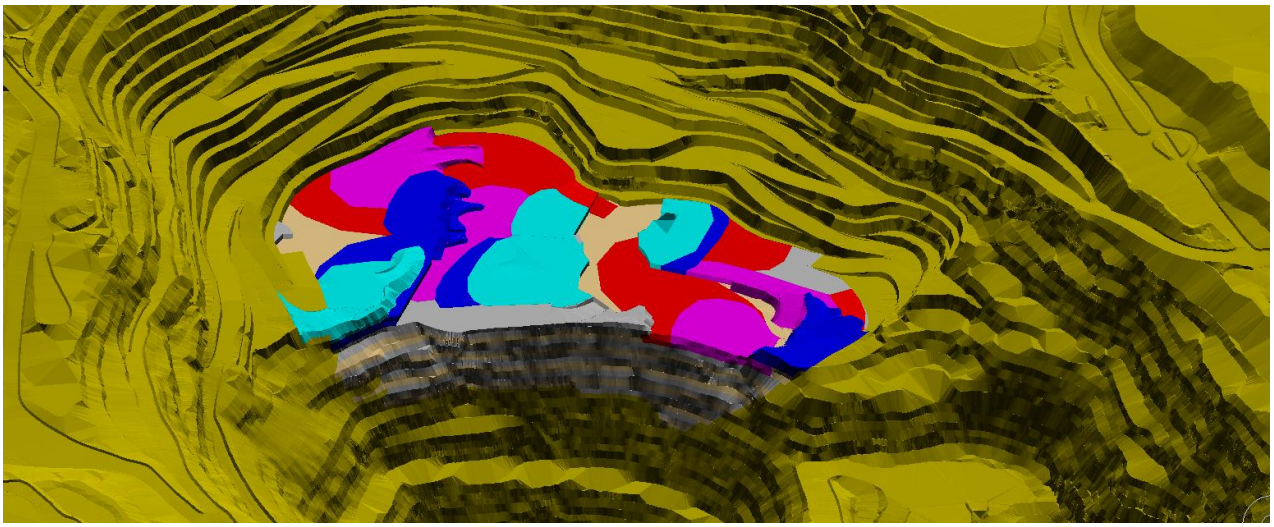

**Semana 3**




**Semana 4**



**Semana 5**



## Rutas de transporte (Mineral y Lastre)

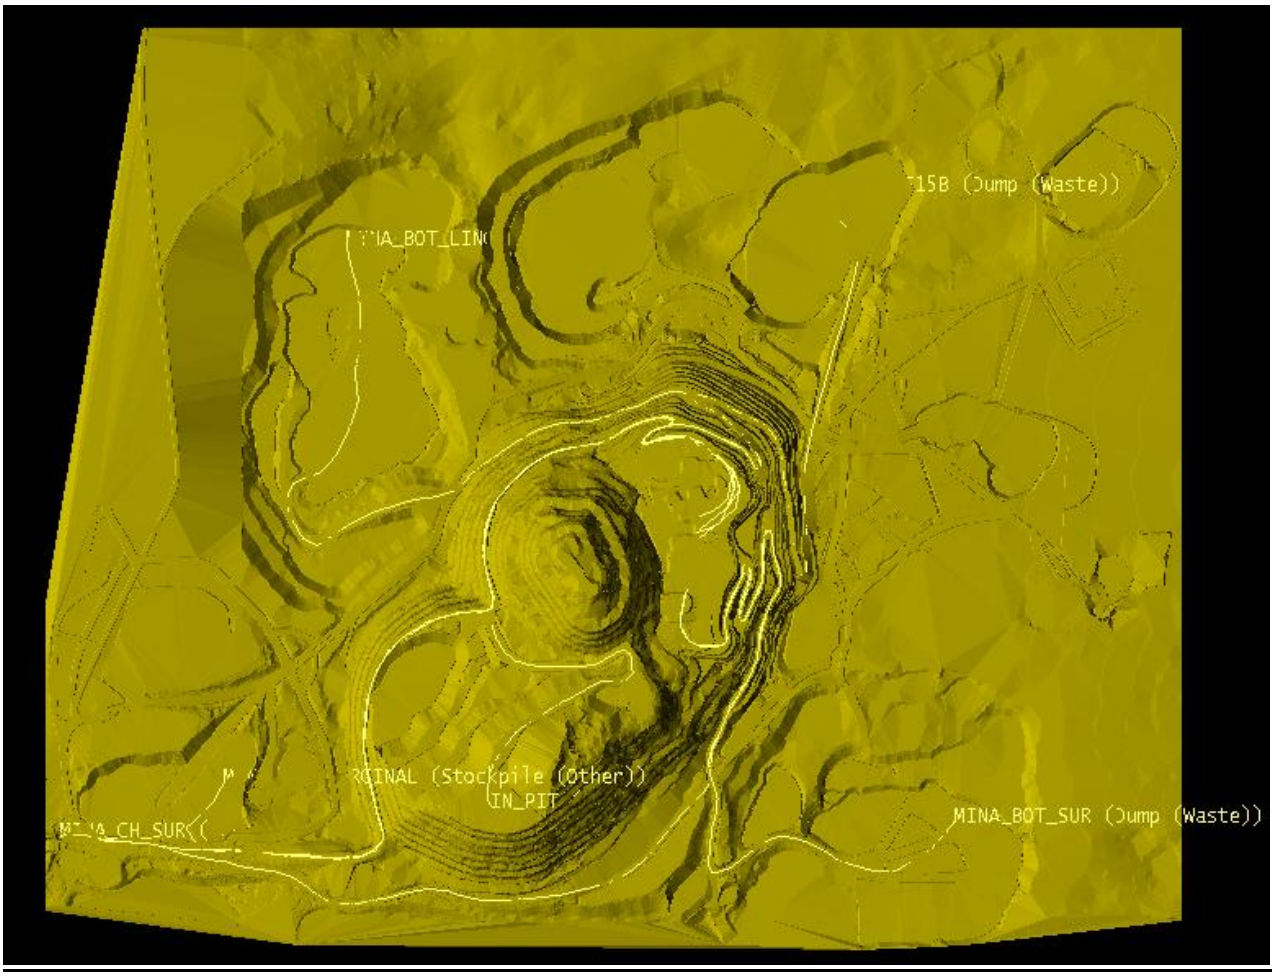


| Ruta | Distancia (km) | Ciclo total (min) | Ciclo con demoras (min) | Rendimiento (t/h) |
|---|---|---|---|---|
| CH In Pit | 2,74 | 16,75 | 19,23 | 196,5 |
| CH Sur | 3,10 | 18,46 | 20,94 | 180,5 |
| Botadero F15B | 2,46 | 15,73 | 18,21 | 207,5 |
| Botadero Sur | 2,30 | 15,21 | 17,69 | 213,7 |
| Botadero Lince | 2,77 | 16,89 | 19,37 | 195,1 |
| Botadero Marginal | 2,60 | 16,80 | 19,28 | 196,0 |
| In Pit | 2,19 | 13,70 | 16,18 | 233,6 |

## 4.- PLAN MINERO FALLA CONDELL

### 4.a. Términos de Referencia

Los términos de referencia del Plan Minero son los entregables de las distintas áreas con las que se construye el Plan y que para el caso del Plan Mensual de Noviembre 2026 son:

- Modelo de bloques actualizado entregado por geología, Modelo Bloques Falla Condell. (TRI_FC_NOV_DIC_ENE26_RELL.BMF).

### 4.b. Plan Minero


El Plan de Falla Condell estima en 72 [kton] de mineral insitu de una ley @0,53% CuT, con un movimiento total de 1.183 [kton]. (El plan corta de lunes a domingo para efectos de cuadrarse con el plan semanal).

| Noviembre | Marginal 1 (0.20 a 0.24) | | | Baja Ley 1 (0.25 a 0.7) | | | Alta Ley (>0.7) | | | Mineral Alimentable | | | Lastre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ton | %Cut | %Cus | Ton | %Cut | %Cus | Ton | %Cut | %Cus | Ton | %Cut | %Cus | Ton | Ton |
| SEM1 | 193 | 0.24 | 0.20 | 1,156 | 0.40 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,156 | 0.40 | 0.36 | 28,913 | 30,262 |
| SEM2 | 3,958 | 0.23 | 0.19 | 8,379 | 0.40 | 0.35 | 7,403 | 0.97 | 0.75 | 15,782 | 0.66 | 0.53 | 245,486 | 265,226 |
| SEM3 | 1,649 | 0.23 | 0.18 | 3,178 | 0.35 | 0.25 | 941 | 0.97 | 0.31 | 4,119 | 0.49 | 0.26 | 262,058 | 267,826 |
| SEM4 | 5,160 | 0.22 | 0.20 | 10,985 | 0.42 | 0.37 | 2,369 | 1.14 | 1.02 | 13,354 | 0.55 | 0.49 | 257,436 | 275,950 |
| SEM5 | 8,700 | 0.22 | 0.18 | 21,816 | 0.42 | 0.32 | 4,228 | 0.94 | 0.65 | 26,044 | 0.50 | 0.38 | 297,498 | 332,242 |
| **TOTAL** | **19,660** | **0.22** | **0.19** | **45,513** | **0.41** | **0.33** | **14,942** | **0.99** | **0.73** | **60,455** | **0.55** | **0.43** | **1,091,391** | **1,171,506** |


| Semanas | F01 | F03 | Total |
|---|---|---|---|
| SEM1 | 13,723 | 16,539 | 30,262 |
| sem2 | 171,455 | 97,772 | 269,226 |
| sem3 | 172,338 | 95,488 | 267,826 |
| sem4 | 173,682 | 106,268 | 279,950 |
| sem5 | 210,128 | 126,114 | 336,242 |
| **Total** | **741,325** | **442,181** | **1,183,506** |

### 4.c Secuencia Plan Minero Falla Condell


### Semana 1

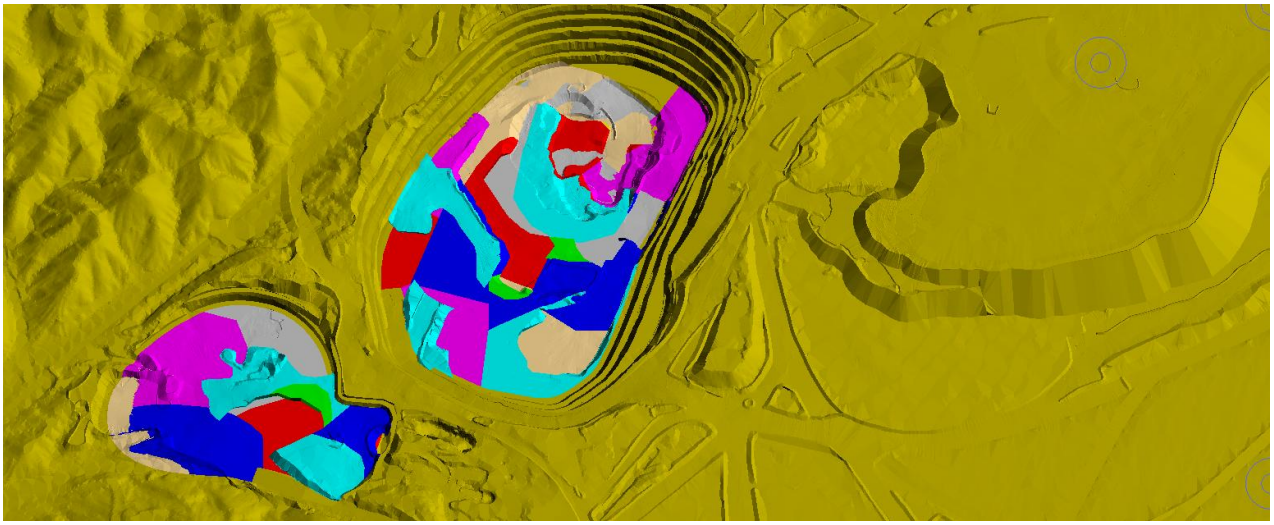


## Semana 2

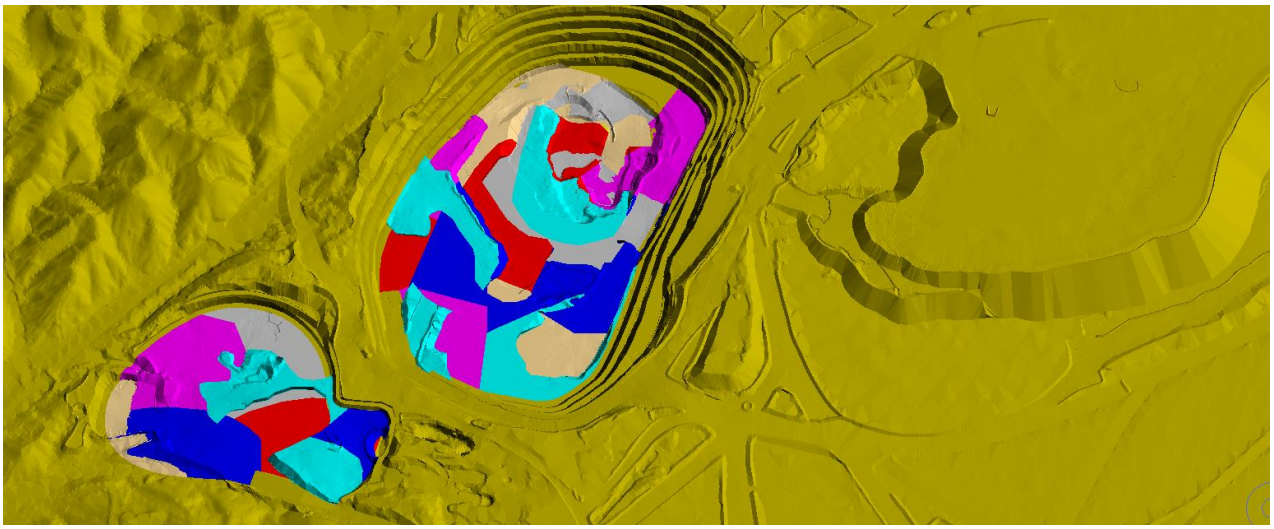


## Semana 3

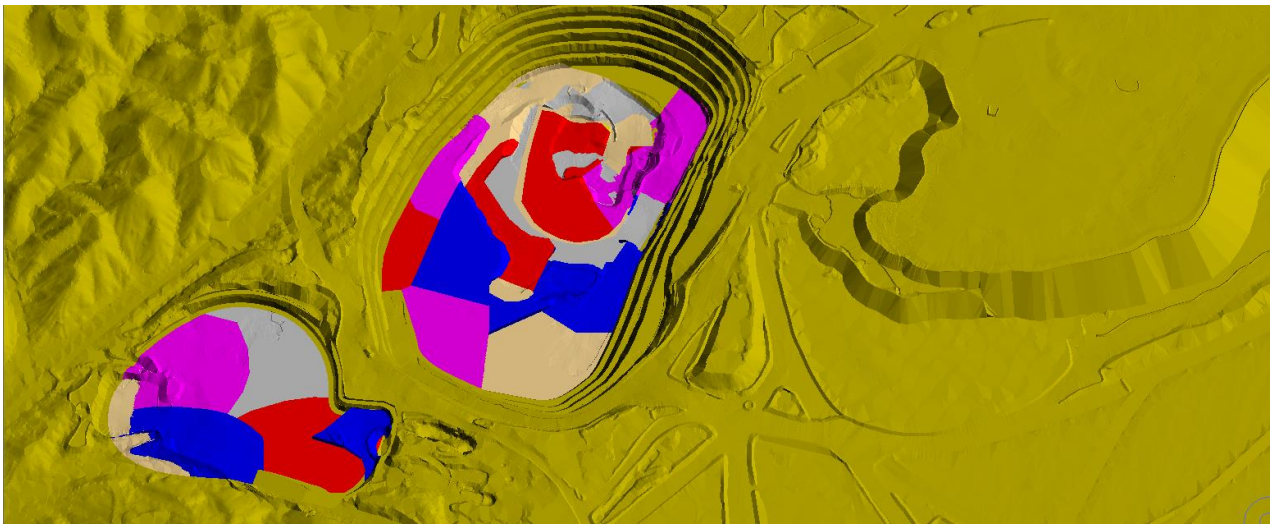

## Semana 4

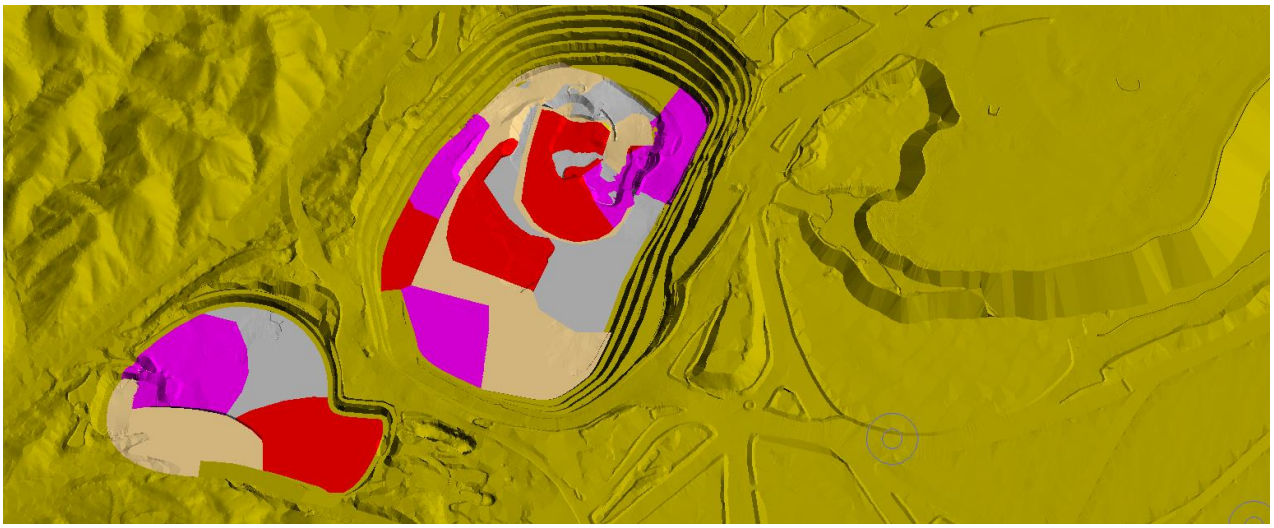

## Semana 5

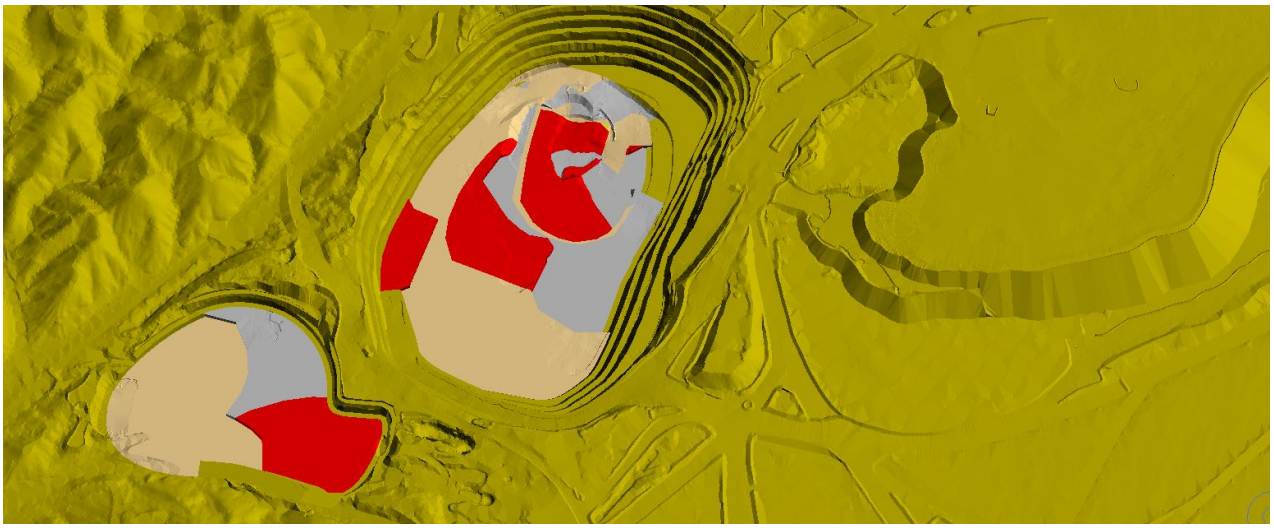


## Rutas de transporte (Mineral y Lastre)



## 3.- PLAN DE APILAMIENTO Y DESCARGA

El plan contempla solo apilamiento de minerales frescos y descarga de canchas.

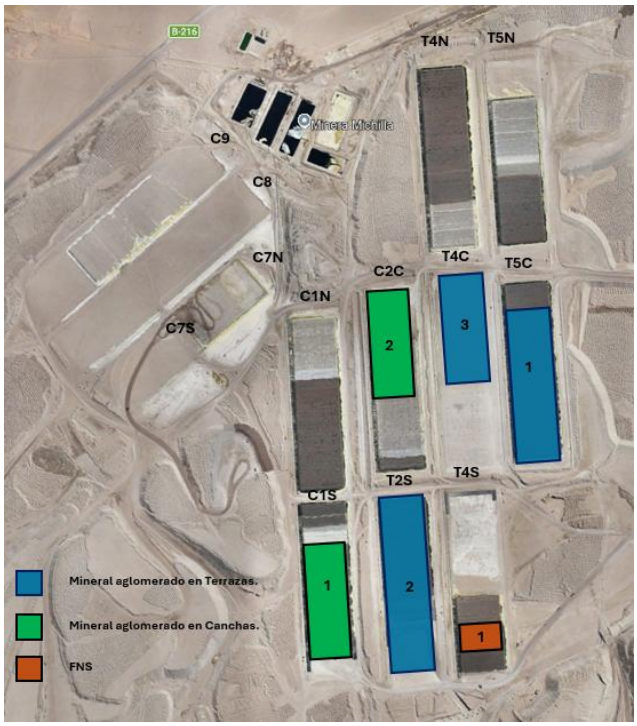


| Mineral aglomerado (h = 1,5 m ; t = 40 días) | | |
|---|---|---|
| **Pila** | **Secuencia** | **Utilización *TMS*** |
| T5C | 1 | 90.650 |
| T2S | 2 | 101.750 |
| T4C | 3 | 40.713 |

| | |
|---|---|
| **Total Terrazas** | **233.113** |

| Mineral aglomerado (h = 1,5 m ; t = 40 días) | | |
|---|---|---|
| **Pila** | **Secuencia** | **Utilización *TMS*** |
| C1S | 1 | 79.550 |
| C2C | 2 | 59.200 |

| | |
|---|---|
| **Total Canchas** | **138.750** |
| **Total aglomerado** | **371.863** |

| FNS (h = 1,5 m ; t = 53 días) | | |
|---|---|---|
| **Pila** | **Secuencia** | **Utilización *TMS*** |
| T4S | 1 | 6.677 |

| | |
|---|---|
| **Total FNS** | **6.677** |
| **Total** | **378.540** |

## 4.- PLAN SORTING

### 4.a Plan.

Para el plan de Sorting, se procesarán 119 [kt] de mineral. Esto se traduce en planta Sorting; 18.1 [kt] de producto con ley de @0.49 %Cut, las cuales se procesarán en Chancado junto con el grueso (2.3 kt @ 0,35%Cut).

| Plan Sorting | | Plan mensual Noviembre | Plan FCST Noviembre |
|---|---|---|---|
| Alim. Tolva | ton | 119,885 | 12,000 |
| | %cut | 0.24 | 0.28 |
| FNS | ton | 55,147 | 56,400 |
| | %cut | 0.21 | 0.25 |
| Grueso | ton | 2,398 | 3,600 |
| | %cut | 0.35 | 0.32 |
| Alim. Sorter | ton | 62,340 | 60,000 |
| | %cut | 0.26 | 0.30 |
| | %Rec. Masa | 29% | 32% |
| | Upgrade | 1.85 | 1.90 |
| Producto | ton | 18,165 | 19,200 |
| | %cut | 0.49 | 0.58 |
| Rechazo | ton | 44,175 | 40,800 |
| | %cut | 0.17 | 0.18 |
| FNS a Lix | | 0 | 33,840 |

## 5.- PLAN ALIMENTACION CHANCADO

### 5.a. Plan de recepción chancado.

Para el plan de recepción chancado se tiene contemplado trabajar turno A y B continuo para alimentar 379 [kton] húmedas de mineral fresco, proveniente desde los distintos orígenes de alimentación.

| | Propio | Compra |
|---|---|---|
| Disponibilidad | 80.9% | 75.0% |
| Utilización | 85.8% | 84.7% |
| Coeficiente marcha | 69.4% | 63.5% |
| h utiles día, base | 499.8 | 457.4 |
| Rend. TMH/h, base | 550 | 228 |

| Octubre | Propio | Compra | Total |
|---|---|---|---|
| 11/1/2026 | 10,065 | 4,026 | 14,091 |
| 11/2/2026 | 3,740 | 4,026 | 7,766 |
| 11/3/2026 | 10,065 | 4,114 | 14,179 |
| 11/4/2026 | 10,065 | 1,166 | 11,231 |
| 11/5/2026 | 10,065 | 4,026 | 14,091 |
| 11/6/2026 | 10,065 | 4,026 | 14,091 |
| 11/7/2026 | 10,065 | 4,026 | 14,091 |
| 11/8/2026 | 10,835 | 4,026 | 14,861 |
| 11/9/2026 | 3,740 | 4,026 | 7,766 |
| 11/10/2026 | 10,065 | 4,114 | 14,179 |
| 11/11/2026 | 10,065 | 1,276 | 11,341 |
| 11/12/2026 | 10,065 | 4,026 | 14,091 |
| 11/13/2026 | 10,065 | 4,026 | 14,091 |
| 11/14/2026 | 10,065 | 4,026 | 14,091 |
| 11/15/2026 | 10,835 | 4,026 | 14,861 |
| 11/16/2026 | 3,740 | 4,026 | 7,766 |
| 11/17/2026 | 10,043 | 4,114 | 14,157 |
| 11/18/2026 | 10,043 | 1,276 | 11,319 |
| 11/19/2026 | 10,065 | 4,026 | 14,091 |
| 11/20/2026 | 10,065 | 4,026 | 14,091 |
| 11/21/2026 | 10,065 | 4,026 | 14,091 |
| 11/22/2026 | 10,835 | 4,026 | 14,861 |
| 11/23/2026 | 10,065 | 3,806 | 13,871 |
| 11/24/2026 | 10,065 | 0 | 10,065 |
| 11/25/2026 | 5,225 | 0 | 5,225 |
| 11/26/2026 | 10,065 | 0 | 10,065 |
| 11/27/2026 | 10,065 | 4,941 | 15,006 |
| 11/28/2026 | 10,065 | 4,941 | 15,006 |
| 11/29/2026 | 10,835 | 4,941 | 15,776 |
| 11/30/2026 | 3,740 | 5,346 | 9,086 |

| Total | 274,846 | 104,451 | 379,297 | TONELADAS HUMEDAS |
|---|---|---|---|---|
| | | | 371,860 | TONELADAS SECAS |

Para tal efecto se tiene contemplado alimentar por la línea de compra un total de 104 [kton] y por línea propia 274 [kton] a un rendimiento de 228 tph y 550 tph respectivamente.


Minerales de Terceros se tienen contemplados ingresar en dos tandas; 20 y 21, cuyo aporte suma 7 [kton] con una ley de 1,30 %Cut.

## 5.b. Plan de Alimentación a Chancado.

El Plan contempla alimentar 371 [Kton] secas, con una ley de 0,54% CuT.

| Origen | Propio | | | Compra | | | Total | | | Total Fcst 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TMS | %Cut | %Cus | TMS | %Cut | %Cus | TMS | %Cut | %Cus | TMS | %Cut | %Cus |
| Fase 15 B | 197,261 | 0.55 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 197,261 | 0.55 | 0.45 | 219,275 | 0.50 | 0.40 |
| Condell | 0 | 0.00 | 0.00 | 54,840 | 0.53 | 0.42 | 54,840 | 0.53 | 0.42 | 121,476 | 0.51 | 0.41 |
| STOCK F15 | 72,248 | 0.46 | 0.38 | 22,690 | 0.56 | 0.46 | 94,939 | 0.49 | 0.40 | | | |
| Juárez | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Producto Sorting | 0 | 0.00 | 0.00 | 18,003 | 0.49 | 0.40 | 18,003 | 0.49 | 0.40 | 23,520 | 0.55 | 0.44 |
| Pompeya/Urbina | 0 | 0.00 | 0.00 | 6,890 | 1.30 | 1.17 | 6,890 | 1.30 | 1.17 | 8,275 | 1.15 | 0.92 |
| **Total** | **269,510** | **0.53** | **0.43** | **102,423** | **0.58** | **0.48** | **371,933** | **0.54** | **0.45** | **372,546** | **0.52** | **0.42** |


Un 53% del mineral alimentado a chancado proviene de mina Fase 15 B, un 14.7% de Condell, un 4.8% proviene del producto Sorting, 1.9% proviene de compra de minerales de terceros (Pompeya, Juarez y Urbina) y 25.5% de rellenos y stock mineralizados

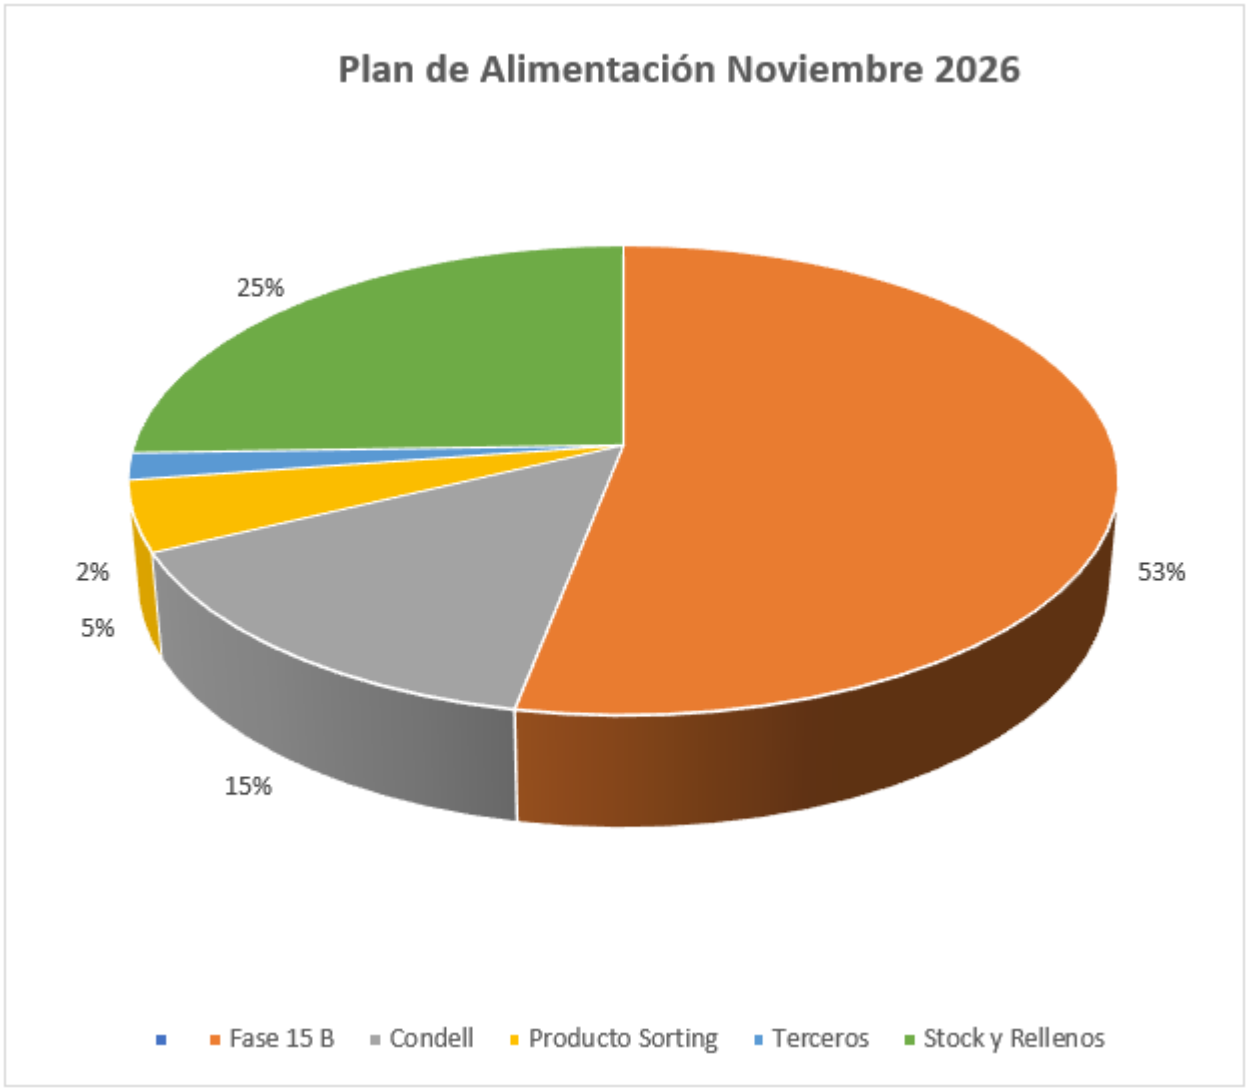

## 6.- PLAN DE PRODUCCION

Para el caso de la producción de cobre fino, está alineado al plan de Trimestral.

| Origen | TMS | Total %Cut | %Cus | Fino Cuf |
|---|---|---|---|---|
| Fase 15 B | 197.261 | 0,55 | 0,45 | 787 |
| Condell | 54.840 | 0,53 | 0,42 | 206 |
| STOCK F15 | 94.939 | 0,49 | 0,40 | 328 |
| Juárez | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Producto Sorting | 18.003 | 0,49 | 0,40 | 58 |
| Pompeya/Urbina | 6.890 | 1,30 | 1,17 | 71 |
| **Total** | **371.933** | **0,542** | **0,45** | **1.450** |

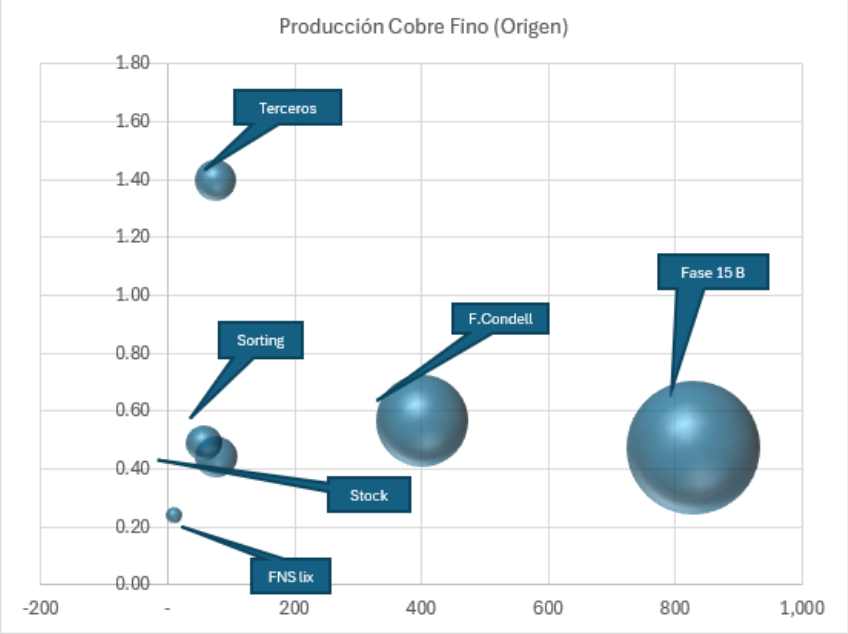

## 7.- RIESGO Y OPORTUNIDAD

### RIESGO

- Dotación incompleta por licencias médicas.
- Presencia de cavidades no reconocidas en el modelo.
- Reducción de tonelaje del Modelo de Bloques.
- Mayor presencia de Camanchaca turnos día, que obligue detención total.
- Baja disponibilidad de equipos de los CAEX 775 y 777
- Baja disponibilidad de los equipos de Vecchiola.
- Baja Dotación de Finning.

### OPORTUNIDAD

- Botadero Sur con potenciales leyes para el Sorting.
- Envío de materiales de terceros el 18 de Noviembre.
- Material de relleno en Fase 15B y Falla Condell podría aportar mayor mineral


# ANEXOS

HMC


25 ktpa | Max Recursos | Sorting | DIA

HMC Minera HMC S.A.


# Análisis Tronadura 10m Falla Condell

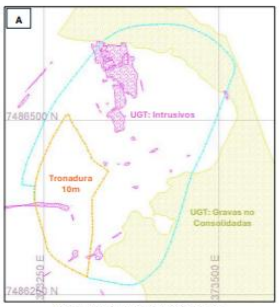

Revisión de unidades Geotécnicas

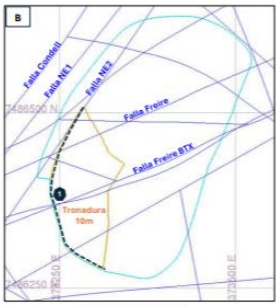

Revisión Estructural



Revisión de interacción con cavidades

**Consideraciones y Recomendaciones Geotécnicas**


Se realiza la revisión de la tronadura planificada a 10 metros en Falla Condell, fase 1.

A. La revisión de unidades geotécnicas muestra que la tronadura se emplaza en zonas de secuencia volcánica, andesitas y brechas volcanoclasticas principalmente. Se debe considerar tronadura controlada para el control de diseño.
B. De la revisión estructural se observa que se generaran bloques de tipo cuñas asociadas al sistema de falla Freire. Se debe planificar la Acuñadura oportuna de estas condiciones en pasadas de **5 metros** de manera de no dejar bloques instables colgados en la cresta del banco.[1]
C. De la revisión de la interacción con cavidades y rellenos de hundimientos se desprende que no existe tal, siendo que la cavidad mayor reconocida mas cercana (CAV-04) está a mas de 50m del piso de perforación, sin embargo, se debe continuar con la programación de testeos a 20 metros para auscultar el sector.


Geotecnia Operativa
SI Geotecnia

# Análisis Tronadura 10m Falla Condell-Geología Producción


Banco Superior 850

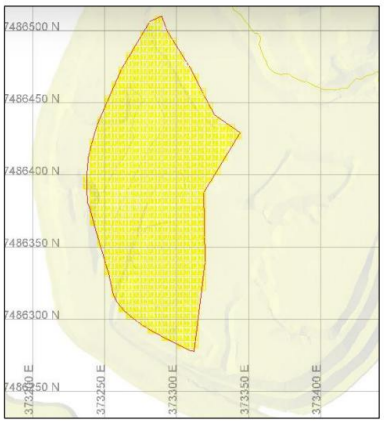


Banco Inferior 845

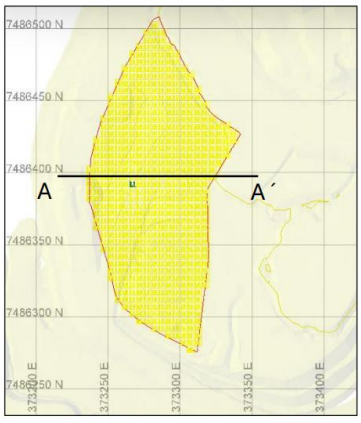


Sección A-A´




**Se analiza sólido planificado para tronadura de 10 metros en Fase 1, Falla Condell:**


- El sólido analizado involucra principalmente a rocas de la secuencia volcánica.
- Se realiza revisión de MB (noviembre) y sondajes involucrados en el sólido.
- Banco Superior 850: No presenta bloque mineralizados
- Banco Inferior 845: Solo involucra un bloque mineralizado de categoría Marginal.

**Recomendaciones por parte de geología:**


- Es posible realizar la tronadura sin efectuar el trabajo de muestreo de pozo de tronadura, sin embargo, para la etapa de extracción se continuará con los chequeos rutinarios de la frente.

25 ktpa | Max Recursos | Sorting | DIA

# Prueba de tronadura en banco de 10 m – Falla Condell




Cota 852,5




Cota 847,5

## Ventajas


- **Menos pozos y metros perforados por tonelada**: taco y pasadura pesan menos
- **Mejor distribución de energía** en la columna; posible baja del factor de carga
- **Menos tronaduras** para el mismo volumen: menos evacuaciones e interferencias
- **Litología homogénea** entre ambas cotas
- **Electrónico**: secuencia pozo a pozo, mejor control de vibraciones y fragmentación

## Desventajas y riesgos

- **Mayor costo**: detonador electrónico obligatorio por largo de pozo
- **Polígono más chico**: compromete los 250 pozos de carguío Enaex
- **Desviación de pozos**: riesgo en burden de fondo y precorte a 75°
- **Más kg por retardo**: vibraciones y onda aérea.
- **Frente más alto**: validar alcance de carguío con Operaciones Mina.

**Reporte de Categorías Fase 15 B**

- 93% de las reservas, están en calidad de Medido + Indicado.
- 7% de las reservas, están en calidad de **Inferido**

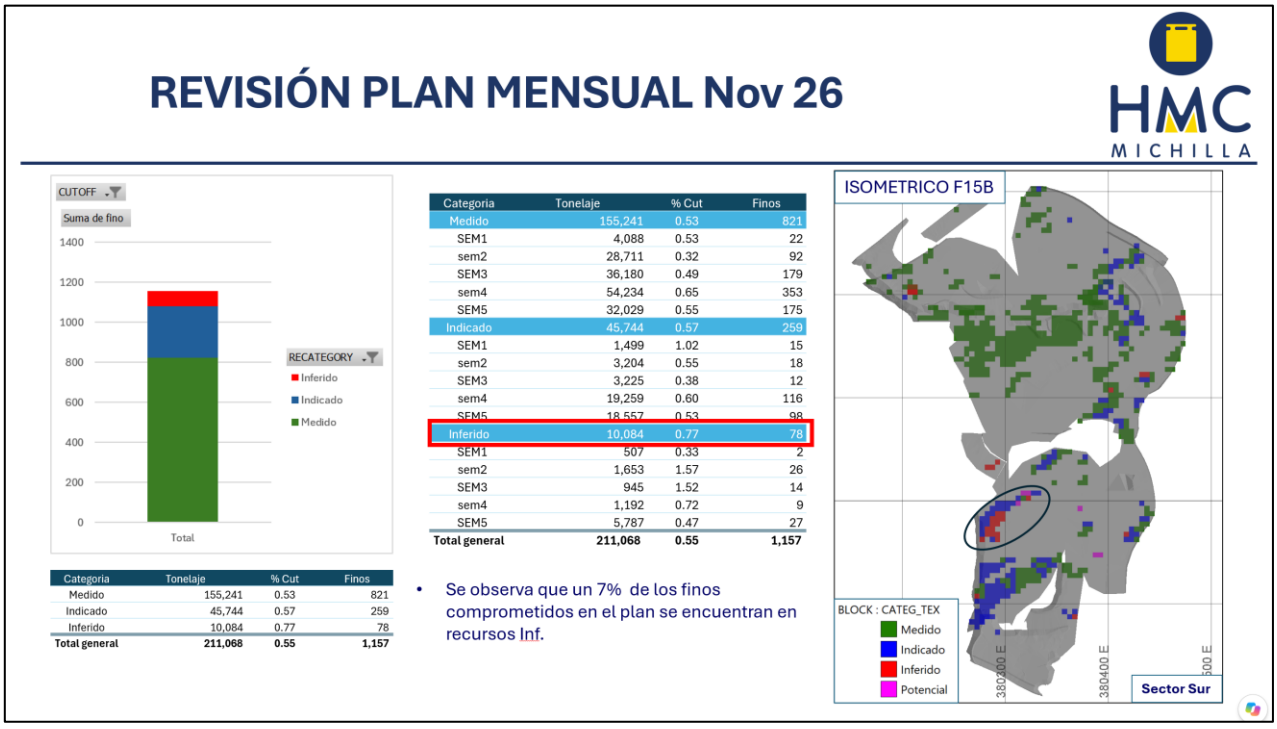


Amenazas:


- Los bloques de mayor incertidumbre geológica corresponden a los ubicados en F02 en el sector sur, principalmente en la semana 5 del plan.
- La mayor proporción de recursos se rescatan del sector norte.
- Bloques Aislados no considerados en cubicacion.
- Existe alta proporcion de recursos Indicados, que tiene mayor incertidumbre que recursos medidos.
- Bloques potenciales no considerados en el plan

Plan de Acción:

- Para disminuir la incertidumbre de dichas zonas (recursos Inferidos+Potenciales), se continuara con las campañas de perforación de sondajes EP4 enfocandose en las zonas centro-Muelle y sur de Fase 2.

**Reporte de Categorías Rajo Falla Condell (Descontando Hundimientos)**

- 90% de las reservas, están en categoría Medido + Indicado
- 10% de las reservas, están en categoría **Inferido**

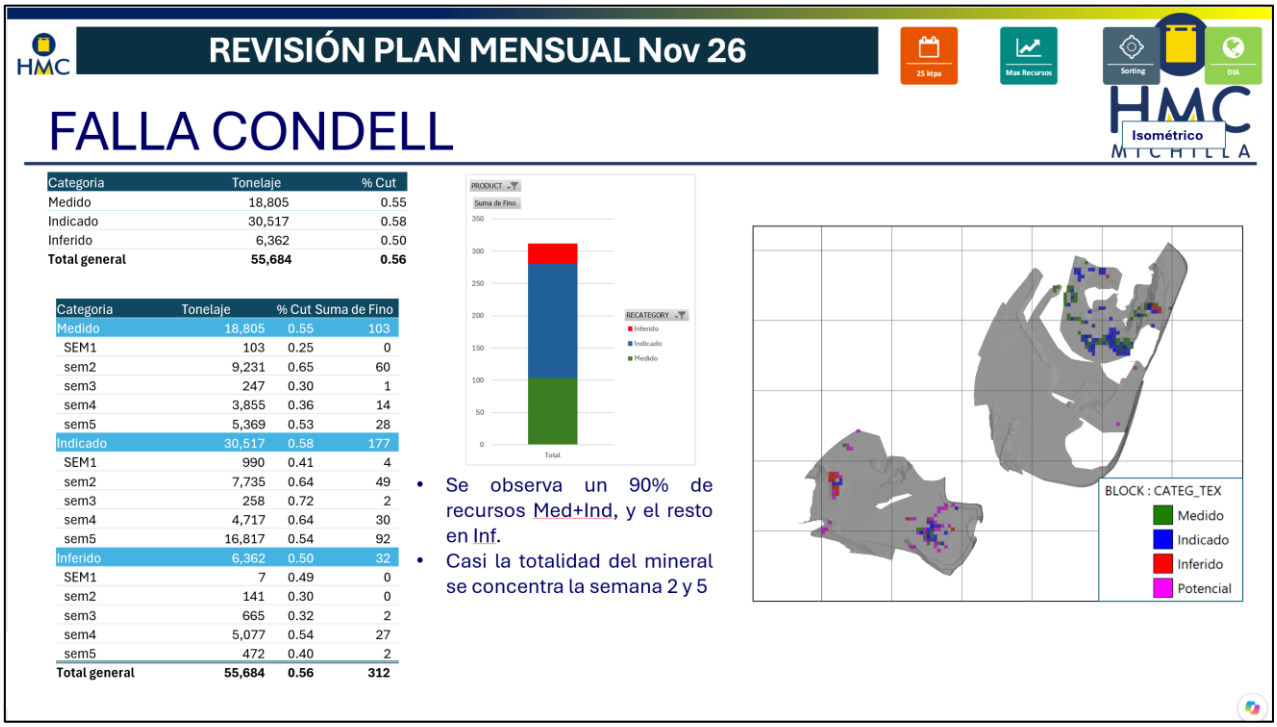


Amenazas:

- Alta incertidumbre por categoría de recursos considerados en el plan, semana 5 concentra la mayoria de los finos del plan en recursos Inf (banco 835).
- Alta proporción de bloques en sectores de zona de hundimiento.
- Alta proporcion de Inferidos en Fase 3.

Plan de Acción:

- Las zonas de alta incertidumbre y ley deben ser identificadas con muestreo especial en el banco.
- No deben ser considerados en el plan mensual de extracción mina bloques en hundimiento por cavidades ni bloques aislados ni bloques potenciales.
- Campaña de sondajes Ep4 para recategorizar bloques Inf+Pot.
