







PLAN MENSUAL OCTUBRE 2026

HMC Michilla

SUPERINTENDENCIA DE PLANIFICACION

HMC Michilla

OCTUBRE 2026

Adjunto se encuentra Plan Mensual de Octubre de 2026 y las bases de construcción para soportar el plan de cobre fino a producir en el mes.

Nombre	Cargo	Firma
Ricardo Vergara	Superintendente Planta	
Carlos Ruiz	Superintendente Mantención Planta	
Victorino Moyano	Superintendente de Geología	
Albino Vargas	Superintendente Geomecánica	
Leopoldo Bustos	Superintendente Mina	
Marco Cornejo	Subgerente Mina	
Patricio Bracamonte	Superintendente de Planificación Mina	
Manuel Rivera	Subgerente de Planificación & Desarrollo	

Recepcionado	Cargo	Firma
Juan Henríquez	Gerente de Operaciones	

Índice

1. Objetivos
2. Consideraciones
3. Fase 15 B
    a. Términos de Referencia
    b. Plan de disponibilidad de equipos
    c. Requerimientos de flota
    d. Plan Minero
    e. Secuencia Plan Minero
4. Condell
    a. Términos de Referencia
    b. Plan Minero
5. Ripios
    a. Términos de Referencia
    b. Requerimientos de equipos mina
    c. Secuencia Plan Minero
6. Sorting
    a. Plan
    b. Secuencia
7. Plan de Alimentación
    a. Plan de recepción chancado
    b. Plan de alimentación Planta
8. Plan de Producción

1.Objetivos

- Operar con seguridad y productividad.
- Cumplir con la meta de mineral alimentado al Chancado del Ppto.
- Cumplir con movimientos mina de cuerdo a Ppto.
- Cumplir con alimentación de mineral a tolva Sorting.

2. Antecedentes y Consideraciones

- Se considera topografía actualizada al 24 de septiembre para ambas minas y se proyecta topografía para partir con la secuencia del plan.
- Modelo de Bloques entregados el 21 de septiembre.
    - Fase 15 B
    - Condell
- Plan de disponibilidad mina y chancado, entregado por las áreas operativas.
- Estrategia de leyes de corte:
    - Fase 15 B:
        - Mineral (Cut >= 0,24%)
        - Marginal (0,20% <= %Cut < 0,24)
        - Lastre (Cut < 0,20%)
    - Condell
        - Mineral (Cut >= 0,25%)
        - Marginal (0,20% <= %Cut < 0,25)
        - Lastre (Cut < 0,20%)

2.1 Resumen Plan Mensual

Para el mes de OCTUBRE se tiene el siguiente movimiento mina:

Mina Fase 15 B - Mov Total			Pmes	Forecast	Dif Pmes-Fcst	Plan Trimestral
Fase 15 B	Mineral	Ton	280,063	306,348	-26,285	266,620
		%Cut	0.49	0.47	0.02	0.53
	Marginal	Ton	60,561	56,166	4,395	44,289
		%Cut	0.22	0.22	0.00	0.22
	Lastre	Ton	896,725	1,019,639	-122,914	908,281
	Total	Ton	1,237,349	1,382,153	-144,804	1,219,190

El plan mensual muestra una menor cantidad de ley, debido al retraso generado por los eventos de chancador propio y baja disponibilidad de equipos de transporte que impiden llegar rápidamente a las mejores leyes debajo de las cavidades 13 y nueva.

Mina Condell			Pmes	Forecast	Dif Pmes-Fcst	Plan Trimestral
Condell	Mineral	Ton	82,128	169,048	-86,920	98,710
		%Cut	0.51	0.49	0.02	0.54
	Marginal	Ton	9,706	22,571	-12,865	12,703
		%Cut	0.23	0.23	0.00	0.22
	Lastre	Ton	1,078,482	921,158	157,324	1,047,680
	Total	Ton	1,170,316	1,112,777	57,539	1,159,093

El plan mensual de Condell presenta un retraso principalmente en la F03, donde la falta de equipos por baja disponibilidad de la flota impacta directamente en el movimiento total.

Chancado			Pmes	Forecast	Dif Pmes-Fcst	Plan Trimestral
	L Propia	Ton H	287,840	258,271	29,569	290064
	L Compra	Ton H	115,720	132,723	-17,003	115270
	Total	Ton	403,560	390,994	12,566	405,334

Para el caso de la planta de chancado se programa 403 kton húmedas, mejorando el Forecast.

Sorting			Pmes	Forecast	Dif Pmes-Fcst	Plan Trimestral
	Alimentación tolva	Ton	114,765	120,000	-5,235	111397
	FNS	Ton	52,792	56,400	-3,608	52357
	Grueso	Ton	2,295	3,600	-1,305	3342
	Producto	Ton	17,389	19,200	-1,811	16114
	Rechazo	Ton	42,289	40,800	1,489	39584
	FNS a LIX	Ton	6,900	33,840	-26940	42000

Por estrategia, Sorting solo opera durante el turno A

Cu Fino			Pmes	Forecast	Dif Pmes-Fcst	Plan Trimestral
	Cu Fino	Ton	**1,400**	1,569	-169	1587

Para el caso de la producción de cobre fino, está bajo en 429 ton con respecto al Forecast por desfase provocado por la falta de equipos y las detenciones climáticas, impidiendo llegar a las zonas comprometidas.

3.- Plan Minero Fase 15 B

3.a. Términos de Referencia

Los términos de referencia del Plan Minero son los entregables de las distintas áreas con las que se construye el Plan y que para el caso del Plan Mensual de Octubre 2026 son:

- Modelo de bloques actualizado entregado por geología, Modelo Trimestral sep-oct-nov 2026. (TRI_F15B_OCT-NOV-DIC26.bmf)
- Plan de Disponibilidad de Equipos Mina Octubre 2026.

3.b. Plan de Disponibilidad de Equipos

Entre las mantenciones de Octubre se destacan las siguientes:

Cargadores Frontales

Cargadores frontales solo mantenciones programadas

Plan	1-Oct	2-Oct	3-Oct	4-Oct	5-Oct	6-Oct	7-Oct	8-Oct	9-Oct	10-Oct	11-Oct	12-Oct	13-Oct	14-Oct	15-Oct	16-Oct	17-Oct	18-Oct	19-Oct	20-Oct	21-Oct	22-Oct	23-Oct	24-Oct	25-Oct	26-Oct	27-Oct	28-Oct	29-Oct	30-Oct	31-Oct
Cargador	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
L03	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.44	0.90	0.90	0.90	0.90	0.78	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.44	0.90	0.90	0.90	0.90
L04	0.90	0.90	0.78	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.78	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.25	0.90	0.90	0.90	0.78	0.90	0.90	0.90
L05	0.92	0.46	0.92	0.92	0.92	0.92	0.88	0.92	0.79	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.00	0.92	0.92	0.92	0.83	0.92	0.79	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.46
L06	0.92	0.92	0.92	0.92	0.00	0.92	0.83	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.46	0.92	0.79	0.92	0.92	0.92	0.79	0.92	0.92	0.92	0.00	0.46	0.92
Total	**0.91**	**0.79**	**0.88**	**0.91**	**0.68**	**0.91**	**0.88**	**0.91**	**0.88**	**0.68**	**0.79**	**0.68**	**0.91**	**0.91**	**0.91**	**0.88**	**0.68**	**0.88**	**0.79**	**0.91**	**0.86**	**0.91**	**0.88**	**0.75**	**0.88**	**0.68**	**0.79**	**0.88**	**0.68**	**0.80**	**0.80**

CAEX 775 y 777

T12: Cambio de cilindros de dirección
T17: Desde el 20 hasta fin de mes, reparación en taller externo por cambio de componentes mayores.
T19: Desde el 1 al 14, cambio de culatas.
T21: Desde el 1 al 14, cambio de culatas.

	1-Oct	2-Oct	3-Oct	4-Oct	5-Oct	6-Oct	7-Oct	8-Oct	9-Oct	10-Oct	11-Oct	12-Oct	13-Oct	14-Oct	15-Oct	16-Oct	17-Oct	18-Oct	19-Oct	20-Oct	21-Oct	22-Oct	23-Oct	24-Oct	25-Oct	26-Oct	27-Oct	28-Oct	29-Oct	30-Oct	31-Oct
Cat 775	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
T-11	0.92	0.93	0.93	0.92	0.46	0.93	0.93	0.92	0.93	0.93	0.93	0.84	0.93	0.93	0.75	0.93	0.93	0.93	0.25	0.93	0.88	0.93	0.93	0.93	0.84	0.93	0.93	0.92	0.93	0.93	0.46
T-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.45	0.90	0.90	0.83	0.90	0.90	0.90	0.74	0.90	0.90	0.90	0.90	0.25	0.87	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.45
T-13	0.91	0.90	0.83	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.45	0.90	0.90	0.83	0.90	0.90	0.90	0.74	0.90	0.90	0.83	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.25	0.90	0.90	0.90	0.90
T-15	0.90	0.91	0.90	0.00	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.90	0.83	0.90	0.91	0.90	0.90	0.45	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.83	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.25
T-16	0.90	0.91	0.90	0.90	0.83	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.45	0.90	0.74	0.90	0.90	0.90	0.90	0.83	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.90	0.25	0.90	0.90	0.90
T-17	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.90	0.83	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.74	0.90	0.90	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T-18	0.90	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.45	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.83	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.90	0.25	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.83
T-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.83	0.90	0.91	0.90	0.90	0.83	0.90	0.91	0.90	0.91	0.90	0.25
T-20	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.74	0.90	0.90	0.45	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.90	0.25	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.91
T-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.25	0.90	0.91	0.90	0.90	0.90	0.83	0.90	0.90	0.90	0.45	0.90	0.90	0.90	0.91
T-23	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.83	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.83	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.45
T-24	0.90	0.91	0.90	0.90	0.83	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.45	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.83	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.00	0.00	0.90	0.91	0.90
Total	**0.68**	**0.68**	**0.67**	**0.60**	**0.63**	**0.66**	**0.67**	**0.71**	**0.68**	**0.75**	**0.71**	**0.66**	**0.75**	**0.76**	**0.74**	**0.84**	**0.85**	**0.89**	**0.83**	**0.82**	**0.82**	**0.76**	**0.77**	**0.77**	**0.81**	**0.83**	**0.66**	**0.70**	**0.83**	**0.83**	**0.60**

	1-Oct	2-Oct	3-Oct	4-Oct	5-Oct	6-Oct	7-Oct	8-Oct	9-Oct	10-Oct	11-Oct	12-Oct	13-Oct	14-Oct	15-Oct	16-Oct	17-Oct	18-Oct	19-Oct	20-Oct	21-Oct	22-Oct	23-Oct	24-Oct	25-Oct	26-Oct	27-Oct	28-Oct	29-Oct	30-Oct	31-Oct
Cat 777	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
T-83	0.90	0.90	0.90	0.45	0.90	0.90	0.90	0.93	0.90	0.90	0.83	0.90	0.90	0.90	0.93	0.90	0.90	0.25	0.90	0.90	0.90	0.90	0.93	0.83	0.90	0.90	0.93	0.90	0.45	0.90	0.90
T-86	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.45	0.93	0.90	0.90	0.90	0.83	0.90	0.90	0.90	0.93	0.90	0.90	0.25	0.90	0.90	0.83	0.93	0.90	0.90	0.90	0.93	0.90	0.90	0.45	0.90
Total	**0.90**	**0.90**	**0.90**	**0.68**	**0.90**	**0.90**	**0.68**	**0.93**	**0.90**	**0.90**	**0.86**	**0.86**	**0.90**	**0.90**	**0.91**	**0.91**	**0.90**	**0.58**	**0.58**	**0.90**	**0.90**	**0.86**	**0.93**	**0.86**	**0.90**	**0.90**	**0.93**	**0.90**	**0.68**	**0.68**	**0.90**

PERFORADORAS

D05: Deslizamiento pasador de BOOM

	1-Oct	2-Oct	3-Oct	4-Oct	5-Oct	6-Oct	7-Oct	8-Oct	9-Oct	10-Oct	11-Oct	12-Oct	13-Oct	14-Oct	15-Oct	16-Oct	17-Oct	18-Oct	19-Oct	20-Oct	21-Oct	22-Oct	23-Oct	24-Oct	25-Oct	26-Oct	27-Oct	28-Oct	29-Oct	30-Oct	31-Oct
Perforadoras	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
D02	0.91	0.78	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.78	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.00	0.45	0.91	0.91	0.91	0.78	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.45
D05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D06	0.91	0.91	0.78	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.00	0.45	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.78	0.91	0.91	0.78	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.45	0.91	0.91	0.87
D07	0.91	0.91	0.91	0.91	0.45	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.78	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.45	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.87
Total	**0.68**	**0.65**	**0.65**	**0.68**	**0.57**	**0.68**	**0.68**	**0.65**	**0.68**	**0.68**	**0.68**	**0.45**	**0.57**	**0.65**	**0.68**	**0.45**	**0.57**	**0.68**	**0.65**	**0.68**	**0.65**	**0.65**	**0.45**	**0.45**	**0.57**	**0.68**	**0.68**	**0.57**	**0.68**	**0.68**	**0.55**

3.c Calculo de Requerimiento de Equipos

El calculo de equipo respecto a rendimiento y cantidad de flota, será de la siguiente forma:

Cargadores frontales

	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
L03																		
DF	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	0%	44%	90%	90%	90%	90%	78%	90%	90%
UTBD	0%	0%	0%	0%	85%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	85%	0%
REND	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
TONS	0	0	0	0	9,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,017	0
L04																		
DF	90%	90%	78%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	0%	90%	90%	90%	90%	90%	78%
UTBD	75%	75%	75%	75%	85%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	85%	75%
REND	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509
TONS	8,265	8,265	7,120	8,265	9,367	8,265	8,265	8,265	8,265	8,265	8,265	0	8,265	8,265	8,265	8,265	9,367	7,120
L05																		
DF	92%	46%	92%	92%	92%	92%	88%	92%	79%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	0%	92%
UTBD	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%
REND	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
TONS	18,680	9,340	18,680	18,680	18,680	18,680	17,831	18,680	16,132	18,680	18,680	18,680	18,680	18,680	18,680	18,680	0	18,680
L06																		
DF	92%	92%	92%	92%	0%	92%	83%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
UTBD	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%
REND	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955
TONS	18,778	18,778	18,778	18,778	0	18,778	17,071	18,778	18,778	18,778	18,778	18,778	18,778	18,778	18,778	18,778	18,778	18,778

	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
L03													
DF	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	0%	44%	90%	90%	90%	90%
UTBD	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
REND	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
TONS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L04													
DF	90%	90%	90%	90%	90%	25%	90%	90%	90%	78%	90%	90%	90%
UTBD	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
REND	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509
TONS	8,265	8,265	8,265	8,265	8,265	2,291	8,265	8,265	8,265	7,120	8,265	8,265	8,265
L05													
DF	92%	92%	83%	92%	79%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	46%
UTBD	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%
REND	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
TONS	18,680	18,680	16,982	18,680	16,132	18,680	18,680	18,680	18,680	18,680	18,680	18,680	9,340
L06													
DF	46%	92%	79%	92%	92%	92%	79%	92%	92%	92%	0%	46%	92%
UTBD	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%
REND	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955
TONS	9,389	18,778	16,217	18,778	18,778	18,778	16,217	18,778	18,778	18,778	0	9,474	18,863

HMC

25 ktpa | Max Recursos | Sorting | DIA

CAEX 775 y 777

	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
CAT 775																		
CAEX flota	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
CAEX operativos	8.1	8.2	8.1	7.2	7.5	7.9	8.1	8.6	8.1	9.0	8.5	8.0	9.0	9.2	8.9	10.1	10.2	10.7
DF	68%	68%	67%	60%	63%	66%	67%	71%	68%	75%	71%	66%	75%	76%	74%	84%	85%	89%
UTBD	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
REND	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
TONS	34,058	34,180	33,831	30,253	31,475	33,098	33,761	35,909	34,111	37,881	35,612	33,395	37,846	38,440	37,131	42,141	42,664	44,759
CAT 777																		
CAEX flota	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CAEX operativos	1.8	1.8	1.8	1.4	1.8	1.8	1.4	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.2
DF	90%	90%	90%	68%	90%	90%	68%	93%	90%	90%	86%	86%	90%	90%	91%	91%	90%	58%
UTBD	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
REND	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
TONS	10,733	10,684	10,684	8,013	10,684	10,684	8,013	11,030	10,684	10,684	10,238	10,238	10,684	10,684	10,857	10,857	10,684	6,826

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
CAT 775													
CAEX flota	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
CAEX operativos	10.0	9.8	9.9	9.1	9.2	9.3	9.8	9.9	7.9	8.4	9.9	9.9	8.9
DF	83%	82%	82%	76%	77%	77%	81%	83%	66%	70%	83%	83%	74%
UTBD	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
REND	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
TONS	41,687	40,989	41,390	38,265	38,545	38,789	40,971	41,617	33,238	35,175	41,652	41,617	37,247
CAT 777													
CAEX flota	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CAEX operativos	1.2	1.8	1.8	1.7	1.9	1.7	1.8	1.8	1.9	1.8	1.4	1.4	1.7
DF	58%	90%	90%	86%	93%	86%	90%	90%	93%	90%	68%	68%	85%
UTBD	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
REND	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
TONS	6,826	10,684	10,684	10,238	11,030	10,238	10,684	10,684	11,030	10,684	8,013	8,013	10,079

Perforación: Se necesita perforar 21,467 metros durante el mes, y tenemos una capacidad de 22.214 metros.

	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
D02																		
DF	91%	78%	91%	91%	91%	91%	91%	78%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	0%	45%	91%
USO	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
REND	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
METROS	262	226	262	262	262	262	262	226	262	262	262	262	262	262	262	0	130	262
D06																		
DF	91%	91%	78%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	0%	45%	91%	91%	91%	91%	91%
USO	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
REND	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
METROS	262	262	226	262	262	262	262	262	262	262	262	0	130	262	262	262	262	262
D07																		
DF	91%	91%	91%	91%	45%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	78%	91%	91%	91%	91%
USO	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
REND	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
METROS	262	262	262	262	130	262	262	262	262	262	262	262	262	226	262	262	262	262

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
D02													
DF	91%	91%	78%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	45%
USO	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
REND	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
METROS	262	262	226	262	262	262	262	262	262	262	262	262	130
D06													
DF	78%	91%	91%	78%	91%	91%	91%	91%	91%	45%	91%	91%	87%
USO	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
REND	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
METROS	226	262	262	226	262	262	262	262	262	130	262	262	250
D07													
DF	91%	91%	91%	91%	0%	0%	45%	91%	91%	91%	91%	91%	87%
USO	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
REND	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
METROS	262	262	262	262	0	0	130	262	262	262	262	262	250

3.d Plan Minero Propio

El Plan de Fase 15 B estima extraer 280 kt de mineral de una ley de @0,49 CuT, con un movimiento total de 1.237 kt. (El plan corta de lunes a Domingo para efectos de cuadrarse con el plan semanal)


Septiembre	Marginal 1 (0.20 a 0.24)			Baja Ley 1 (0.24 a 0.29)			Baja Ley 2 (0.29 a 0.7)			Alta Ley (>0.7)			Mineral Alimentable			Lastre	TOTAL
	Ton	%Cut	%Cus	Ton	%Cut	%Cus	Ton	%Cut	%Cus	Ton	%Cut	%Cus	Ton	%Cut	%Cus	Ton	Ton
SEM1	6,109	0.21	0.16	5,275	0.26	0.20	21,482	0.44	0.36	5,208	1.01	0.89	31,965	0.50	0.42	110,316	148,391
SEM2	18,681	0.22	0.17	16,823	0.26	0.21	48,251	0.43	0.34	6,088	0.93	0.79	71,161	0.43	0.35	197,942	287,785
SEM3	9,965	0.22	0.17	12,324	0.26	0.21	24,844	0.44	0.35	9,858	1.05	0.84	47,026	0.52	0.41	236,450	293,441
SEM4	12,767	0.22	0.18	17,259	0.26	0.21	50,699	0.42	0.34	9,774	0.95	0.79	77,732	0.45	0.37	189,149	279,647
SEM5	13,039	0.22	0.17	10,118	0.26	0.20	27,233	0.45	0.37	14,827	1.10	0.99	52,179	0.60	0.51	162,868	228,086
TOTAL	**60,561**	**0.22**	**0.17**	**61,800**	**0.26**	**0.21**	**172,509**	**0.43**	**0.35**	**45,755**	**1.03**	**0.88**	**280,063**	**0.49**	**0.40**	**896,725**	**1,237,350**

1.e Secuencia Plan Minero Propio


Leyenda:




Semana 1

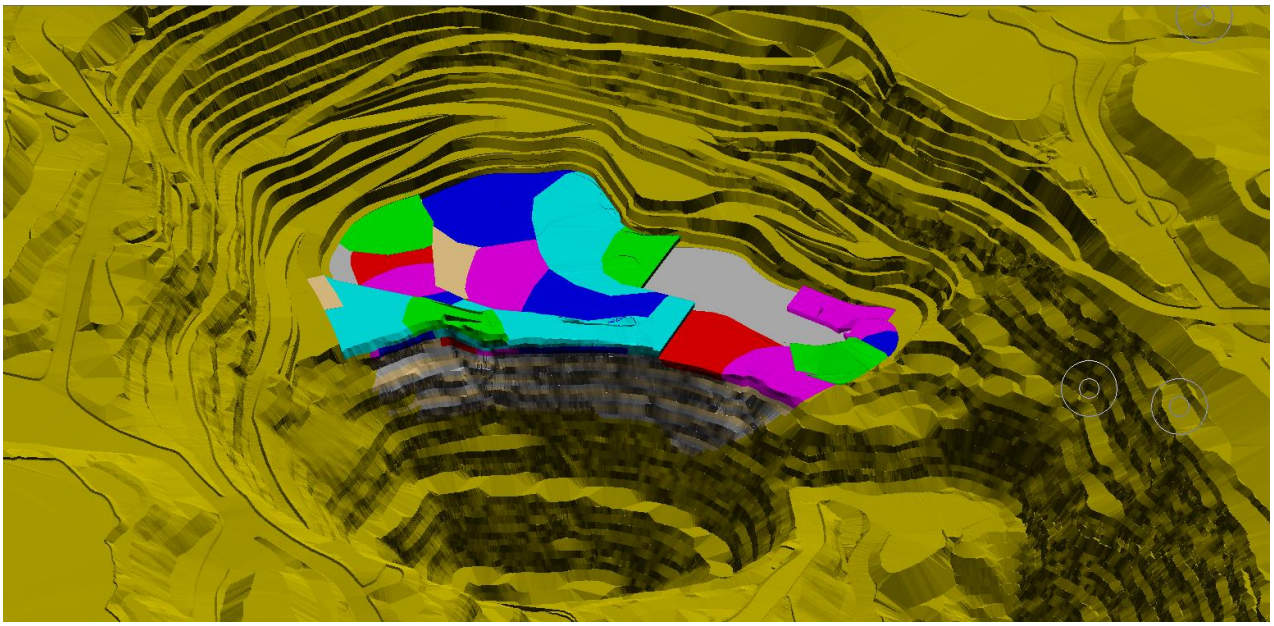


Semana 2

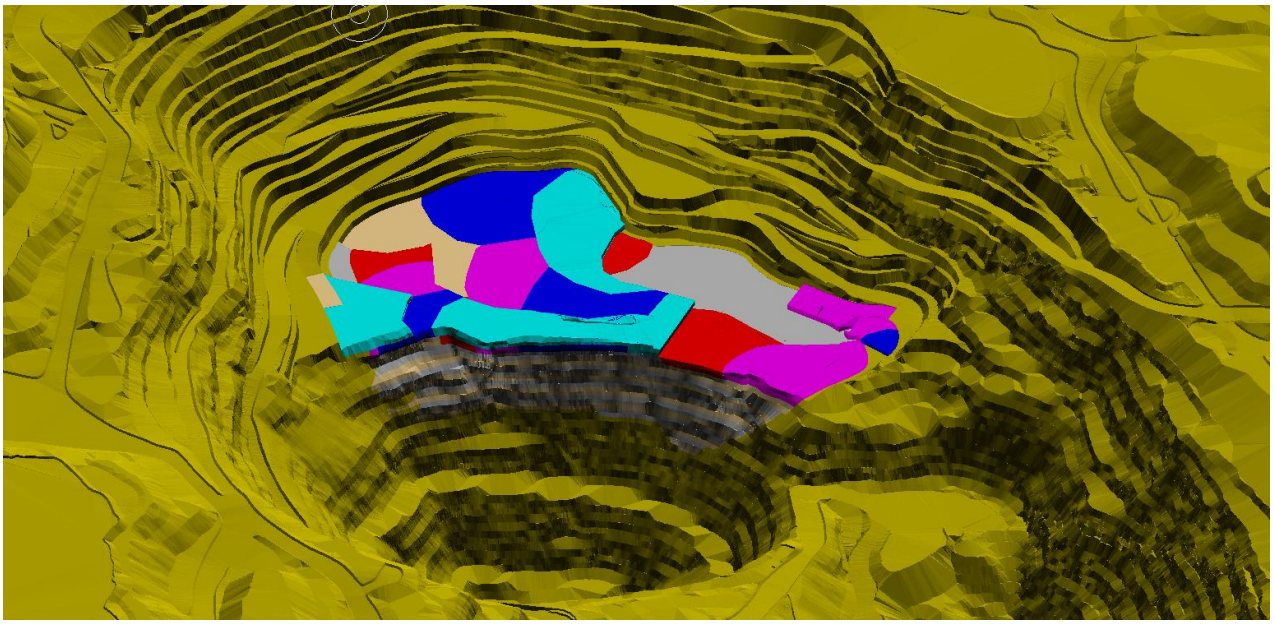


Semana 3

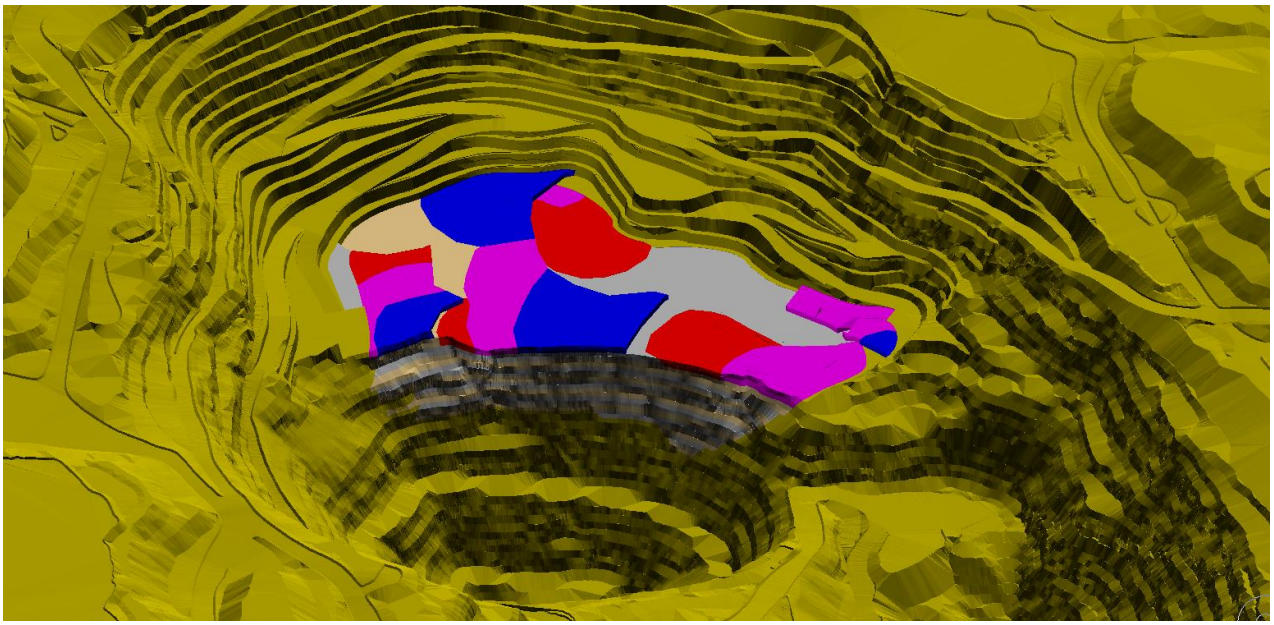


Semana 4

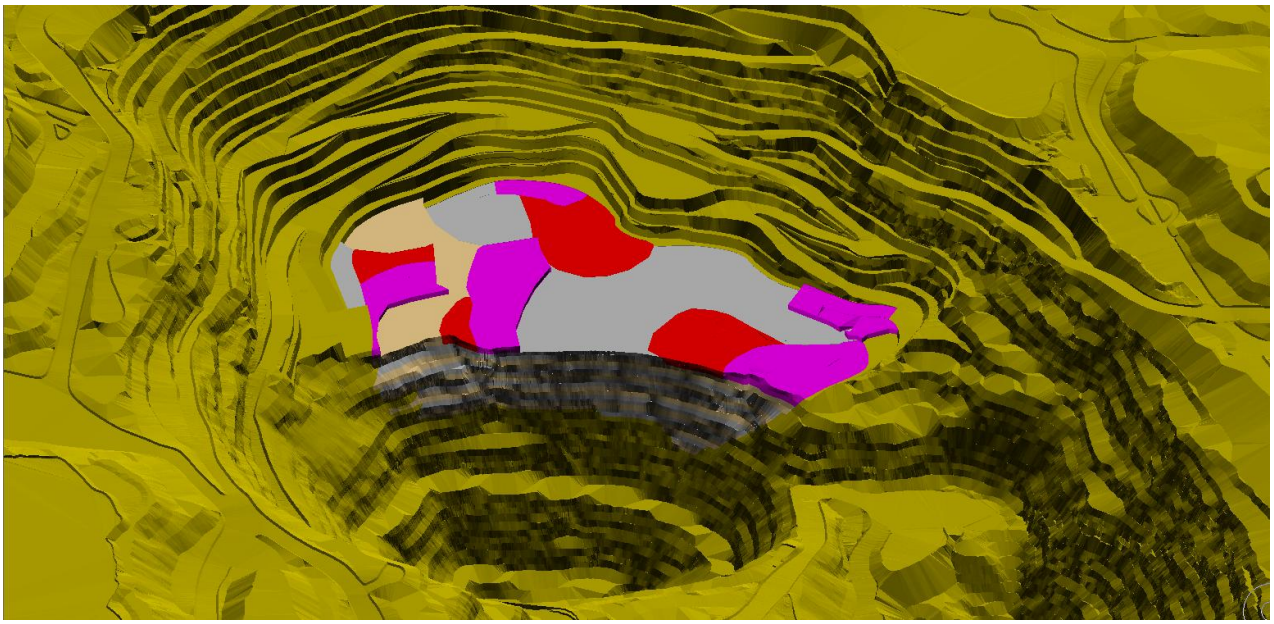

Semana 5

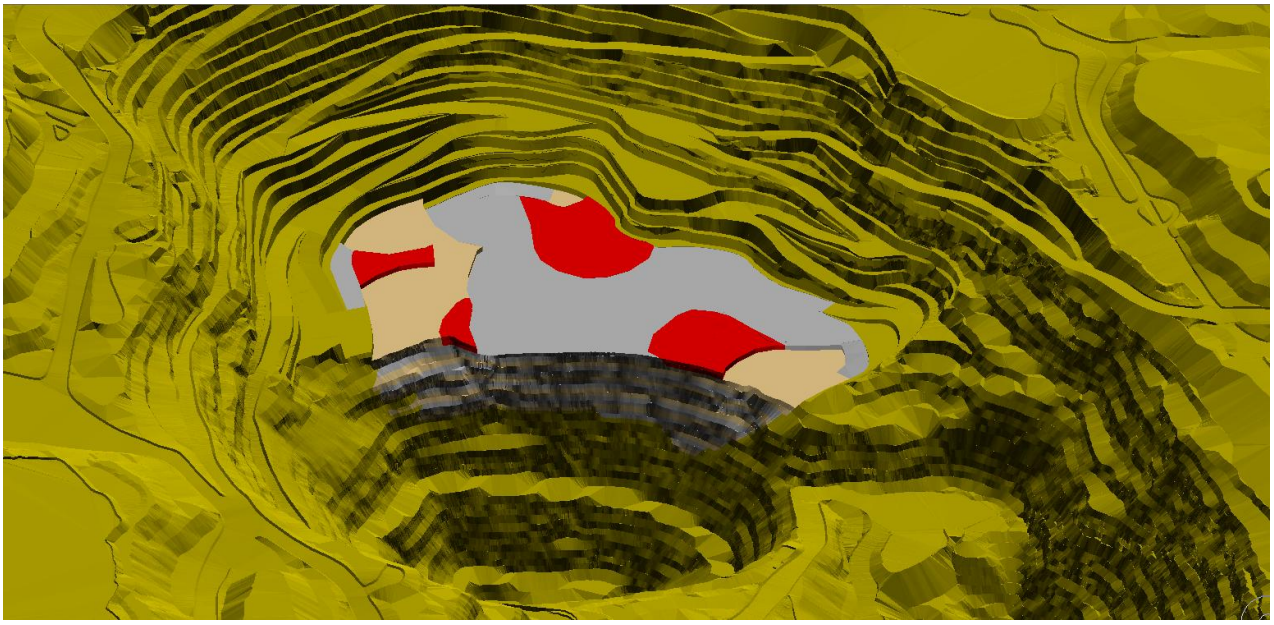

Rutas de transporte (Mineral y Lastre)

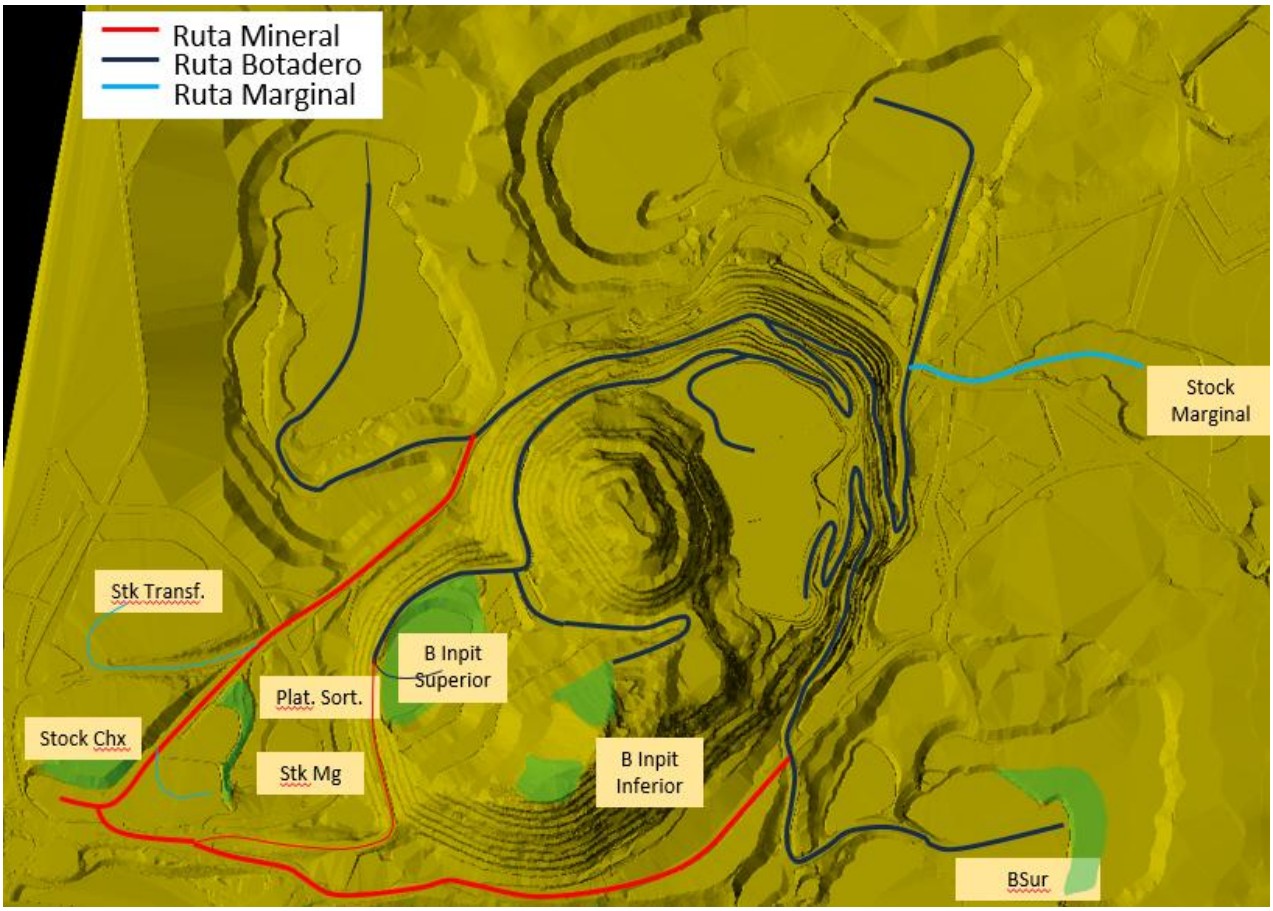

4.- PLAN MINERO FALLA CONDELL

4.a. Términos de Referencia

Los términos de referencia del Plan Minero son los entregables de las distintas áreas con las que se construye el Plan y que para el caso del Plan Mensual de Octubre 2026 son:

- Modelo de bloques actualizado entregado por geología, Modelo Bloques Falla Condell. (TRI_FC_OCT_NOV_SEP26_RELL.BMF)


4.b. Plan Minero

El Plan de Falla Condell estima en 56 [kt] de mineral insitu de una ley @0,66% CuT, con un movimiento total de 1.143 [kt]. (El plan corta de lunes a domingo para efectos de cuadrarse con el plan semanal).


Septiembre	Marginal 1 (0.20 a 0.24)			Baja Ley 1 (0.25 a 0.7)			Alta Ley (>0.7)			Mineral Alimentable			Lastre	TOTAL
	Ton	%Cut	%Cus	Ton	%Cut	%Cus	Ton	%Cut	%Cus	Ton	%Cut	%Cus	Ton	Ton
SEM1	646	0.22	0.20	987	0.39	0.34	0	0.00	0.00	987	0.39	0.34	171,014	172,646
SEM2	2,934	0.22	0.19	15,262	0.47	0.41	1,112	1.05	0.90	16,373	0.51	0.45	233,373	252,680
SEM3	2,364	0.23	0.19	7,864	0.48	0.38	1,289	1.02	0.75	9,153	0.55	0.44	239,451	250,968
SEM4	3,005	0.23	0.20	7,856	0.42	0.37	1,962	0.90	0.80	9,818	0.51	0.46	242,854	255,677
SEM5	758	0.23	0.20	15,097	0.47	0.39	4,365	0.98	0.73	19,462	0.59	0.47	191,791	212,011
TOTAL	**9,706**	**0.23**	**0.19**	**47,066**	**0.46**	**0.39**	**8,727**	**0.98**	**0.77**	**55,793**	**0.54**	**0.45**	**1,078,482**	**1,143,982**

4.c Secuencia Plan Minero Falla Condell


Semana 1

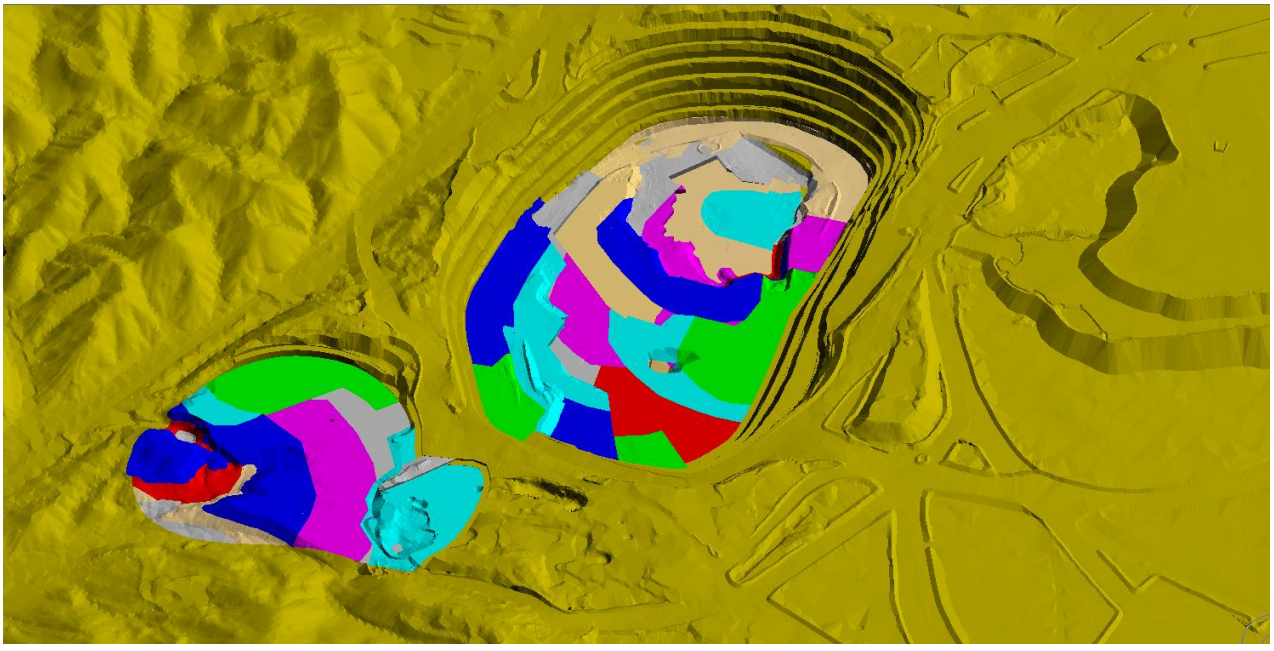


Semana 2

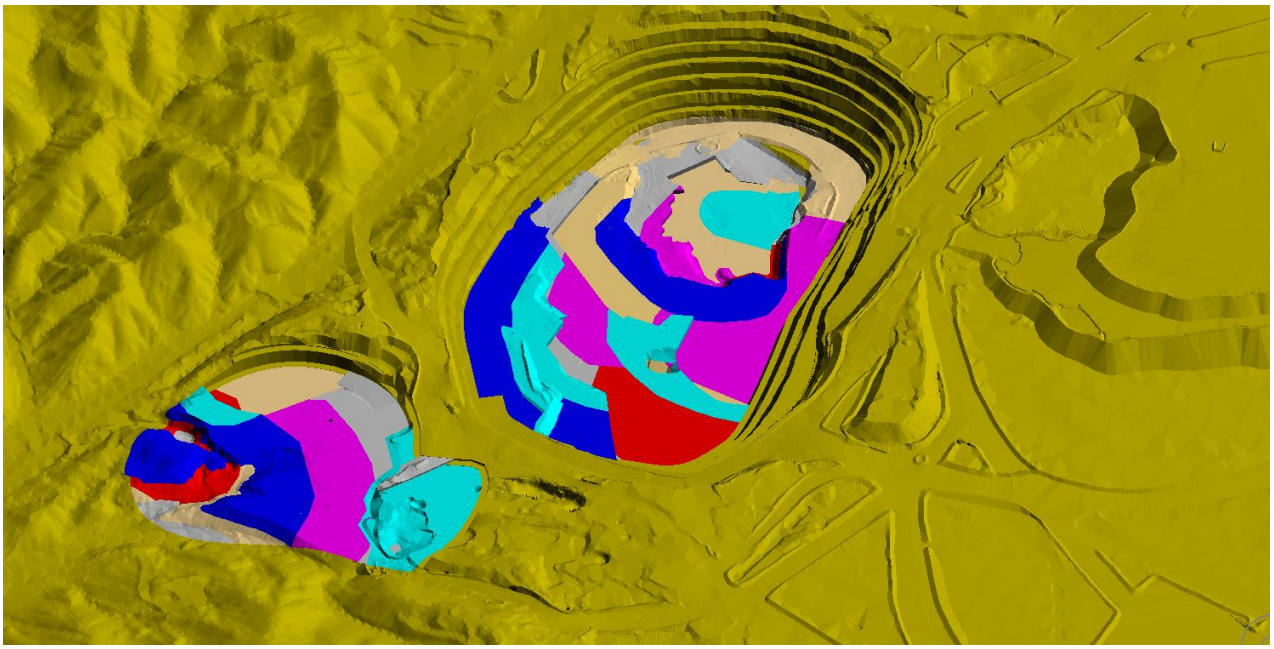


Semana 3

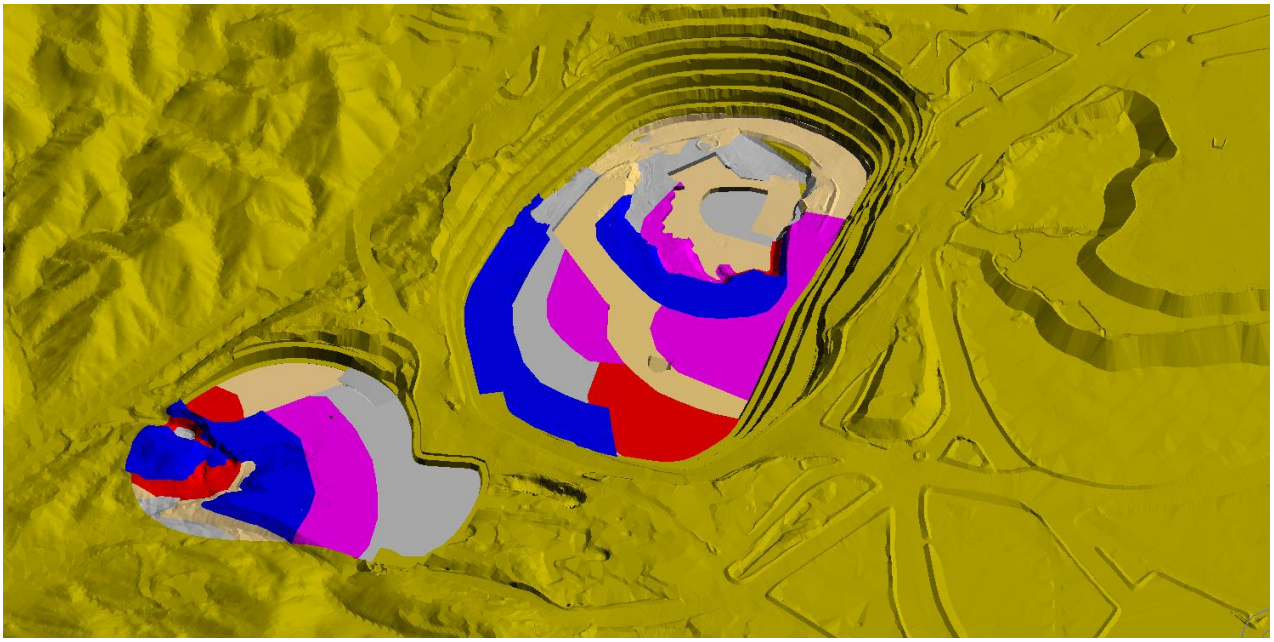


Semana 4

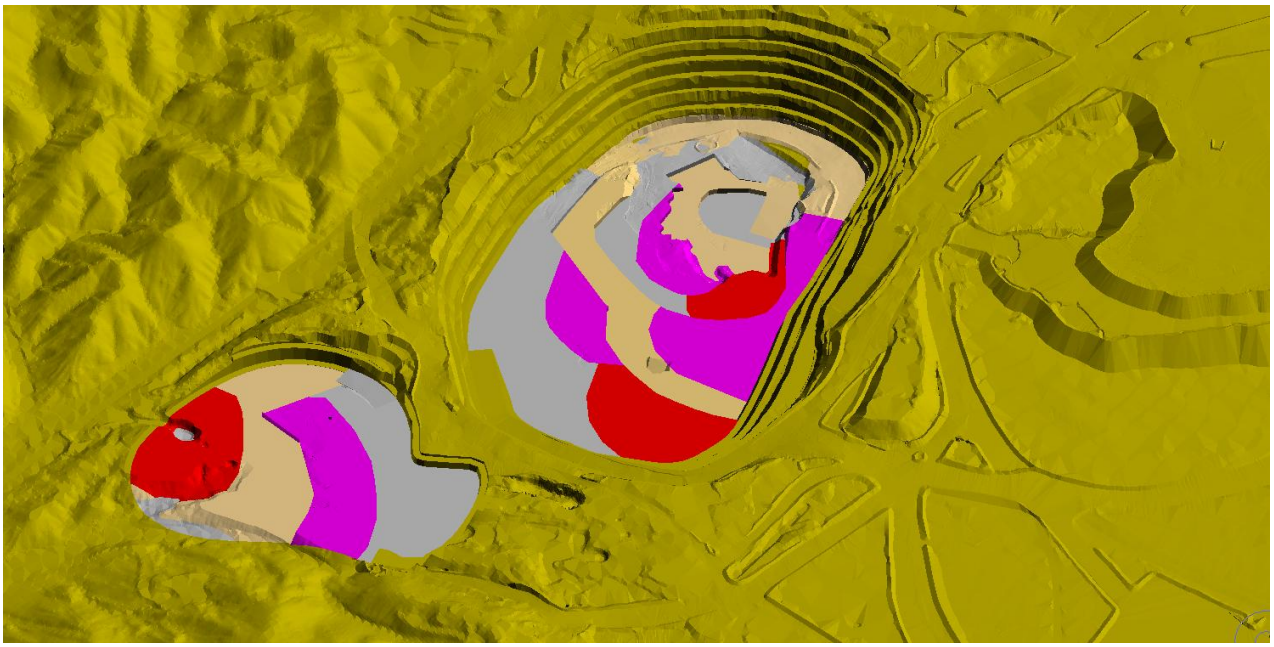

Semana 5

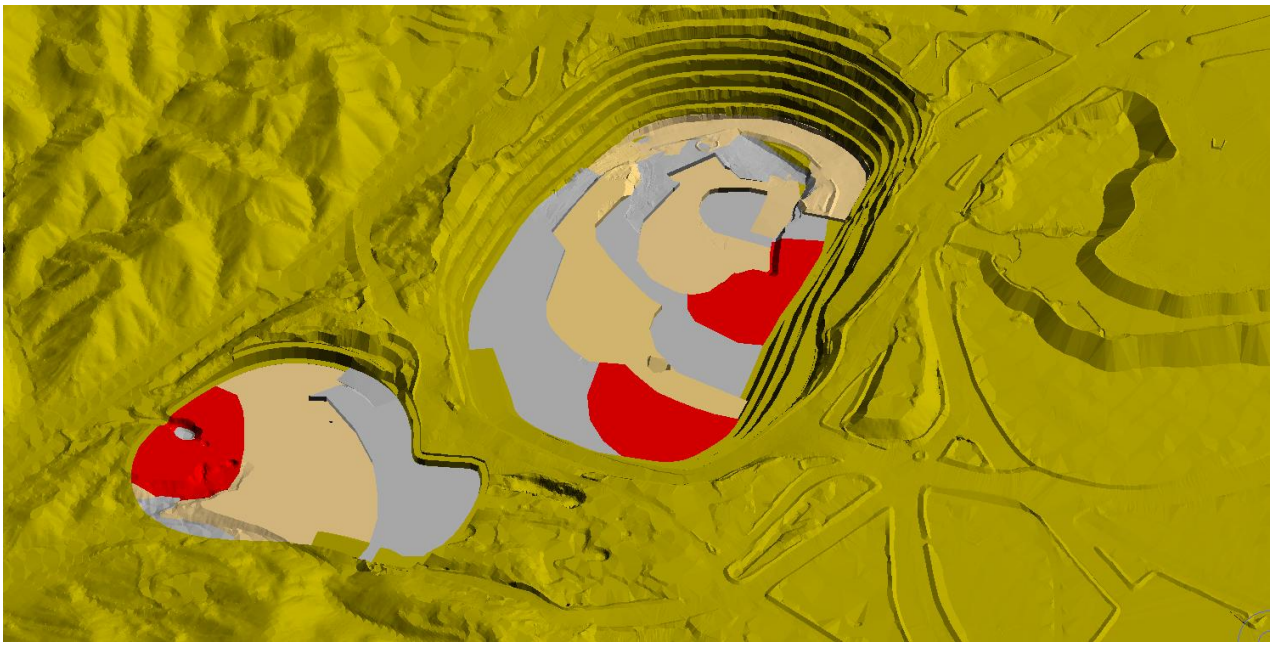


Rutas de transporte (Mineral y Lastre)

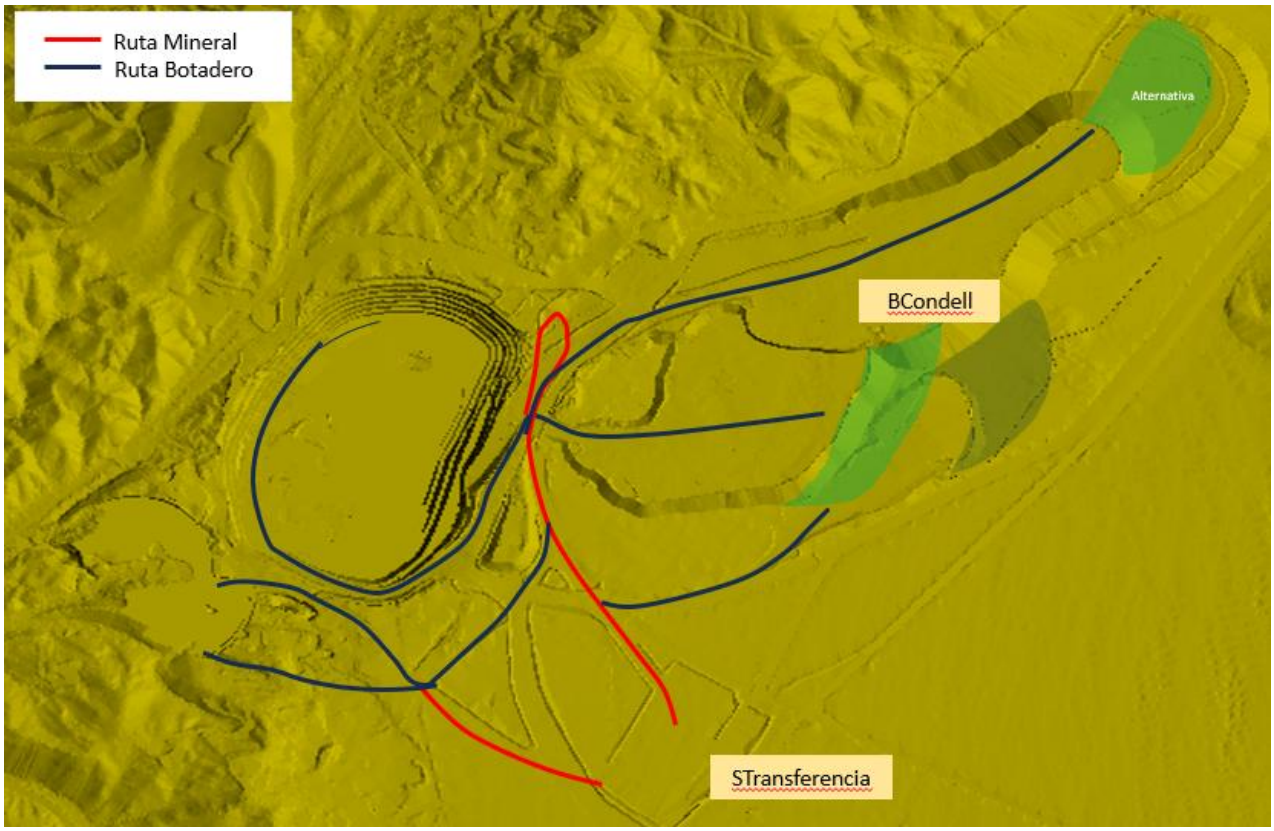

3.- PLAN DE APILAMIENTO Y DESCARGA

El plan contempla solo apilamiento de minerales frescos y descarga de canchas.

Programa de Apilamiento se considera depositar el mineral fresco T4S, T4N, T5N, T5C.

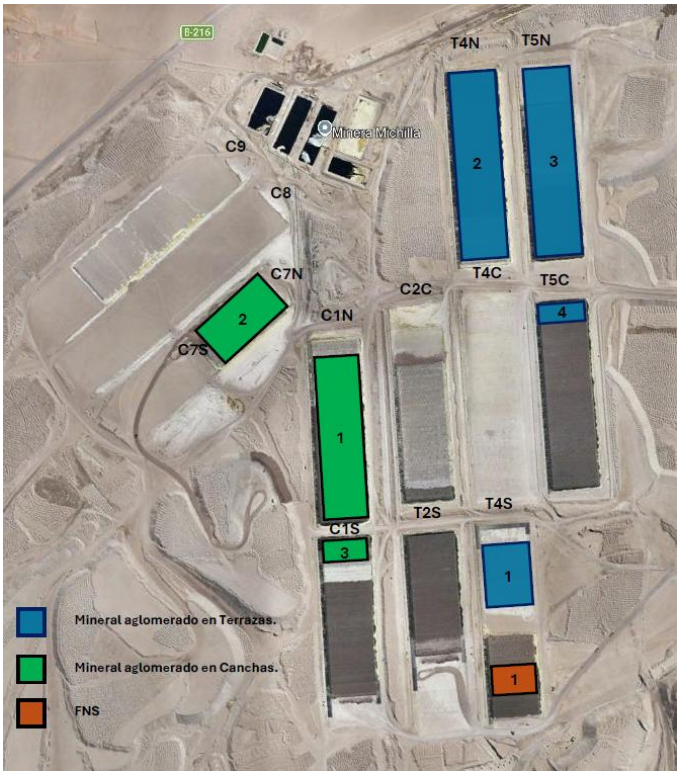

Mineral aglomerado (h = 1,5 m ; t = 40 días)		
Pila	Secuencia	Utilización *TMS*
T4S	1	44.400
T4N	2	101.750
T5N	3	101.750
T5C	4	8.488

Total Terrazas	256.388

Mineral aglomerado (h = 1,5 m ; t = 40 días)		
Pila	Secuencia	Utilización *TMS*
C1N	1	92.500
C7N	2	40.700
C1S	3	9.250

Total Canchas	142.450

Total aglomerado	398.838

Mineral aglomerado (h = 1,5 m ; t = 40 días)		
Pila	Secuencia	Utilización *TMS*
T4S	1	10.000

Total FNS	10.000

Total	408.838

4.- PLAN SORTING

4.a Plan.

Para el plan de Sorting, se procesarán 114 [kt] de mineral. Esto se traduce en planta Sorting; 17.3 [kt] de producto con ley de @0.58 %Cut, las cuales se procesarán en Chancado junto con el grueso (2.3 kt @ 0,35%Cut).

Plan Sorting		Plan mensual Octubre	Plan FCST Octubre
Alim. Tolva	ton	114,765	12,000
	%cut	0.26	0.28
FNS	ton	52,792	56,400
	%cut	0.21	0.25
Grueso	ton	2,295	3,600
	%cut	0.35	0.32
Alim. Sorter	ton	59,678	60,000
	%cut	0.30	0.30
	%Rec. Masa	29%	32%
	Upgrade	1.85	1.90
Producto	ton	17,389	19,200
	%cut	0.56	0.58
Rechazo	ton	42,289	40,800
	%cut	0.20	0.18
FNS a Lix		6,900	33,840

5.- PLAN ALIMENTACION CHANCADO

5.a. Plan de recepción chancado.

Para el plan de recepción chancado se tiene contemplado trabajar turno A y B continuo para alimentar 402 kt húmedas de mineral fresco, proveniente desde los distintos orígenes de alimentación.

	Propio	Compra
Disponibilidad	81.2%	81.2%
Utilización	85.9%	80.8%
Coeficiente marcha	69.7%	65.6%
h utiles día, base	518.8	488.1
Rend. TMH/h, base	568	243

Octubre	Propio	Compra	Total	@ 33 TM/Camion	
10/1/2026	10,327	4,057	14,384	436	
10/2/2026	10,327	4,057	14,384	436	
10/3/2026	10,327	4,057	14,384	436	
10/4/2026	10,327	4,057	14,384	436	
10/5/2026	8,606	4,057	12,663	384	
10/6/2026	5,737	4,057	9,794	297	
10/7/2026	10,327	2,254	12,581	381	
10/8/2026	10,327	4,057	14,384	436	
10/9/2026	10,327	4,057	14,384	436	
10/10/2026	10,327	4,057	14,384	436	
10/11/2026	10,327	4,057	14,384	436	
10/12/2026	8,606	4,057	12,663	384	
10/13/2026	5,737	4,057	9,794	297	
10/14/2026	10,327	2,254	12,581	381	
10/15/2026	10,327	4,057	14,384	436	
10/16/2026	10,327	4,057	14,384	436	
10/17/2026	10,327	4,057	14,384	436	
10/18/2026	10,327	4,057	14,384	436	
10/19/2026	8,606	4,057	12,663	384	
10/20/2026	5,737	4,057	9,794	297	
10/21/2026	10,327	2,254	12,581	381	
10/22/2026	10,327	4,057	14,384	436	
10/23/2026	10,327	4,057	14,384	436	
10/24/2026	10,327	4,057	14,384	436	
10/25/2026	10,327	4,057	14,384	436	
10/26/2026	8,606	4,057	12,663	384	
10/27/2026	5,737	4,057	9,794	297	
10/28/2026	10,327	2,254	12,581	381	
10/29/2026	10,327	4,057	14,384	436	
10/30/2026	10,327	4,057	14,384	436	
10/31/2026	10,327	4,057	14,384	436	
Total	**294,887**	**118,553**	**413,441**	**12,529**	**TONELADAS HUMEDAS**
			405,334		**TONELADAS SECAS**

Para tal efecto se tiene contemplado alimentar por la línea de compra un total de 118 kt y por línea propia 294 [kt] a un rendimiento de 243 tph y 568 tph respectivamente.


Minerales de Terceros se tienen contemplados ingresar en dos tandas; 21,22 y 23, cuyo aporte suma 7.5 [kton] con una ley de 1,18%Cut.

5.b. Plan de Alimentación a Chancado.

El Plan contempla alimentar 405 Kton secas, con una ley de 0,51% CuT.

Origen	Propio			Compra			Total			Total Fcst 2026		
	TMS	%Cut	%Cus	TMS	%Cut	%Cus	TMS	%Cut	%Cus	TMS	%Cut	%Cus
Fase 15 B	278,617	0.49	0.40	0	0.00	0.00	278,617	0.49	0.40	194,471	0.56	0.45
Condell	5,971	0.52	0.45	77,744	0.53	0.45	83,715	0.53	0.45	169,048	0.49	0.39
STOCK F15	4,517	0.46	0.39	11,834	0.46	0.39	16,351	0.46	0.39			
Juárez	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
Producto Sorting	0	0.00	0.00	19,298	0.53	0.43	19,298	0.53	0.43	19,200	0.58	0.46
Pompeya/Urbina	0	0.00	0.00	7,353	1.18	1.05	7,353	1.18	1.05	8,275	1.15	0.92
Total	**289,105**	**0.49**	**0.40**	**116,229**	**0.57**	**0.48**	**405,334**	**0.51**	**0.42**	**390,994**	**0.54**	**0.43**


Un 73% del mineral alimentado a chancado proviene de mina Fase 15 B, un 20% de Condell, un 5% proviene del producto Sorting, 2% proviene de compra de minerales de terceros (Pompeya, Juarez y Urbina).

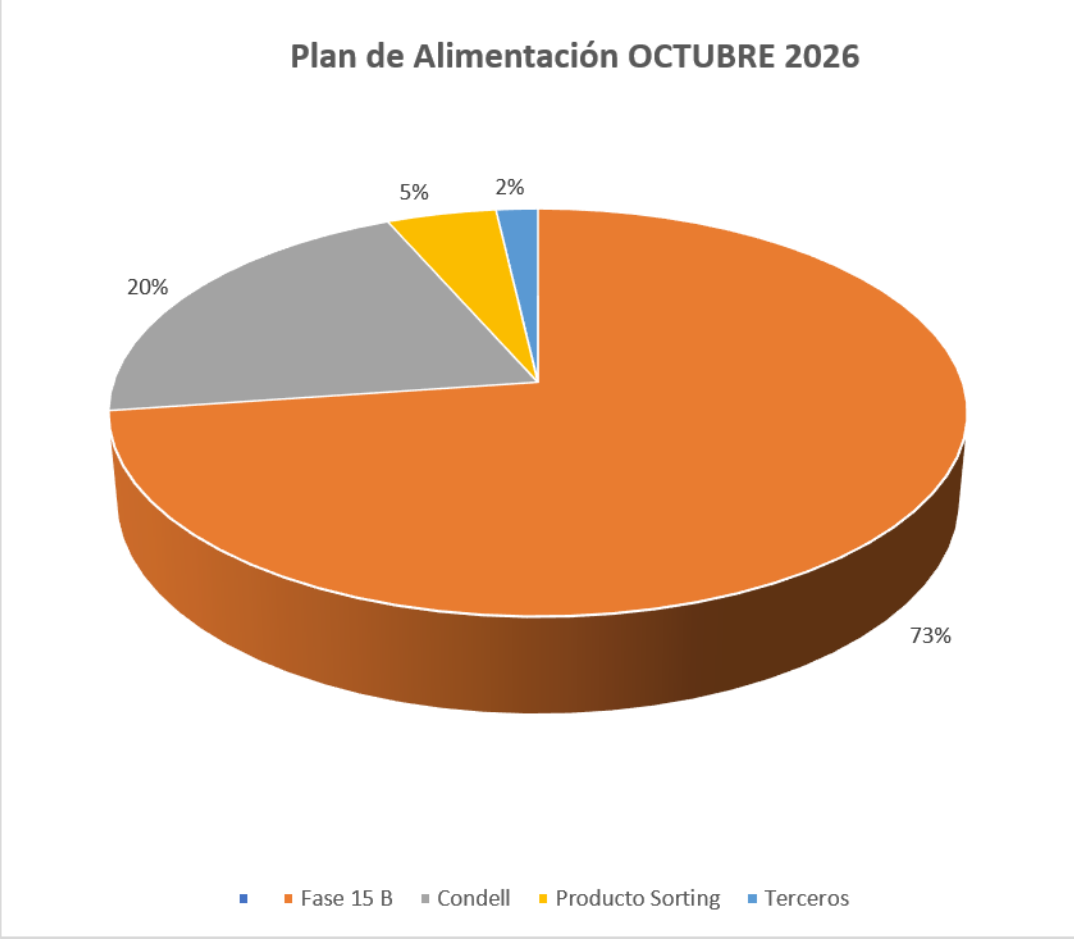

6.- PLAN DE PRODUCCION

Para el caso de la producción de cobre fino, está alineado al plan de Trimestral.

Origen	Ton	%Cut	Fino
Fase 15B	278,617	0.49	909
Condell	83,715	0.53	298
Stock F15E	16,351	0.46	50
Terceros	7,353	1.18	64
Producto S	19,298	0.53	68
FNS	6,900	0.40	11
Total	**412,234**	**0.51**	**1,400**

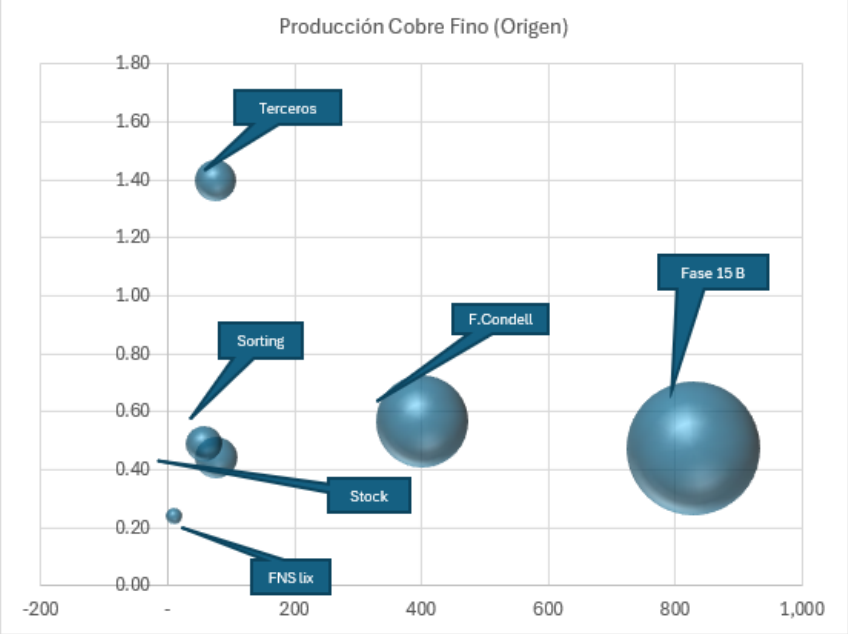

7.- RIESGO Y OPORTUNIDAD

RIESGO

- Dotación incompleta por licencias médicas.
- Presencia de cavidades no reconocidas en el modelo.
- Reducción de ton del Modelo de Bloques.
- Mayor presencia de Camanchaca turnos día, que obligue detención total.
- Baja disponibilidad de equipos de los CAEX 775 y 777
- Baja disponibilidad de los equipos de Vecchiola.
- Baja Dotación de Finning.


OPORTUNIDAD

- Mejoramiento de la ley alimentación planta por Gestión de zonaciones, estrategia ley de corte. (curva tonelaje ley)
- Mejoramientos de tiempo de ciclos por habilitación de rampas no consideradas en el plan.
- Material de relleno en Fase 15B y Falla Condell podría aportar mayor mineral

ANEXOS

Reporte de Categorías Fase 15 B

- 97% de las reservas, están en calidad de Medido + Indicado.
- 3% de las reservas, están en calidad de **Inferido**

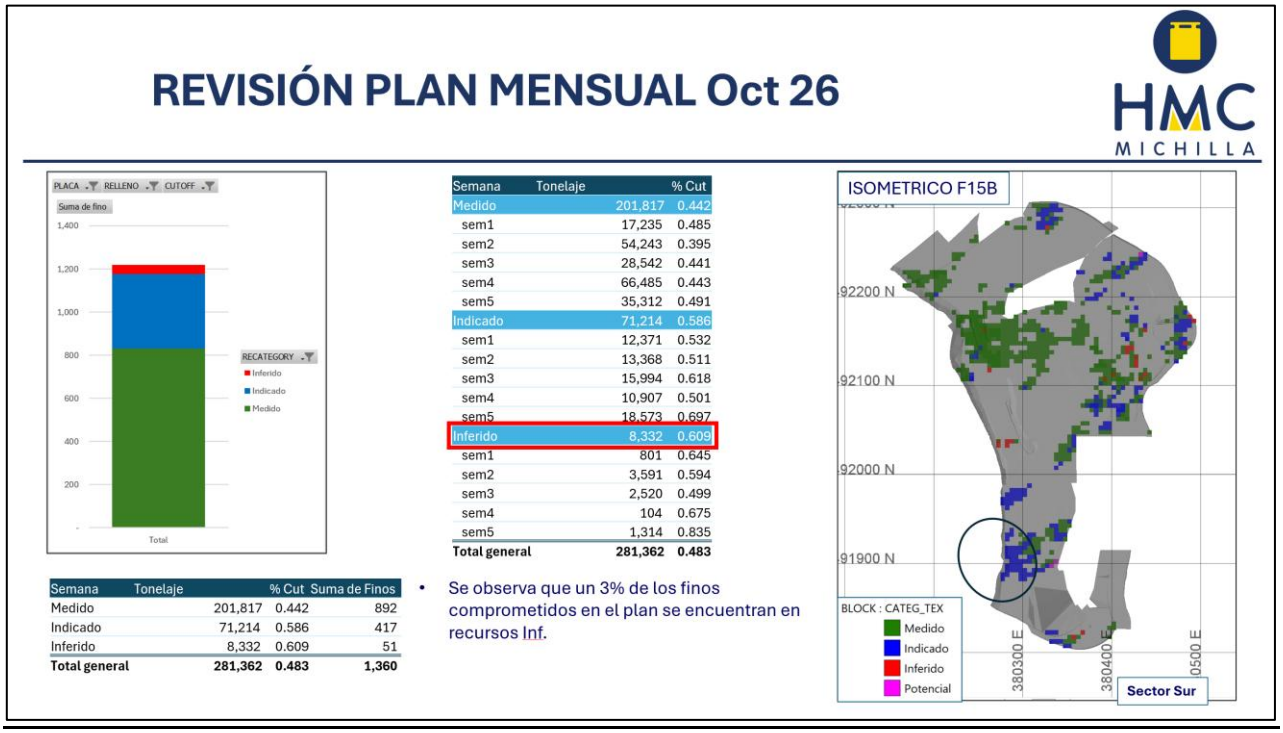

Amenazas:


- Los bloques de mayor incertidumbre geológica corresponden a los ubicados en F02 en el sector sur, principalmente en la semana 4 y 5 del plan.
- La mayor proporción de recursos se rescatan del sector norte.
- Bloques Aislados no considerados en cubicacion.
- Existe alta proporcion de recursos Indicados, que tiene mayor incertidumbre que recursos medidos.
- Bloques potenciales no considerados en el plan

Plan de Acción:

- Para disminuir la incertidumbre de dichas zonas (recursos Inferidos+Potenciales), se continuara con las campañas de perforación de sondajes EP4 enfocandose en las zonas centro-Muelle y sur de Fase 2.

Reporte de Categorías Rajo Falla Condell (Descontando Hundimientos)

- 91% de las reservas, están en categoría Medido + Indicado
- 9% de las reservas, están en categoría **Inferido**

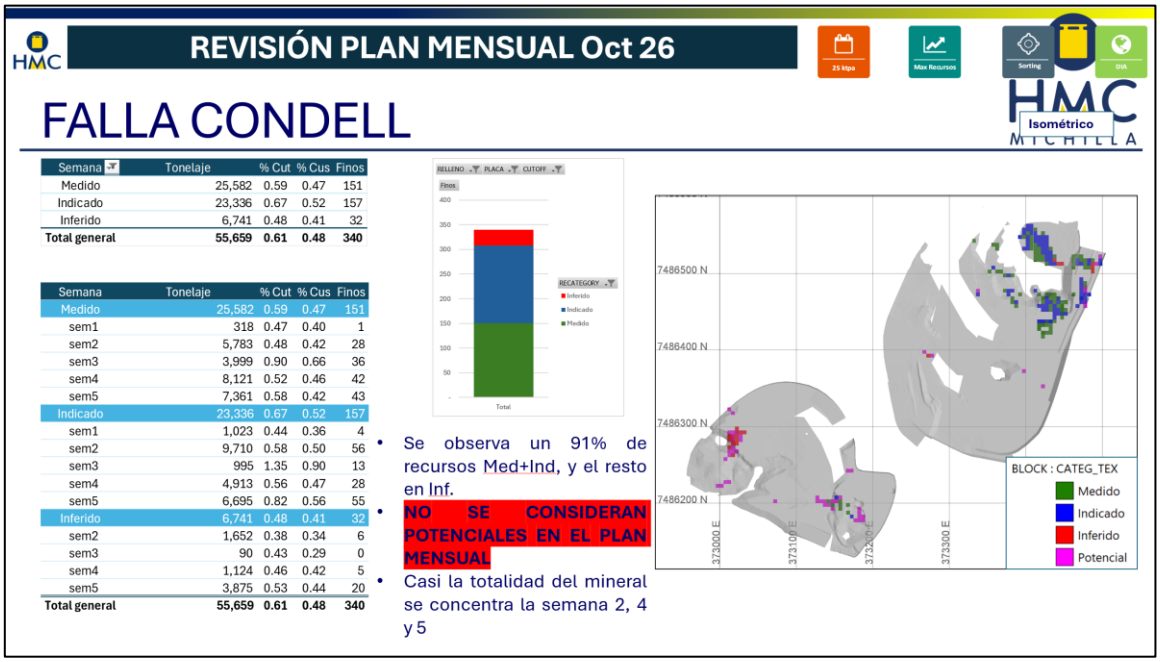

Semana	Tonelaje	% Cut	% Cus	Finos
Medido	25,582	0.59	0.47	151
Indicado	23,336	0.67	0.52	157
Inferido	6,741	0.48	0.41	32
Total general	**55,659**	**0.61**	**0.48**	**340**

Semana	Tonelaje	% Cut	% Cus	Finos
Medido	25,582	0.59	0.47	151
sem1	318	0.47	0.40	1
sem2	5,783	0.48	0.42	28
sem3	3,999	0.90	0.66	36
sem4	8,121	0.52	0.46	42
sem5	7,361	0.58	0.42	43
Indicado	23,336	0.67	0.52	157
sem1	1,023	0.44	0.36	4
sem2	9,710	0.58	0.50	56
sem3	995	1.35	0.90	13
sem4	4,913	0.56	0.47	28
sem5	6,695	0.82	0.56	55
Inferido	6,741	0.48	0.41	32
sem2	1,652	0.38	0.34	6
sem3	90	0.43	0.29	0
sem4	1,124	0.46	0.42	5
sem5	3,875	0.53	0.44	20
Total general	**55,659**	**0.61**	**0.48**	**340**

Amenazas:


- Alta incertidumbre por categoría de recursos considerados en el plan, semana 5 concentra la mayoria de los finos del plan en recursos Inf (banco 840).
- Alta proporción de bloques en sectores de zona de hundimiento.
- Alta proporcion de Inferidos en Fase 3.

Plan de Acción:

- Las zonas de alta incertidumbre y ley deben ser identificadas con muestreo especial en el banco.
- No deben ser considerados en el plan mensual de extracción mina bloques en hundimiento por cavidades ni bloques aislados ni bloques potenciales.
- Campaña de sondajes Ep4 para recategorizar bloques Inf+Pot.

***DIFERENCIAS EN TONELAJE Y LEY SE DEBEN A DIFERENTE METODO DE "FLAG" DE LOS SOLIDOS DE HUNDIMIENTOS Y PLACAS**

Análisis Geotécnico de Cavidades Rajo F15B

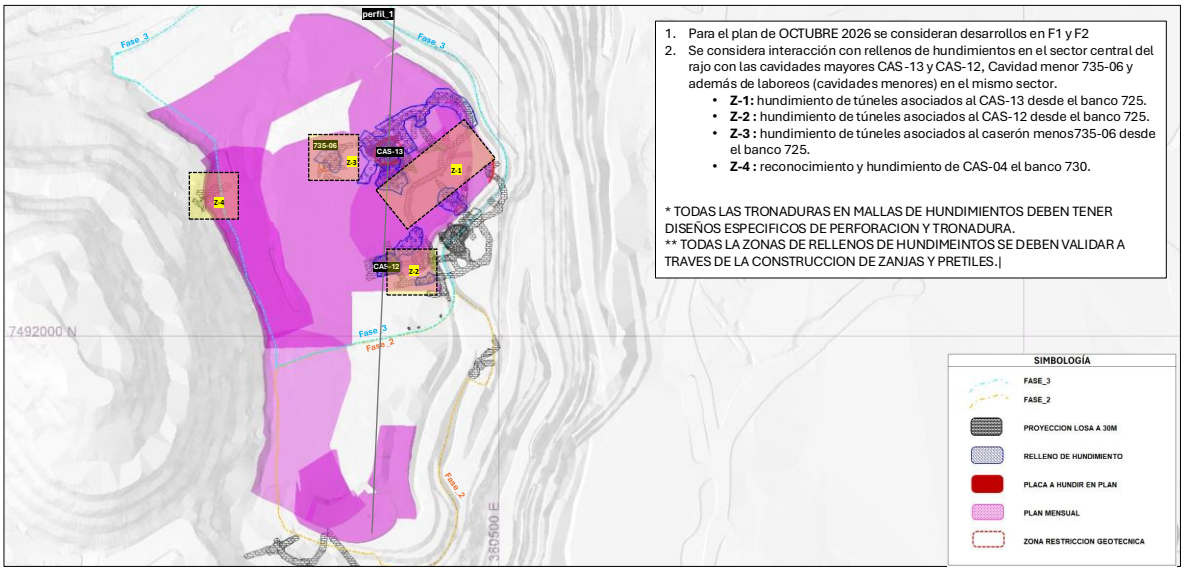


1. Para el plan de OCTUBRE 2026 se consideran desarrollos en F1 y F2
2. Se considera interacción con rellenos de hundimientos en el sector central del rajo con las cavidades mayores CAS-13 y CAS-12, Cavidad menor 735-06 y además de laboreos (cavidades menores) en el mismo sector.
   - **Z-1:** hundimiento de túneles asociados al CAS-13 desde el banco 725.
   - **Z-2 :** hundimiento de túneles asociados al CAS-12 desde el banco 725.
   - **Z-3 :** hundimiento de túneles asociados al caserón menos735-06 desde el banco 725.
   - **Z-4 :** reconocimiento y hundimiento de CAS-04 el banco 730.

* TODAS LAS TRONADURAS EN MALLAS DE HUNDIMIENTOS DEBEN TENER DISEÑOS ESPECIFICOS DE PERFORACION Y TRONADURA.
** TODAS LA ZONAS DE RELLENOS DE HUNDIMEINTOS SE DEBEN VALIDAR A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE ZANJAS Y PRETILES.|

Geotecnia Operativa
SI Geotecnia

Análisis Geotécnico de Cavidades Rajo F15B

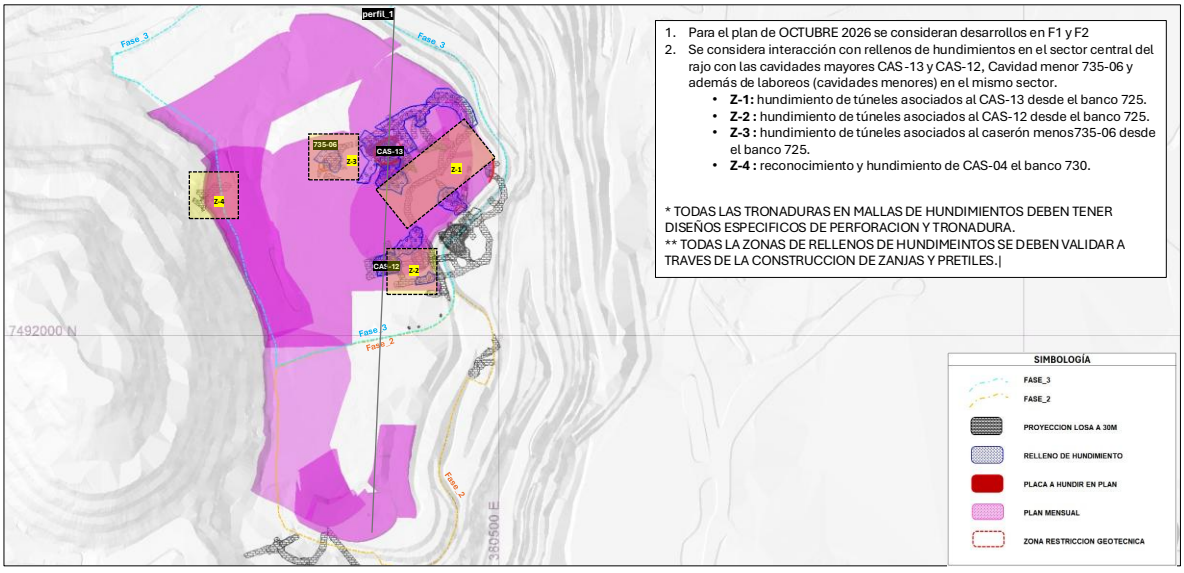


1. Para el plan de OCTUBRE 2026 se consideran desarrollos en F1 y F2
2. Se considera interacción con rellenos de hundimientos en el sector central del rajo con las cavidades mayores CAS-13 y CAS-12, Cavidad menor 735-06 y además de laboreos (cavidades menores) en el mismo sector.
   - **Z-1:** hundimiento de túneles asociados al CAS-13 desde el banco 725.
   - **Z-2 :** hundimiento de túneles asociados al CAS-12 desde el banco 725.
   - **Z-3 :** hundimiento de túneles asociados al caserón menos735-06 desde el banco 725.
   - **Z-4 :** reconocimiento y hundimiento de CAS-04 el banco 730.

* TODAS LAS TRONADURAS EN MALLAS DE HUNDIMIENTOS DEBEN TENER DISEÑOS ESPECIFICOS DE PERFORACION Y TRONADURA.
** TODAS LA ZONAS DE RELLENOS DE HUNDIMEINTOS SE DEBEN VALIDAR A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE ZANJAS Y PRETILES.|

Geotecnia Operativa
SI Geotecnia

Análisis Geotécnico de Cavidades Rajo F15B

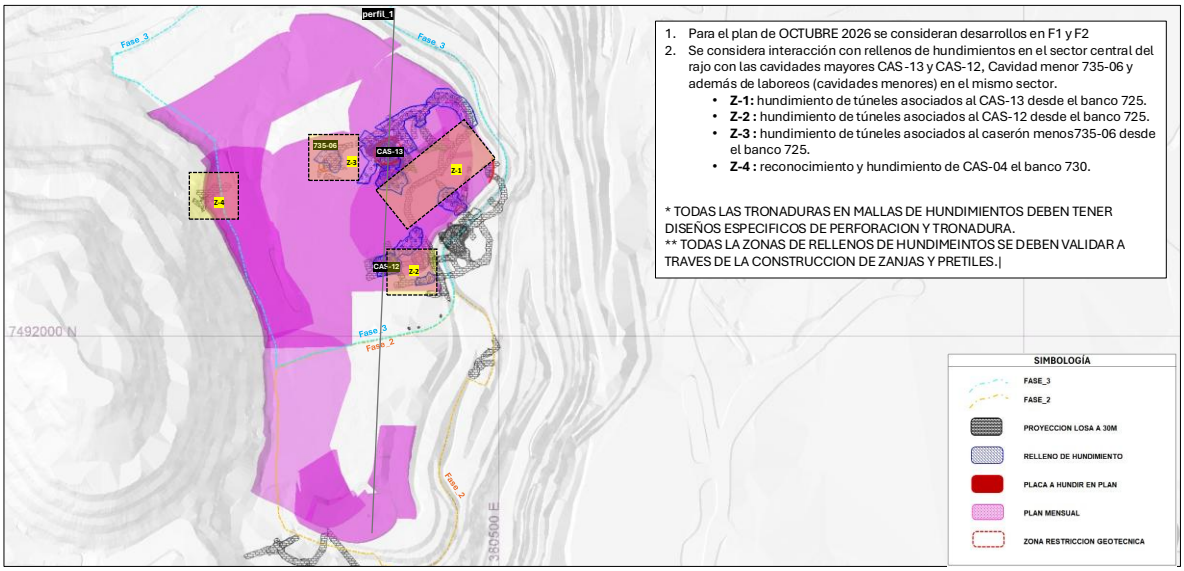


1. Para el plan de OCTUBRE 2026 se consideran desarrollos en F1 y F2
2. Se considera interacción con rellenos de hundimientos en el sector central del rajo con las cavidades mayores CAS-13 y CAS-12, Cavidad menor 735-06 y además de laboreos (cavidades menores) en el mismo sector.
   - **Z-1:** hundimiento de túneles asociados al CAS-13 desde el banco 725.
   - **Z-2 :** hundimiento de túneles asociados al CAS-12 desde el banco 725.
   - **Z-3 :** hundimiento de túneles asociados al caserón menos735-06 desde el banco 725.
   - **Z-4 :** reconocimiento y hundimiento de CAS-04 el banco 730.

* TODAS LAS TRONADURAS EN MALLAS DE HUNDIMIENTOS DEBEN TENER DISEÑOS ESPECIFICOS DE PERFORACION Y TRONADURA.
** TODAS LA ZONAS DE RELLENOS DE HUNDIMEINTOS SE DEBEN VALIDAR A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE ZANJAS Y PRETILES.|

Geotecnia Operativa
SI Geotecnia

Análisis Geotécnico de Cavidades Rajo Falla Condell: perfil_1 F1

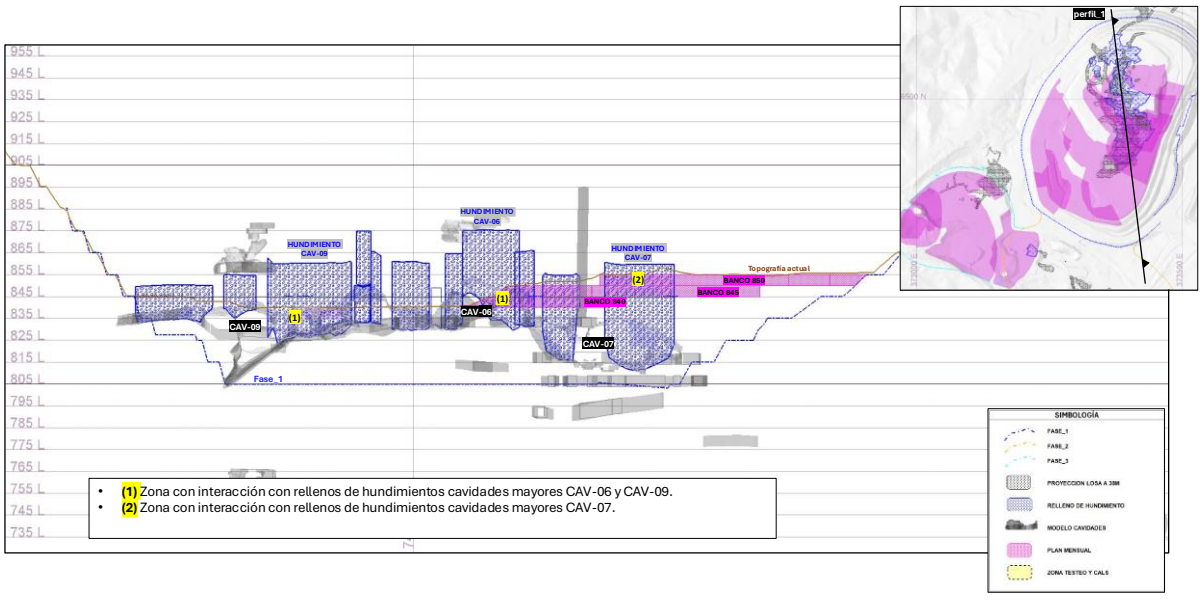

- **(1)** Zona con interacción con rellenos de hundimientos cavidades mayores CAV-06 y CAV-09.
- **(2)** Zona con interacción con rellenos de hundimientos cavidades mayores CAV-07.

Geotecnia Operativa
SI Geotecnia
