







PLAN MENSUAL SEPTIEMBRE 2026

HMC Michilla

SUPERINTENDENCIA DE PLANIFICACION

HMC Michilla

SEPTIEMBRE 2026

Adjunto se encuentra Plan Mensual de Septiembre de 2026 y las bases de construcción para soportar el plan de cobre fino a producir en el mes.

Nombre	Cargo	Firma
Ricardo Vergara	Superintendente Planta	
Carlos Ruiz	Superintendente Mantención Planta	
Victorino Moyano	Superintendente de Geología	
Leopoldo Bustos	Superintendente Mina	
Marco Cornejo	Subgerente Mina	
Patricio Bracamonte	Superintendente de Planificación Mina	
Manuel Rivera	Subgerente de Planificación & Desarrollo	

Recepcionado	Cargo	Firma
Juan Henríquez	Gerente de Operaciones	

Índice

1. Objetivos
2. Consideraciones
3. Fase 15 B
    a. Términos de Referencia
    b. Plan de disponibilidad de equipos
    c. Requerimientos de flota
    d. Plan Minero
    e. Secuencia Plan Minero
4. Condell
    a. Términos de Referencia
    b. Plan Minero
5. Ripios
    a. Términos de Referencia
    b. Requerimientos de equipos mina
    c. Secuencia Plan Minero
6. Sorting
    a. Plan
    b. Secuencia
7. Plan de Alimentación
    a. Plan de recepción chancado
    b. Plan de alimentación Planta
8. Plan de Producción

1.Objetivos

- Operar con seguridad y productividad.
- Cumplir con la meta de mineral alimentado al Chancado del Ppto.
- Cumplir con movimientos mina de cuerdo a Ppto.
- Cumplir con alimentación de mineral a tolva Sorting.

2. Antecedentes y Consideraciones

- Se considera topografía actualizada al 25 de agosto para ambas minas y se proyecta topografía para partir con la secuencia del plan.
- Modelo de Bloques entregados el 18 de agosto.
    - Fase 15 B
- Condell modelo
- Plan de disponibilidad mina y chancado, entregado por las áreas operativas.
- Estrategia de leyes de corte:
    - Fase 15 B:
        - Mineral (Cut >= 0,24%)
        - Marginal (0,20% <= %Cut < 0,24)
        - Lastre (Cut < 0,20%)
    - Condell
        - Mineral (Cut >= 0,25%)
        - Marginal (0,20% <= %Cut < 0,25)
        - Lastre (Cut < 0,20%)

2.1 Resumen Plan Mensual

Para el mes de SEPTIEMBRE se tiene el siguiente movimiento mina:

Mina Fase 15 B - Mov Total			Pmes	Forecast	Dif Pmes-Ppto	Plan Trimestral
Fase 15 B	Mineral	Ton	291,332	313,614	-22,282	321,340
		%Cut	0.48	0.57	-0.09	0.5
	Marginal	Ton	48,941	28,899	20,042	50,187
		%Cut	0.22	0.22	0.00	0.22
	Lastre	Ton	893,059	802,328	90,731	773,314
	Total	Ton	1,233,332	1,144,841	88,491	1,144,841

El plan mensual muestra una menor cantidad de ley, debido al retraso generado por los eventos climáticos de agosto y baja disponibilidad de equipos de transporte que impiden llegar rápidamente a las mejores leyes debajo de las cavidades 13 y nueva.

Mina Condell			Pmes	Forecast	Dif Pmes-Ppto	Plan Trimestral
Condell	Mineral	Ton	40,759	123,232.00	-82,473	116,278
		%Cut	0.66	0.58	0.08	0.57
	Marginal	Ton	7,267	16,229.00	-8,962	8,591
		%Cut	0.23	0.23	0.00	0.23
	Lastre	Ton	1,261,150	1,070,960.00	190,190	984,965
	Total	Ton	1,309,176	1,210,421	98,755	1,109,834

El plan mensual de Condell presenta un retraso principalmente en la F03, donde la falta de equipos para la puesta en marcha genera un desfase para la extracción de los minerales.

Chancado			Pmes	Forecast	Dif Pmes-Ppto	Plan Trimestral
	L Propia	Ton H	287,011	245,824	41,187	251275
	L Compra	Ton H	115,652	127,008	-11,356	129385
	Total	Ton	402,663	372,832	29,831	380,660

Para el caso de la planta de chancado se programa 402 kton húmedas, mejorando levemente el Forecast.

Sorting		Pmes	Forecast	Dif Pmes-Ppto	Plan Trimestral
Alimentación tolv	Ton	153,051	113,000	40,051	163000
FNS	Ton	71,934	71,910	24	76610
Grueso	Ton	3,061	4,590	-1,529	4890
Producto	Ton	22,744	24,480	-1,736	25265
Rechazo	Ton	55,312	52,020	3,292	56235
FNS a LIX	Ton	43,160	43,146	14	42000
	%Cut	0.24	0.27	-0.03	0.24

Por estrategia, Sorting solo opera durante el turno A

Cu Fino		Pmes	Forecast	Dif Pmes-Ppto	Plan Trimestral
Cu Fino	Ton	**1,501**	1,656	-155	1539

Para el caso de la producción de cobre fino, está bajo en 429 ton con respecto al Forecast por desfase provocado por la falta de equipos y las detenciones climáticas, impidiendo llegar a las zonas comprometidas.

3.- Plan Minero Fase 15 B

3.a. Términos de Referencia

Los términos de referencia del Plan Minero son los entregables de las distintas áreas con las que se construye el Plan y que para el caso del Plan Mensual de SEPTIEMBRE 2026 son:

- Modelo de bloques actualizado entregado por geología, Modelo Trimestral sep-oct-nov 2026. (TRI_F15B_SEP-OCT-NOV26.bmf)
- Plan de Disponibilidad de Equipos Mina SEPTIEMBRE 2026.

3.b. Plan de Disponibilidad de Equipos

Entre las mantenciones de SEPTIEMBRE se destacan las siguientes:

Cargadores Frontales

L06: A partir del 2 al 7 cambio de mandos finales

Plan	1-Sep	2-Sep	3-Sep	4-Sep	5-Sep	6-Sep	7-Sep	8-Sep	9-Sep	10-Sep	11-Sep	12-Sep	13-Sep	14-Sep	15-Sep	16-Sep	17-Sep	18-Sep	19-Sep	20-Sep	21-Sep	22-Sep	23-Sep	24-Sep	25-Sep	26-Sep	27-Sep	28-Sep	29-Sep	30-Sep
Cargador	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
L03	0.95	0.95	0.93	0.95	0.95	0.95	0.80	0.95	0.95	0.93	0.95	0.47	0.95	0.95	0.95	0.95	0.93	0.95	0.95	0.80	0.95	0.95	0.95	0.93	0.95	0.95	0.00	0.95	0.95	0.93
L04	0.95	0.95	0.95	0.93	0.95	0.95	0.95	0.80	0.95	0.93	0.95	0.95	0.95	0.25	0.95	0.95	0.93	0.95	0.80	0.95	0.95	0.95	0.93	0.95	0.95	0.80	0.95	0.95	0.95	0.95
L05	0.47	0.93	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.47	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.93	0.95	0.95	0.95	0.93	0.95	0.25	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
L06	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.93	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.47	0.95	0.95	0.95	0.95	0.84	0.95	0.93	0.95	0.95	0.93	0.95	0.95	0.00	0.94
Total	**0.83**	**0.70**	**0.70**	**0.70**	**0.71**	**0.71**	**0.67**	**0.91**	**0.95**	**0.81**	**0.95**	**0.83**	**0.95**	**0.77**	**0.95**	**0.83**	**0.93**	**0.95**	**0.91**	**0.91**	**0.91**	**0.95**	**0.76**	**0.94**	**0.95**	**0.90**	**0.71**	**0.95**	**0.71**	**0.94**

CAEX 775 y 777

T17: A partir del 8 hasta fin de mes, reparación en taller externo por cambio de componentes mayores.
T18: A partir del 11 hasta el 17, cambio de cilindro de dirección + cilindro de levante + suspensiones traseras y delanteras.
T19: A partir del 1 al 10 cambio de leva.
T20: A partir 22 hasta fin de mes, cambio de cilindro de dirección + cilindro de levante + suspensiones traseras y delanteras.

	1-Sep	2-Sep	3-Sep	4-Sep	5-Sep	6-Sep	7-Sep	8-Sep	9-Sep	10-Sep	11-Sep	12-Sep	13-Sep	14-Sep	15-Sep	16-Sep	17-Sep	18-Sep	19-Sep	20-Sep	21-Sep	22-Sep	23-Sep	24-Sep	25-Sep	26-Sep	27-Sep	28-Sep	29-Sep	30-Sep
Cat 775	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
T-11	0.92	0.92	0.83	0.92	0.94	0.92	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.94	0.92	0.92	0.92	0.92	0.83	0.92	0.94	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.92	0.92	0.46	0.92	0.92
T-12	0.92	0.83	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.46	0.92	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.83	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.92	0.94	0.92	0.92
T-13	0.83	0.92	0.92	0.92	0.92	0.46	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.83	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.92	0.00	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.92
T-15	0.92	0.46	0.92	0.92	0.94	0.92	0.83	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.83	0.92	0.92	0.92	0.00	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.92	0.83	0.92
T-16	0.83	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.92	0.46	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.83	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.00	0.92	0.92	0.94
T-17	0.92	0.83	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T-18	0.92	0.92	0.94	0.92	0.46	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00	0.92	0.92	0.83	0.92	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92
T-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.25	0.92	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.92	0.83	0.92	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.92
T-20	0.92	0.92	0.46	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.83	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T-21	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.00	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.83	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.92	0.46	0.92	0.92	0.92	0.92	0.94
T-23	0.83	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.46	0.94	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.83	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.83	0.92	0.92	0.92	0.25	0.94	0.92	0.92	0.92
T-24	0.92	0.46	0.92	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.83	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.83	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.25	0.94	0.92
Total	**0.82**	**0.75**	**0.80**	**0.84**	**0.81**	**0.81**	**0.76**	**0.65**	**0.77**	**0.68**	**0.69**	**0.77**	**0.71**	**0.76**	**0.76**	**0.73**	**0.68**	**0.84**	**0.84**	**0.77**	**0.76**	**0.75**	**0.77**	**0.68**	**0.65**	**0.63**	**0.69**	**0.67**	**0.76**	**0.77**

	1-Sep	2-Sep	3-Sep	4-Sep	5-Sep	6-Sep	7-Sep	8-Sep	9-Sep	10-Sep	11-Sep	12-Sep	13-Sep	14-Sep	15-Sep	16-Sep	17-Sep	18-Sep	19-Sep	20-Sep	21-Sep	22-Sep	23-Sep	24-Sep	25-Sep	26-Sep	27-Sep	28-Sep	29-Sep	30-Sep
Cat 777	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
T-83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.92	0.46	0.92	0.46	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.94	0.83	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.92
T-86	0.92	0.92	0.92	0.46	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.00	0.92	0.92	0.92	0.92	0.94	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.83	0.92	0.92	0.92	0.92
Total	**0.46**	**0.46**	**0.46**	**0.23**	**0.46**	**0.46**	**0.47**	**0.46**	**0.46**	**0.46**	**0.46**	**0.92**	**0.93**	**0.92**	**0.23**	**0.92**	**0.69**	**0.92**	**0.92**	**0.92**	**0.93**	**0.92**	**0.93**	**0.88**	**0.92**	**0.88**	**0.93**	**0.92**	**0.92**	**0.92**

PERFORADORAS

D05: Deslizamiento pasador de BOOM

Perforadoras	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D02	0.92	0.79	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.00	0.46	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.79	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.46	0.92	0.92
D05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D06	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.46	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.79	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.00	0.46
D07	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.46	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.79	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.46	0.92	0.92	0.92
Total	**0.69**	**0.66**	**0.69**	**0.69**	**0.69**	**0.57**	**0.69**	**0.57**	**0.69**	**0.69**	**0.46**	**0.57**	**0.69**	**0.69**	**0.69**	**0.66**	**0.69**	**0.69**	**0.66**	**0.69**	**0.66**	**0.69**	**0.69**	**0.46**	**0.46**	**0.46**	**0.57**	**0.57**	**0.46**	**0.57**

3.c Calculo de Requerimiento de Equipos

El calculo de equipo respecto a rendimiento y cantidad de flota, será de la siguiente forma:

Cargadores frontales

CARGADOR CAT 992 L06	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	TOTAL
TOTAL MATERIAL (kton)	14	102	112	121	33	381
WASTE (kton)	9	73	84	90	13	270
ROM (kton)	0	5	8	4	2	19
HEAP (kton)	5	24	20	26	18	93
DISPONIBILIDAD FISICA	16%	80%	88%	93%	63%	70%
HRS NOMINALES	144	168	168	168	72	720
HRS DISPONIBLES	23	135	147	156	45	506
RENDIMIENTO OPERATIVO Ton / hr	711	868	885	898	854	874
RENDIMIENTO EFECTIVO Ton / hr	903	906	920	933	903	918
UTBD	67.7%	83.4%	82.7%	82.9%	81.3%	82.1%
NRO EQUIPOS OPERATIVOS	0.1	0.7	0.8	0.8	0.5	0.7
NRO EQUIPOS NOMINALES	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

CARGADOR CAT 992 L05	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	TOTAL
TOTAL MATERIAL (kton)	99	124	127	119	54	524
WASTE (kton)	96	84	56	75	47	358
ROM (kton)	1	4	13	8	1	27
HEAP (kton)	3	36	59	36	6	139
DISPONIBILIDAD FISICA	87%	88%	94%	85%	94%	89%
HRS NOMINALES	144	168	168	168	72	720
HRS DISPONIBLES	125	147	158	142	68	640
RENDIMIENTO OPERATIVO Ton / hr	925	958	936	954	914	941
RENDIMIENTO EFECTIVO Ton / hr	963	996	971	992	948	978
UTBD	82.6%	84.7%	82.9%	84.5%	84.2%	83.8%
NRO EQUIPOS OPERATIVOS	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8
NRO EQUIPOS NOMINALES	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

CARGADOR WA 600 L04	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	TOTAL
TOTAL MATERIAL (kton)	55					55
WASTE (kton)	37					37
ROM (kton)	3					3
HEAP (kton)	15					15
DISPONIBILIDAD FISICA	94%					94%
HRS NOMINALES	144					144
HRS DISPONIBLES	136					136
RENDIMIENTO OPERATIVO Ton / hr	506					506
RENDIMIENTO EFECTIVO Ton / hr	526					526
UTBD	76.9%					76.9%
NRO EQUIPOS OPERATIVOS	0.8					0.8
NRO EQUIPOS NOMINALES	1.0					1.0

HMC

25 ktpa | Max Recursos | Sorting | DIA

CARGADOR WA 600 L03	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	TOTAL
TOTAL MATERIAL (kton)	53	64	65	59	32	273
WASTE (kton)	39	56	53	55	19	222
ROM (kton)	2	2	2	1	1	8
HEAP (kton)	13	6	10	3	11	43
DISPONIBILIDAD FISICA	94%	85%	92%	81%	94%	89%
HRS NOMINALES	144	168	168	168	72	720
HRS DISPONIBLES	136	143	155	136	68	638
RENDIMIENTO OPERATIVO Ton / hr	471	526	503	526	553	512
RENDIMIENTO EFECTIVO Ton / hr	489	548	523	550	575	533
UTBD	79.9%	81.6%	79.8%	79.4%	80.9%	80.3%
NRO EQUIPOS OPERATIVOS	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7
NRO EQUIPOS NOMINALES	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

TOTAL CARGUIO	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	TOTAL
REMANEJO	12	14	14	14	6	60
TOTAL MATERIAL (kton)	222	290	304	299	119	1,233
TOTAL MATERIAL (kton) + REMANEJO	234	304	318	313	125	1,293
WASTE (kton)	181	213	193	220	80	887
ROM (kton)	6	11	23	14	4	57
HEAP (kton)	35	66	89	65	35	289
DISPONIBILIDAD FISICA	73%	84%	91%	86%	84%	83%
HRS NOMINALES	576	504	504	504	216	2,304
HRS DISPONIBLES	420	425	460	434	181	1,920
RENDIMIENTO OPERATIVO Ton / hr	635	787	777	804	766	754
RENDIMIENTO EFECTIVO Ton / hr	667	820	807	837	799	786
UTBD	83.5%	87.3%	85.6%	86.2%	86.4%	85.6%
NRO EQUIPOS OPERATIVOS	2.4	2.2	2.3	2.2	2.2	2.3
NRO EQUIPOS NOMINALES	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2

CAEX 775 y 777

CAMIONES 755	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	TOTAL
TOTAL MATERIAL (kton)	204	260	264	253	99	1,080
WASTE (kton)	164	183	153	174	60	733
ROM (kton)	6	11	23	14	4	57
HEAP (kton)	35	66	89	65	35	289
DISPONIBILIDAD FISICA	80.4%	71.8%	77.0%	70.5%	73.3%	74.6%
HRS NOMINALES	1,728	2,016	2,016	2,016	864	8,640
HRS DISPONIBLES	1,389	1,447	1,552	1,421	634	6,443
RENDIMIENTO OPERATIVO Ton / hr	189	198	192	197	190	194
RENDIMIENTO EFECTIVO Ton / hr	198	208	201	206	199	203
UTBD	74.4%	86.5%	84.7%	86.3%	78.3%	83%
NRO EQUIPOS OPERATIVOS	7.5	7.8	8.2	7.6	7.2	7.7
NRO EQUIPOS NOMINALES	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

CAMIONES 777	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	TOTAL
TOTAL MATERIAL (kton)	17	30	40	46	20	153
WASTE (kton)	17	30	40	46	20	153
ROM (kton)						
HEAP (kton)						
DISPONIBILIDAD FISICA	42.0%	59.2%	78.6%	90.9%	91.7%	70.9%
HRS NOMINALES	288	336	336	336	144	1,440
HRS DISPONIBLES	121	199	264	306	132	1,022
RENDIMIENTO OPERATIVO Ton / hr	169	171	171	171	172	171
RENDIMIENTO EFECTIVO Ton / hr	184	181	178	177	178	179
UTBD	78.3%	83.5%	84.9%	84.9%	85.1%	83.9%
NRO EQUIPOS OPERATIVOS	0.7	1.0	1.4	1.6	1.6	1.2
NRO EQUIPOS NOMINALES	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0









TOTAL TRANSPORTE	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	TOTAL
REMANEJO	12	14	14	14	6	60
TOTAL MATERIAL (kton)	222	290	304	299	119	1,233
TOTAL MATERIAL (kton) + REMANEJO	234	304	318	313	125	1,293
WASTE (kton)	181	213	193	220	80	887
ROM (kton)	6	11	23	14	4	57
HEAP (kton)	35	66	89	65	35	289
DISPONIBILIDAD FISICA	74.9%	70.0%	77.2%	73.4%	75.9%	74.0%
HRS NOMINALES	2,016	2,352	2,352	2,352	1,008	10,080
HRS DISPONIBLES	1,510	1,646	1,816	1,727	766	7,464
RENDIMIENTO OPERATIVO Ton / hr	187	195	189	192	187	191
RENDIMIENTO EFECTIVO Ton / hr	197	204	197	201	196	200
UTBD	78.8%	90.4%	88.7%	90.0%	83.5%	87%
NRO EQUIPOS OPERATIVOS	8.2	8.8	9.6	9.2	8.9	9.0
NRO EQUIPOS NOMINALES	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0

Perforación: Se necesita perforar 18 mil metros durante el mes de SEPTIEMBRE, y tenemos una capacidad de 16,8 mil metros.


PERFORACION	FECHA	1-Sep	2-Sep	3-Sep	4-Sep	5-Sep	6-Sep	7-Sep	8-Sep	9-Sep	10-Sep	11-Sep	12-Sep	13-Sep	14-Sep	15-Sep	16-Sep	17-Sep	18-Sep	19-Sep	20-Sep
	D02																				
	DF	92%	79%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	0%	46%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	79%	92%
	USO	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
	REND	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	METROS	264	228	264	264	264	264	264	264	264	264	0	132	264	264	264	264	264	264	228	264
	D06																				
	DF	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	46%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	USO	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
	REND	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	METROS	264	264	264	264	264	264	264	132	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264
	D07																				
	DF	92%	92%	92%	92%	92%	46%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	79%	92%	92%	92%	92%
	USO	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
	REND	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	METROS	264	264	264	264	264	132	264	264	264	264	264	264	264	264	264	228	264	264	264	264

PERFORACION	FECHA	21-Sep	22-Sep	23-Sep	24-Sep	25-Sep	26-Sep	27-Sep	28-Sep	29-Sep	30-Sep	
	D02											
	DF	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	46%	92%	92%	
	USO	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
	REND	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	METROS	264	264	264	264	264	264	264	132	264	264	
	D06											
	DF	79%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	0%	46%	
	USO	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
	REND	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	METROS	228	264	264	264	264	264	264	264	0	132	
	D07											
	DF	92%	92%	92%	0%	0%	0%	46%	92%	92%	92%	
	USO	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
	REND	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	METROS	264	264	264	0	0	0	132	264	264	264	
CAPACIDAD METROS PERFORADOS	METROS	756	792	792	528	528	528	660	660	528	660	**21,504**
METROS PERFORADOS PLAN	METROS	720	761	521	739	720	696	697	738	446	758	**20,115**


3.d Plan Minero Propio


El Plan de Fase 15 B estima extraer 290 kt de mineral de una ley 0,48 CuT con un movimiento total de 1.233 kt. (El plan corta de lunes a Domingo para efectos de cuadrarse con el plan semanal)


Sep-26	Marginal (0.2<=Cut%<0.24)			Baja ley 1 (0.24<=Cut%<0.29)			Baja ley 2 (0.29<=Cut%<0.70)			Alta ley (0.70<=Cut%)			Mineral Alimentable			Lastre	Total
	t	Cut%	Cus%	t	Cut%	Cus%	t	Cut%	Cus%	t	Cut%	Cus%	Ton	%Cut	%Cus	t	t
SEM1	6,837	0.22	0.15	9,706	0.26	0.19	27,384	0.45	0.37	2,139	1.06	0.92	39,229	0.44	0.35	175,653	221,720
SEM2	10,975	0.22	0.17	9,444	0.26	0.21	47,519	0.45	0.38	12,884	0.93	0.81	69,847	0.52	0.43	209,024	289,845
SEM3	15,344	0.22	0.16	16,405	0.26	0.20	58,525	0.43	0.34	11,839	0.95	0.81	86,769	0.47	0.38	201,652	303,765
SEM4	11,651	0.22	0.17	16,539	0.26	0.20	46,502	0.45	0.35	7,886	0.90	0.75	70,926	0.45	0.36	216,491	299,068
SEM5	4,134	0.22	0.16	6,914	0.27	0.21	12,248	0.41	0.33	5,399	1.14	1.00	24,561	0.53	0.45	90,239	118,935
Total	**48,941**	**0.22**	**0.17**	**59,008**	**0.26**	**0.20**	**192,177**	**0.44**	**0.36**	**40,147**	**0.96**	**0.83**	**291,332**	**0.48**	**0.39**	**893,059**	**1,233,332**

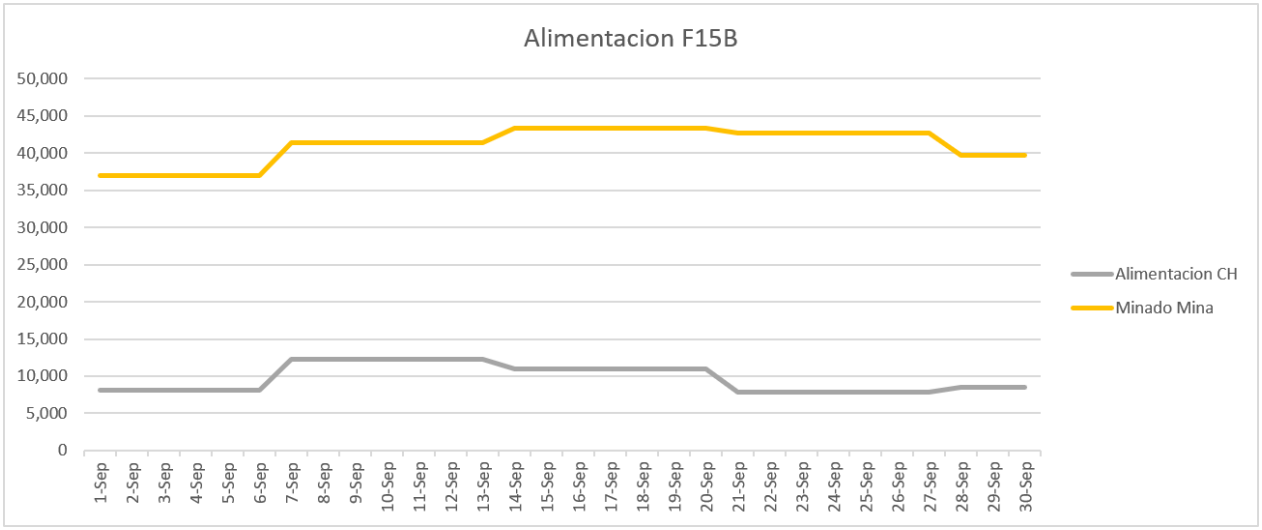

1.e Secuencia Plan Minero Propio

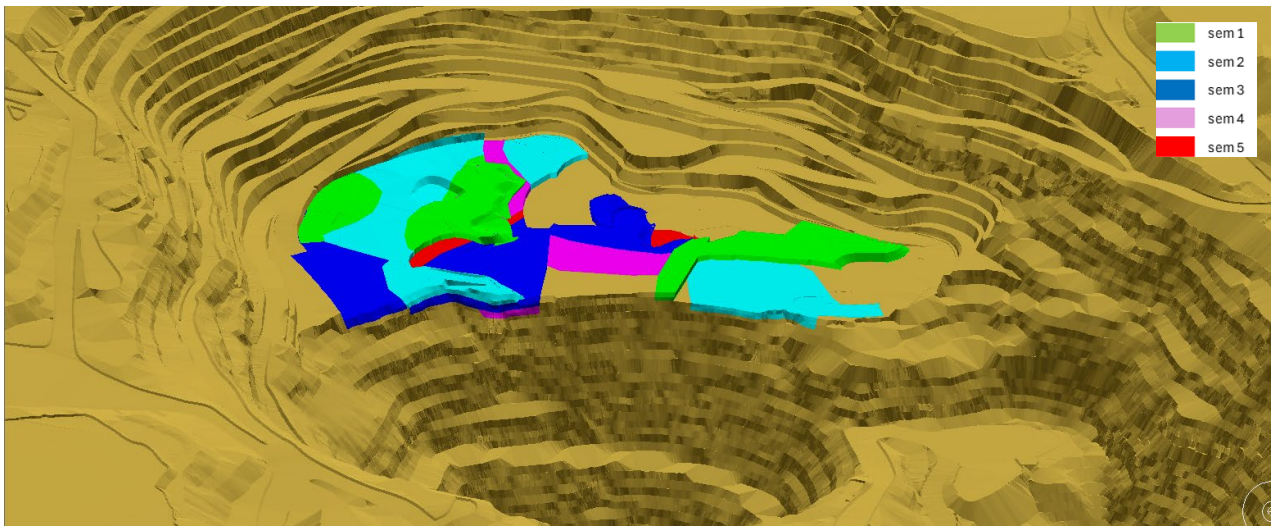


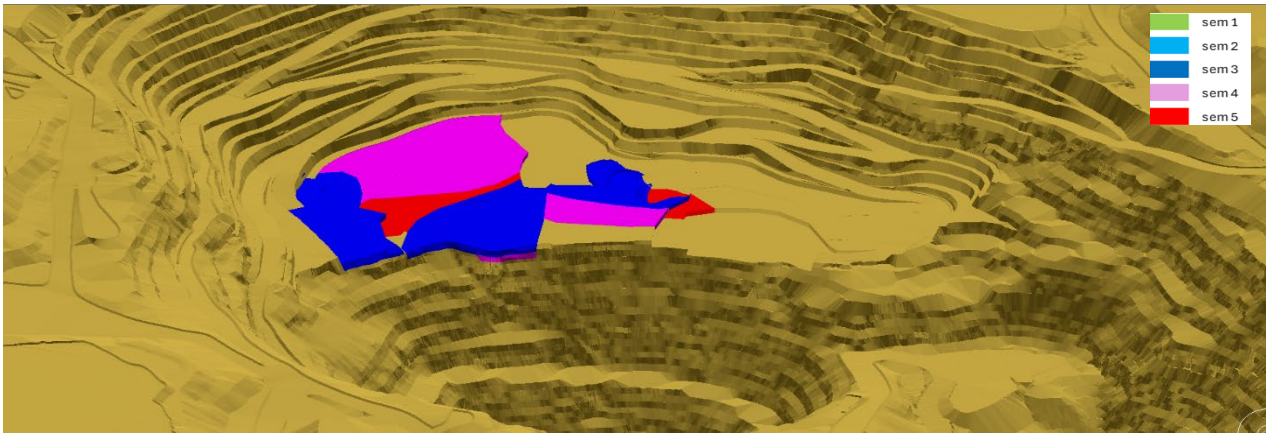
sem 1
sem 2
sem 3
sem 4
sem 5

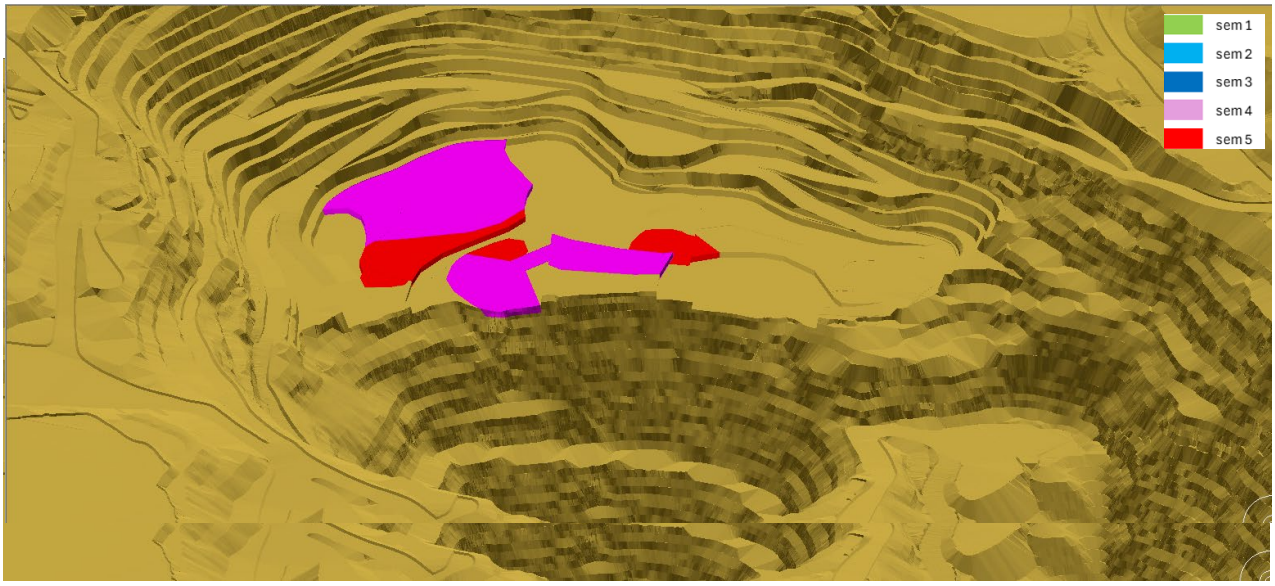
sem 1
sem 2
sem 3
sem 4
sem 5


sem 1
sem 2
sem 3
sem 4
sem 5

Rutas de transporte (Mineral y Lastre)

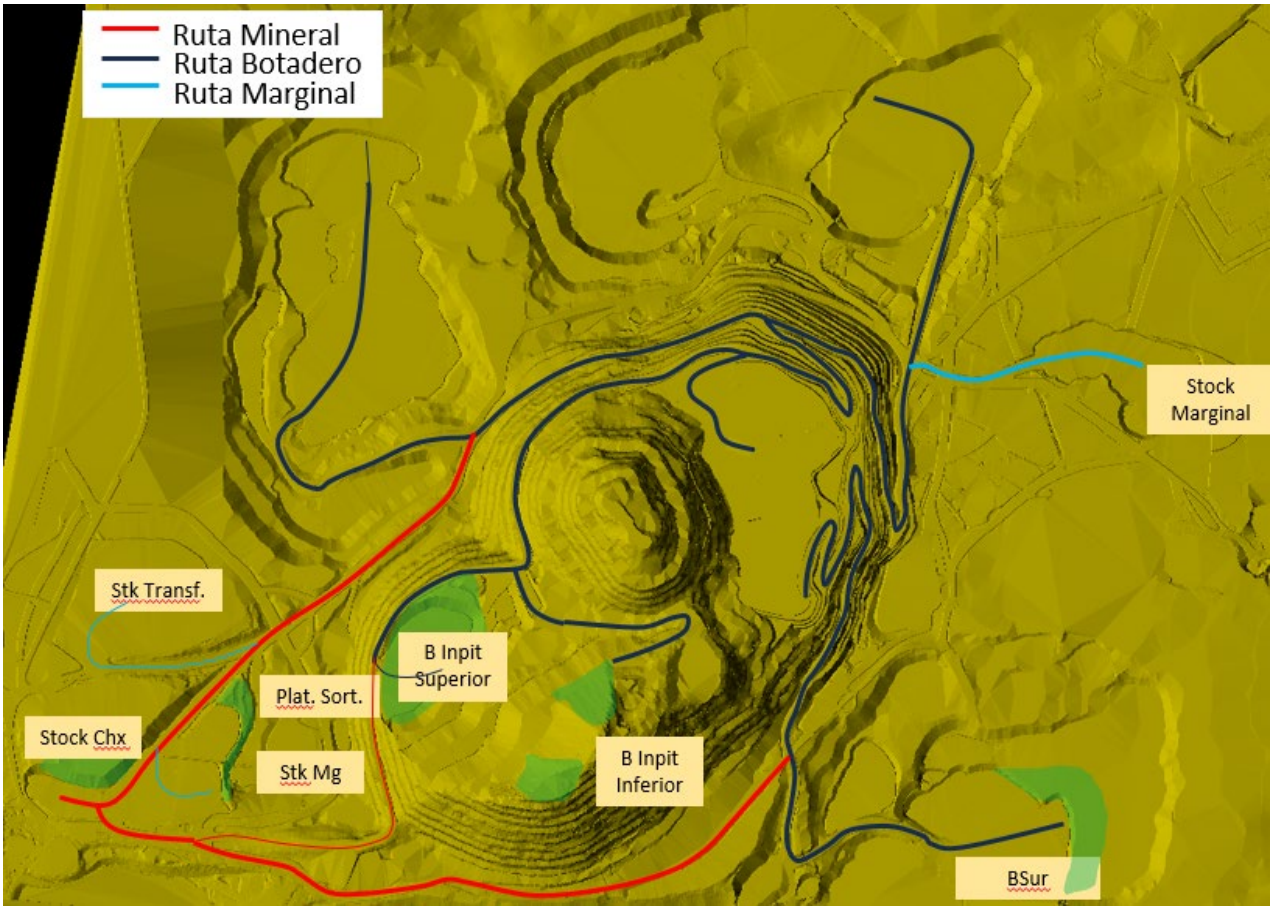

4.- PLAN MINERO FALLA CONDELL

4.a. Términos de Referencia

Los términos de referencia del Plan Minero son los entregables de las distintas áreas con las que se construye el Plan y que para el caso del Plan Mensual de SEPTIEMBRE 2026 son:


- Modelo de bloques actualizado entregado por geología, Modelo Bloques Falla Condell. (TRI_FC_SEP__OCT_NOV26_RELL.BMF)

4.b. Plan Minero


El Plan de Falla Condell estima en 41 kt de mineral insitu de una ley 0,66% CuT con un movimiento total de 1.309 kt. (El plan corta de lunes a domingo para efectos de cuadrarse con el plan semanal).


Se considera el comienzo de movimiento en F3.


Sep-26	Marginal 1 (0.20 a 0.24)			Baja Ley 2 (0.29 a 0.7)			Alta Ley			Mineral Alimentable			Lastre	TOTAL
	Ton	%Cut	%Cus	Ton	%Cut	%Cus	Ton	%Cut	%Cus	Ton	%Cut	%Cus	Ton	Ton
SEM1	59	0.23	0.20	2,599	0.44	0.39	456	0.80	0.64	3,055	0.49	0.42	258,156	261,271
SEM2	826	0.24	0.21	2,048	0.48	0.38	408	1.39	1.04	2,455	0.63	0.49	304,039	307,321
SEM3	3,385	0.23	0.20	7,397	0.41	0.34	3,079	1.33	0.92	10,477	0.68	0.51	291,129	304,991
SEM4	2,996	0.23	0.19	17,638	0.44	0.37	7,134	1.24	0.80	24,772	0.67	0.49	274,753	302,521
SEM5	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	133,073	133,073
TOTAL	**7,267**	**0.23**	**0.19**	**29,682**	**0.43**	**0.36**	**11,077**	**1.25**	**0.84**	**40,759**	**0.66**	**0.49**	**1,261,150**	**1,309,176**

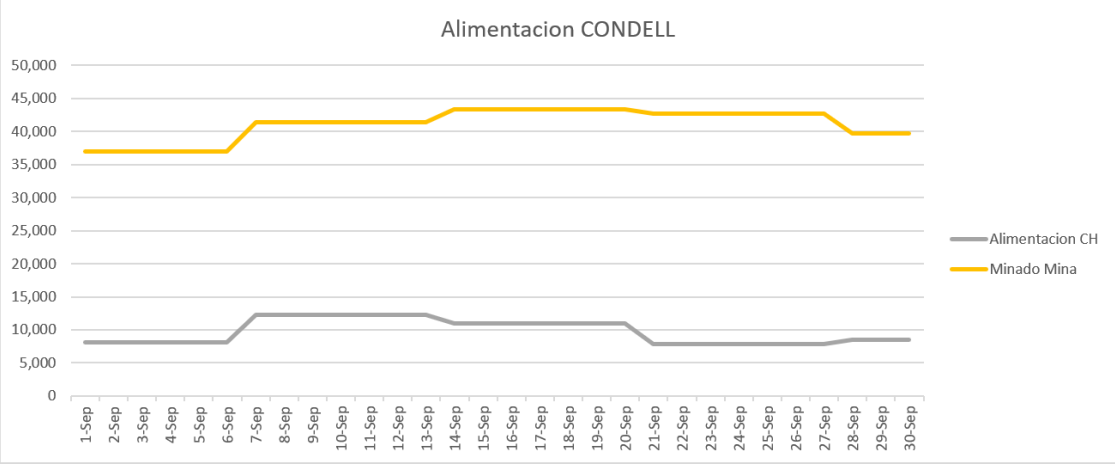


- **4.c Secuencia Plan Minero Falla Condell**

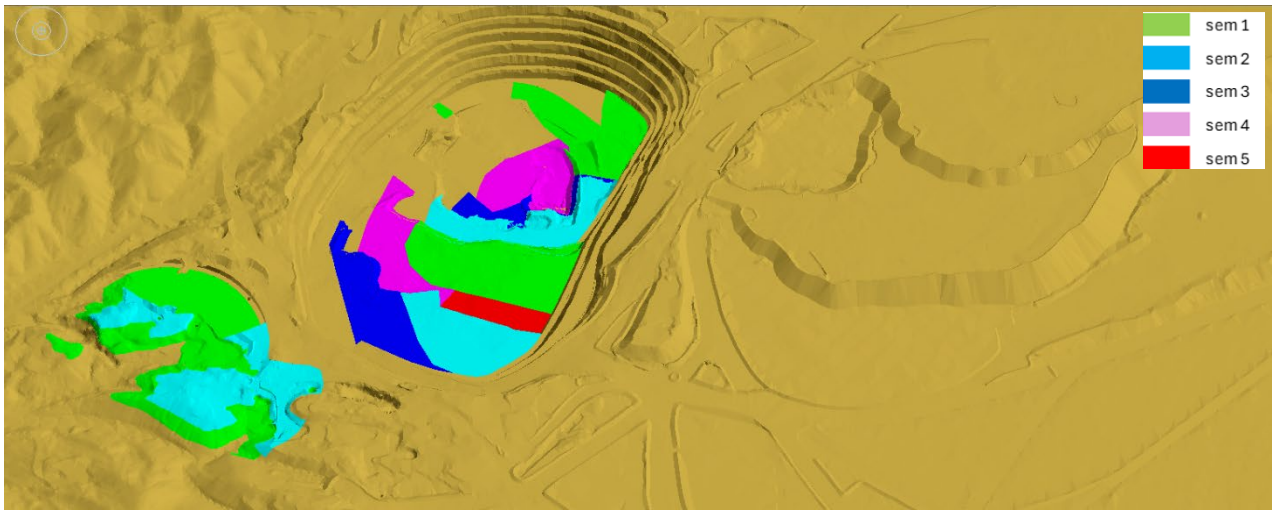

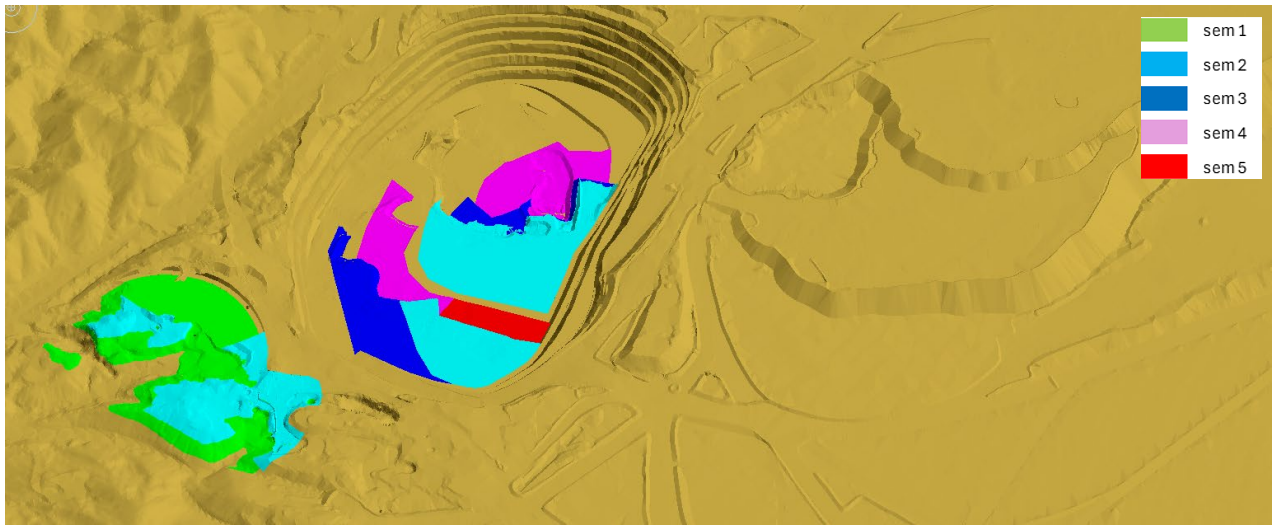


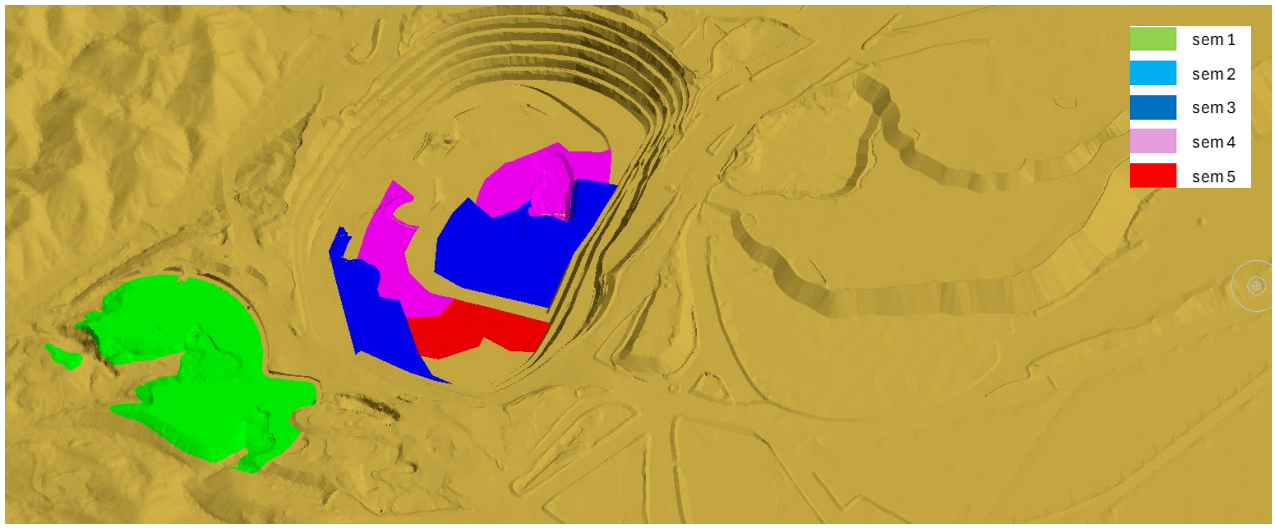

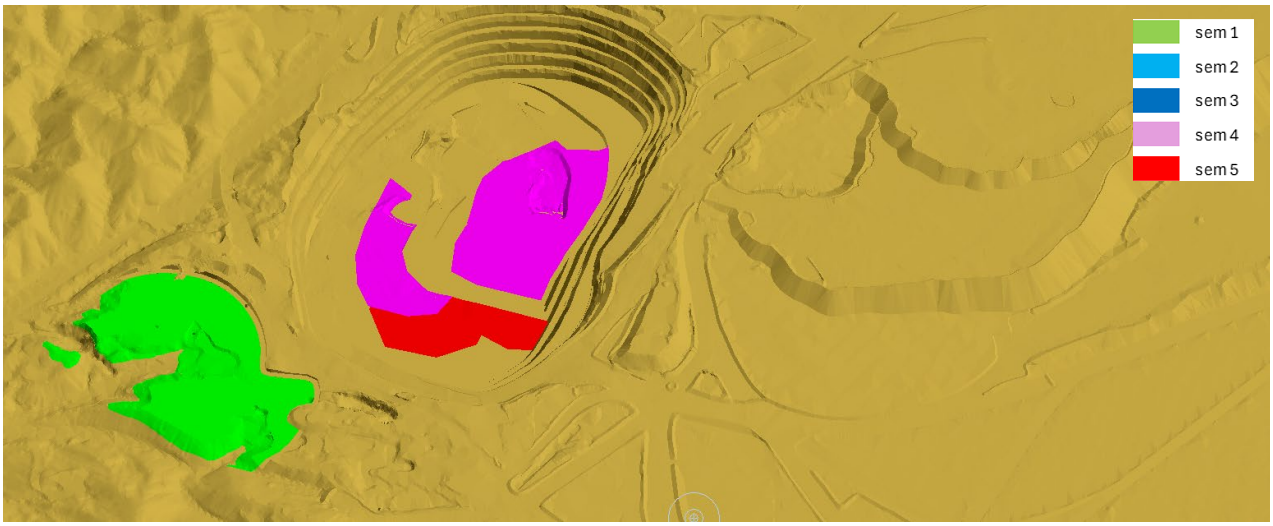
sem 1
sem 2
sem 3
sem 4
sem 5


sem 1
sem 2
sem 3
sem 4
sem 5


Rutas de transporte (Mineral y Lastre)

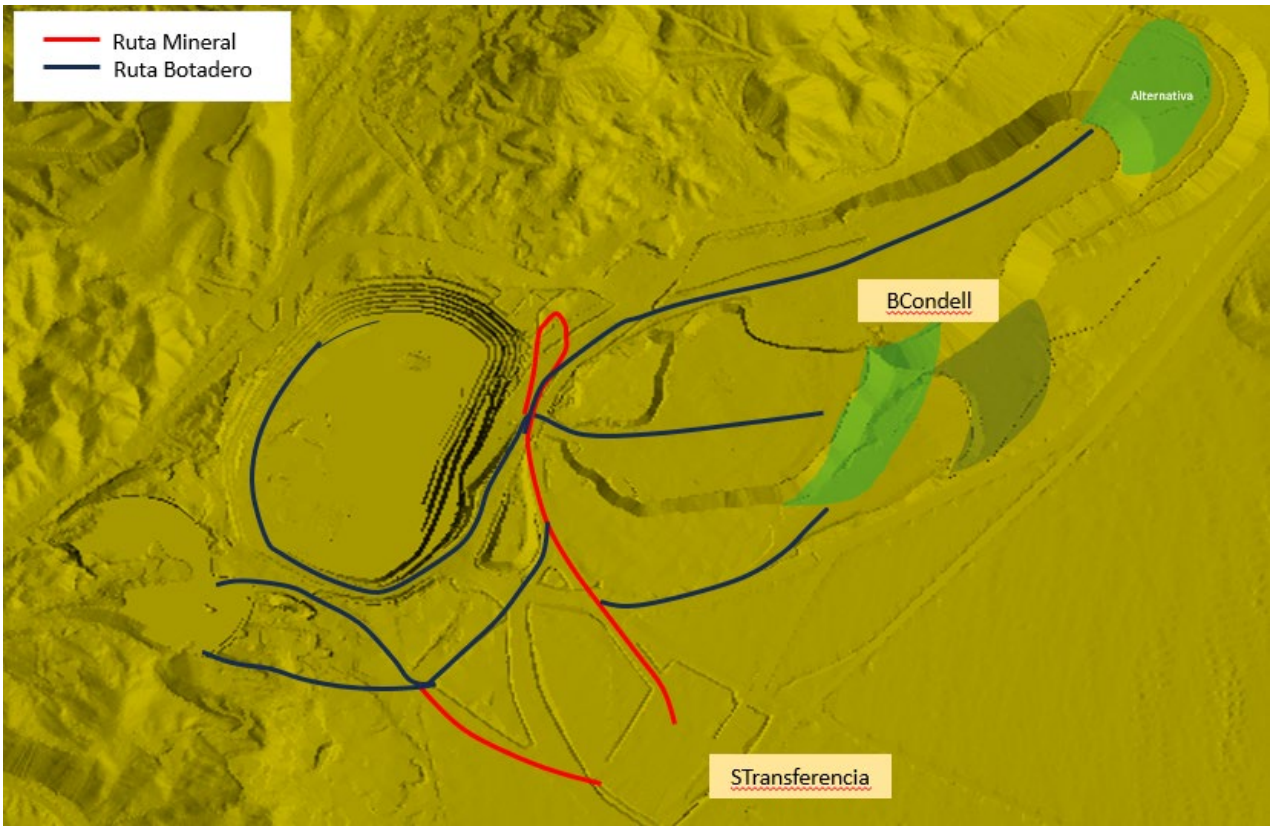

3.- PLAN DE APILAMIENTO Y DESCARGA

El plan contempla solo apilamiento de minerales frescos y descarga de canchas.

Programa de Apilamiento se considera depositar el mineral fresco T4N, T5N, T5C, T2S, C1N, C1S, CSC, T4S.

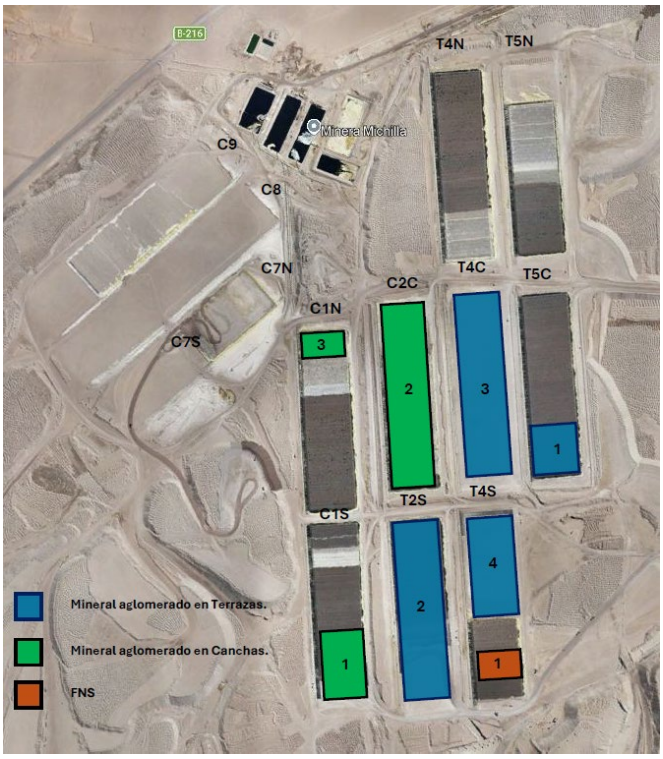

Mineral aglomerado (h = 1,5 m ; t = 40 días)		
Pila	Secuencia	Utilización *TMS*
T5C	1	21.540
T2S	2	98.725
T4C	3	98.725
T4S	4	41.152

Total Terrazas	260.142

Mineral aglomerado (h = 1,5 m ; t = 40 días)		
Pila	Secuencia	Utilización *TMS*
C1S	1	34.105
C2C	2	95.135
C1N	3	5.385

Total Canchas	134.625

Total aglomerado	394.767

FNS (h = 1,5 m ; t = 53 días)		
Pila	Secuencia	Utilización *TMS*
T4S	1	9.400

Total FNS	9.400

4.- PLAN SORTING

4.a Plan.

Para el plan de Sorting, se procesarán 118 kt de mineral en septiembre. Esto se traduce en planta Sorting; 17.6 kt de producto con ley de 0.51 %Cut, las cuales se procesarán en Chancado junto con el grueso (2.3 kt @ 0,36%Cut).

Se considera una alimentación de FNS a lix de 9.4 kt de 0.24 %CuT proveniente de minerales frescos de la mina

Plan Sorting		Plan mensual Septiembre	Plan FCST Septiembre
Alim. Tolva	ton	118,988	147,000
	%cut	0.27	0.27
FNS	ton	55,924	69,090
	%cut	0.26	0.25
Grueso	ton	2,380	4,410
	%cut	0.36	0.32
Alim. Sorter	ton	60,684	73,500
	%cut	0.274	0.29
	%Rec. Masa	29%	32%
	Upgrade	1.85	1.90
Producto	ton	17,682	23,520
	%cut	0.51	0.55
Rechazo	ton	43,002	49,980
	%cut	0.18	0.17
FNS a Lix		9,400	41,454

5.- PLAN ALIMENTACION CHANCADO

5.a. Plan de recepción chancado.

Para el plan de recepción chancado se tiene contemplado trabajar turno A y B continuo para alimentar 402 kt húmedas de mineral fresco, proveniente desde los distintos orígenes de alimentación.

	Propio	Compra
Disponibilidad	81.2%	81.2%
Utilización	85.9%	80.8%
Coeficiente marcha	69.7%	65.6%
h utiles día, base	518.8	488.1
Rend. TMH/h, base	553	237

Septiembre	Propio	Compra	Total
9/1/2026	10,248	4,239	14,487
9/2/2026	10,248	1,666	11,914
9/3/2026	10,248	4,582	14,830
9/4/2026	10,248	4,239	14,487
9/5/2026	10,248	4,239	14,487
9/6/2026	10,248	4,239	14,487
9/7/2026	4,368	4,239	8,607
9/8/2026	11,032	4,239	15,271
9/9/2026	10,248	1,666	11,914
9/10/2026	10,248	4,582	14,830
9/11/2026	10,248	4,239	14,487
9/12/2026	10,248	4,239	14,487
9/13/2026	10,248	4,239	14,487
9/14/2026	4,368	4,239	8,607
9/15/2026	11,032	4,239	15,271
9/16/2026	10,248	1,666	11,914
9/17/2026	10,226	4,582	14,807
9/18/2026	10,226	4,239	14,464
9/19/2026	10,248	4,239	14,487
9/20/2026	10,248	4,239	14,487
9/21/2026	4,368	4,239	8,607
9/22/2026	11,032	4,239	15,271
9/23/2026	10,248	1,666	11,914
9/24/2026	10,248	4,569	14,817
9/25/2026	10,248	4,239	14,487
9/26/2026	10,248	4,239	14,487
9/27/2026	10,248	4,239	14,487
9/28/2026	4,368	4,239	8,607
9/29/2026	11,032	4,239	15,271
9/30/2026	10,248	1,666	11,914
Total	**287,011**	**115,652**	**402,663**
			394,768

Para tal efecto se tiene contemplado alimentar por la línea de compra un total de 115 kt y por línea propia 287 kt a un rendimiento de 237 tph y 553 tph respectivamente.


Minerales de Terceros se tienen contemplados ingresar en dos tandas; 16 y 17 de septiembre, cuyo aporte suma 7.2 kton con una ley de 1,4%Cut.

5.b. Plan de Alimentación a Chancado.

El Plan contempla alimentar 395 Kton secas, con una ley de 0,55% CuT (106% en tonelaje y 78% de cumplimiento en ley con respecto a Plan Forecast), esto debido al menor aporte de ton de terceros, menor ton y ley de Falla Condell.

Origen	Propio			Compra			Total			Total Fcst 2026		
	TMS	%Cut	%Cus	TMS	%Cut	%Cus	TMS	%Cut	%Cus	TMS	%Cut	%Cus
Fase 15 B	246,664	0.52	0.44	0	0.00	0.00	246,664	0.52	0.44	217,805	0.69	0.55
Condell	8,782	0.57	0.46	86,643	0.58	0.47	95,425	0.58	0.47	123,232	0.58	0.46
STOCK F15	25,937	0.40	0.38	0	0.00	0.00	25,937	0.40	0.38			
Juárez	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
Producto Sorting	0	0.00	0.00	19,668	0.47	0.38	19,668	0.47	0.38	23,520	0.55	0.44
Pompeya/Urbina	0	0.00	0.00	7,073	1.40	1.26	7,073	1.40	1.26	8,275	1.15	0.92
Total	**281,383**	**0.51**	**0.43**	**113,384**	**0.61**	**0.50**	**394,767**	**0.54**	**0.45**	**372,832**	**0.66**	**0.52**


Un 62.5% del mineral alimentado a chancado proviene de mina Fase 15 B, un 24% de Condell, un 5% proviene del producto Sorting, 1.8% proviene de compra de minerales de terceros (Pompeya y Urbina).

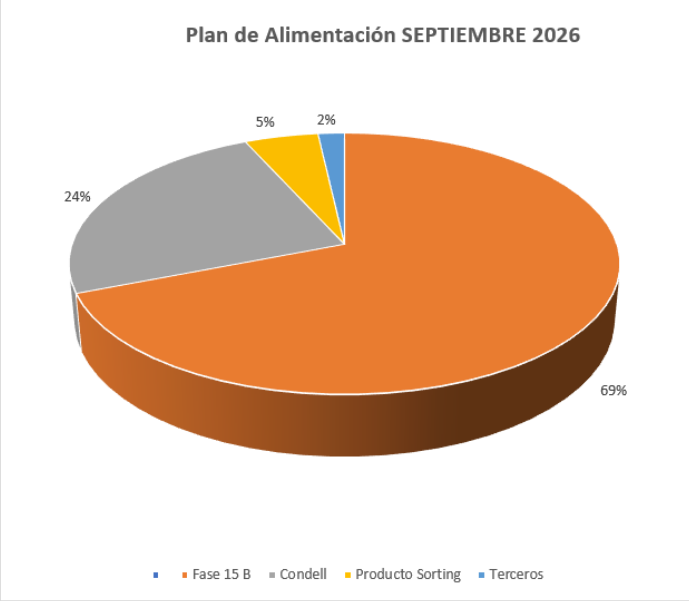

6.- PLAN DE PRODUCCION

Para el caso de la producción de cobre fino, está alineado al plan de Trimestral.

Origen	Ton	%Cut	Fino
Condell	95,425	0.58	384
Fase 15B	246,664	0.52	895
Stock F15B	25,937	0.40	67
Terceros	7,073	1.40	74
Sorting	19,668	0.47	58
FNS	27,730	0.24	22
Total	**422,497**	**0.52**	**1,500**
Forecast 6+6	**414,286**	**0.62**	**1,855**
Trimestral	**403,435**	**0.56**	**1,640**

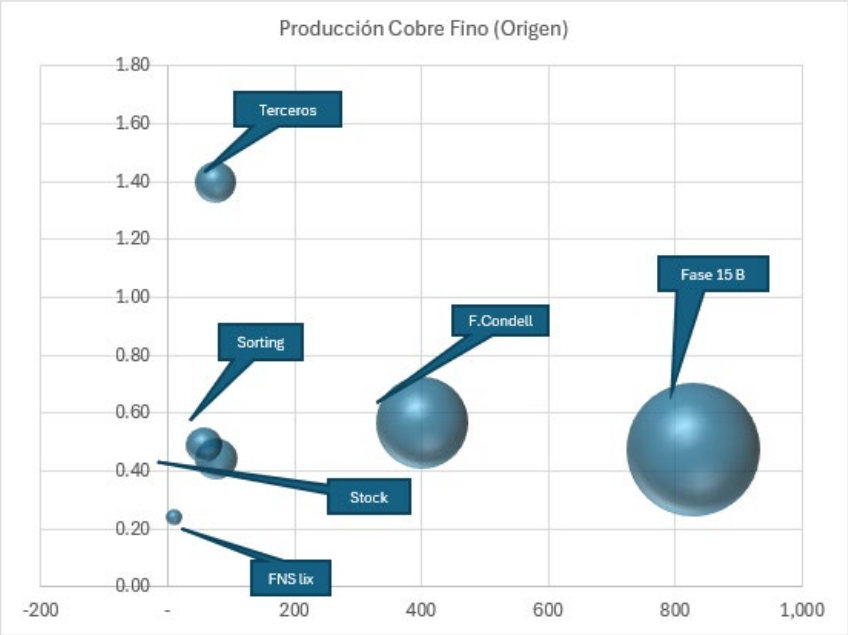

7.- RIESGO Y OPORTUNIDAD

RIESGO

- Dotación incompleta por fiestas patrias
- Presencia de cavidades no reconocidas en el modelo
- Reducción de ton del Modelo de Bloques
- Mayor presencia de Camanchaca turnos dia, que obligue detención total.
- Baja Disponibilidad de equipos de los CAEX 775, con una disponibilidad de un 75% vs Fcst 83%
- Baja Dotación de Finning.

OPORTUNIDAD

- Mejoramiento de la ley alimentación planta por Gestión de zonaciones, estrategia ley de corte. (curva tonelaje ley)
- Mejoramientos de tiempo de ciclos por habilitación de rampas no consideradas en el plan.
- Material de relleno en Fase 15B y Falla Condell podría aportar mayor mineral
